



T.C.
SİNOP
İL ÖZEL İDARESİ

“... Hususi İdareler ve Belediyeler, büyük kalkınma savaşımızda başarı hasılasını artıracak vazifeler almalı ve hususiyle hayat ucuzluğunu temin edecek, yerine göre tedbirler bulmalı ve salahiyetlerini tam kullanmalıdır.”

M.Kemal ATATÜRK



2024 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

Mali Hizmetler Müdürlüğü

SİNOP 2025

FAALİYET RAPORU SAYFA BİLGİLERİ

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU	4
GENEL SEKRETER SUNUMU	5
FAALİYET RAPORU YÖNETMELİK UYGULAMA BİLGİLERİ	9
MİSYON, VİZYON VE İLKELER	10
İL ÖZEL İDARESİ TEŞKİLAT ŞEMASI	14
İL ÖZEL İDARESİ KARAR ORGANLARI	15
AMAÇ VE HEDEFLER	26
FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER	27
FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ	37
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	39
PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ	40
SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	66
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	69
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	77
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	78
YAZI İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	79
MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	82
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	89
İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	90
İL MÜDÜRLÜKLERİ FAALİYETLERİ	91
MERKEZ VE İLÇE KÖYLERE H.G. BİR. ÖZEL İDARE KAYNAKLI HARCAMALARI	94
BİRİMLERİN FAALİYET SONUÇLARI PERFORMANS ÖLÇÜM TABLOLARI	107
PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ	110
KURUMSAL FAALİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ	111
ÖNERİ VE TEDBİRLER	113
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANLARI	114



ADRES

Gelincik Mahallesi Fatih caddesi SİNOP iletişim

TEL: 0368 261 18 50-51 261 59 02 DAHİLİ: 137-154 -155

FAKS : 0368 261 29 08

E-POSTA: ozelidare@sinop.gov.tr



Sayın Başkan, İl Genel Meclisimizin değerli üyeleri ve kıymetli mesai arkadaşlarım;

Çağdaş yönetim anlayışıyla, Kamu Yönetiminde mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu prensibi çerçevesinde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi ve il Özel idaresi Kanununun 39. maddesi gereğince Kamu İdarelerince hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik doğrultusunda İdaremiz 2024 yılı Faaliyet Raporu hazırlanmıştır. İl özel İdareleri halkın mahalli müşterek niteliğe haiz yatırım hizmetlerine öncelik vermekte ve merkezi idarenin görevlerine katkı bağlamında merkezi idarenin ulaşamadığı en ücra köylere dahi hizmetlerin en rasyonel şekilde ulaşmasına gayret göstermektedir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, kanunların çerçevelediği şekilde mali durumumuz, hizmetin aciliyeti, mevcut altyapı potansiyeli gibi kriterlere dikkat ederek çalışmalarımıza yön vermekteyiz

Bu duygu ve düşüncelerle 2024 yılında yapılan faaliyetlerimizin ve bu yıl uygulamaya konulan programlarımızın ilimize, Devletimize ve Milletimize hayırlı olmasını diler hepinize saygı ve sevgilerimi sunarım.

Dr. Mustafa ÖZARSLAN

Sinop Valisi

..../02/2025



Sayın Başkan, İl Genel Meclisimizin değerli üyeleri, kıymetli çalışma arkadaşlarım;

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi ve il Özel idaresi Kanununun 39. maddesi gereğince Mahalli Hizmet ve İlimizdeki Yatırımları üstlenmiş bulunan İl Özel İdareleri, ilimizin mahalli müşterek ihtiyaçları için çalışmalarını sürdürülmektedir. Yapmış olduğumuz tüm çalışmalar ilimiz içindeki her noktayı modern ve yaşanabilir bir seviyeye getirme amaçlıdır. Merkezimiz, ilçelerimiz, kasaba ve köylerimizde başta eğitim ve sağlık olmak üzere ulaşım, tarım, içme suyu, hayvancılık, turizm hizmetlerinin alt yapılarının hazırlanmasında İl Özel İdarenin büyük katkıları olmuştur.

Sinopumuz'u doğa güzellikleriyle, tarihi zenginlikleriyle, ileriye dönük yatırımlarıyla, yeni yetişen nesillere iş imkânlarıyla, üniversitesiyle, sosyal yardım hizmetleriyle, Türkiye'nin en iyi yaşanabilir ve tercih edilebilir şehirleri arasında görmek birinci temel hedefimizdir. Tüm çabalarımız ve çalışmalarımız bu istikamette olmuştur ve olmaya devam edecektir.

Sinop'umuza İl Özel İdaresinin maddi imkânları ile kazandırılmış ve kazandırılacak olan yatırımlarda İl Genel Meclisimizin iradesinin olması bizler için gurur kaynağıdır. Yapılan hizmetlerde Sayın Valimiz ile İl Genel Meclisimizin ve İl Encümenimizin katkıları büyüktür. Bu vesile ile yapılan hizmetlerde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Yahya ÇINKIL
Genel Sekreter

Sinop Resimleri







I- GENEL BİGİLER

A-Misyon ve Vizyon

B-Yetki Görev ve sorumluluklar

C-İdareye İlişkin Bilgiler,

- 1-Fiziksel Yapı
- 2-Örgüt Yapısı
- 3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
- 4-İnsan Kaynakları
- 5-Sunulan Hizmetler
- 6-Yönetim ve İç Kontrol sistemi

2-AMAÇ VE HEDEFLER

A-İdarenin Amaç ve Hedefleri

B-Temel Politikalar ve Öncelikler

3-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A-Mali Bilgiler

- 1-Bütçe Uygulama Sonuçları
- 2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
- 3-Mali Denetim Sonuçları
- 4-Diğer Hususlar

B-Performans Bilgileri

- 1-Faaliyet ve Proje Bilgileri
- 2-Performans Sonuçları Tablosu
- 3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
- 4-Performans Bilgi ve Sisteminin Değerlendirilmesi
- 5-Diğer Hususlar

4-KURUMSAL KAABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A-Üstünlükler

B-Zayıflıklar

C-Değerlendirme

5-ÖNERİ VE TEDBİRLER

A-MİSYON VE VİZYON;**MİSYONUMUZ:**

“Hesap verebilir, demokratik, katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla; vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle, insan ve çevre odaklı, gerektiğinde sivil toplum örgütleri ve diğer kamu kuruluşlarıyla birlikte hareket ederek, mahalli, müşterek nitelikte olmak üzere, bütçe imkanları ve hizmet önceliklerini de dikkate alarak, kanunlarla verilen görev ve sorumluluklarını yerine getirmektedir.”

VİZYONUMUZ:

İnsanlarımızın yaşam kalitesi ve refah düzeyini yükseltmek, köyler ve kent arasındaki gelişmişlik farkını en aza indirmek, toplumun yaşadıkları yerden dolayı mutluluk duyduğu, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda bölgenin en gelişmiş ili olmak için;“İhtiyaçlara duyarlı, kısır çekişmelerden ve politik kaygılardan uzak bir karar alma ve uygulama sistemine sahip, güler yüzlü personel ve yönetici kadrolar ile takım ruhunun oluşturulduğu bir hizmet kuruluşu olmaktır.”

İLKELERİMİZ:

- 1.Hizmetlerimizde verimlilik, etkinlik ve tutumluluğun dolayısıyla performansın artırılması,
- 2.Yapılacak hizmet ve yatırımlarda vatandaş katkısı ve memnuniyetinin esas alınması,
- 3.Yapılacak yatırımlarda mevzuatlara ve tasarruf tedbirlerine uyulması,
- 4.Nüfusun yoğun olduğu bölgelerde yatırımlara daha fazla ağırlık verilmesi,
- 5.Diğer kamu kurum, kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle gerekli ve yeterli koordinasyonun sağlanması,
- 6.Hizmetlerimizin sunumunda kalite anlayışından taviz verilmemesi,
- 7.Vatandaşlara karşı sorumlu, eşit ve adil davranılması,
- 8.Hizmet standartlarının yükseltilmesi,
- 9.Çalışanların bilgi ve becerilerini artırarak hizmetlerdeki kalitenin artırılması,
- 10.Tüm çalışmalarımızda şeffaflık, katılımcılık ve hesap verme sorumluluğu vazgeçilmez ilkelerimizdir.

B-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR: 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6.maddesi, il özel idaresinin görev ve sorumluluklarını belirlerken, bu görev ve sorumlulukları iki bölümde ele almıştır. Birinci bölümde yer alan görev ve sorumluluklar “il sınırları içinde”, ikinci bölümde yer alan görev ve sorumluluklar “belediye sınırları dışında” il özel idarelerine görev olarak verilmiştir. 5302 Sayılı Kanunun dışında, diğer bazı Kanunlarla da İl Özel İdaresine verilmiş görevler mevcuttur.,

1)İL SINIRLARI İÇİNDEKİ GÖREVLERİ

- Gençlik ve Spor
- Sağlık
- Tarım
- Sanayi ve Ticaret
- İlin Çevre Düzeni Planı
- Bayındırlık ve İskan
- Toprağın Korunması, Erozyonun Önlenmesi
- Kültür, Sanat, Turizm
- Sosyal Hizmet ve Yardımlar
- Yoksullara Mikro Kredi Verilmesi
- Çocuk Yuvaları ve Yetiştirme Yurtları
- İlk ve Orta Öğretim Kurumlarının Arsa Temini, Binalarının Yapım, Bakım ve Onarımları ile Diğer İhtiyaçlarının Giderilmesi

2)BELEDİYE SINIRLARI DIŞINDAKİ GÖREVLERİ:

- İmar, Yol, Su, Kanalizasyon
- Katı Atık, Çevre
- Acil Yardım ve Kurtarma
- Orman Köylerinin Desteklenmesi
- Ağaçlandırma Park ve Bahçe Tesisi

3)DİĞER KANUNLARLA VERİLEN GÖREVLER:

- 3202 Sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hak. Kanun
- 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
- 3194 sayılı İmar Kanunu
- 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu

- 2872 Sayılı Çevre Kanunu
- 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu
- 5543 Sayılı İskan Kanunu
- 5355 Mahalli İdare Birlikleri Kanunu
- 442 Sayılı Köy Kanunu
- 7478 Sayılı Köy İçme Suları Kanunu
- 3998 Sayılı Köy Mezarlıklarının Korunması Hakkında Kanun
- 7402 Sayılı Sıtmanın İmhası Hakkında Kanun
- 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
- 4019 Sayılı Muhtaç Asker Aileleri Hakkındaki Kanun.
- 5378 Özürlüler ve Bazı Kan. Hük. Kararnamelerde değişiklik Yapılması Hakkında kanun
- 5393 Sayılı Belediye Kanunu
- 2918 Sayılı karayolları Trafik Kanunu
- 4857 Sayılı İş Kanunu
- 3213 Sayılı Maden Kanunu
- 5226 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

C-İDAREYE İLŞKİN BİLGİLER:

Sinop İl Özel İdaresi İl merkezinde 3 katlı İdari binada, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü İdareimiz ile aynı sahada ek Hizmet Binasında, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü İdareimize ait Korucuk mevkiinde bulunan binamızda, İl Genel Meclisimiz yeni mahalle okulak sokakta faaliyetlerini sürdürmektedir.


İl Özel İdareimizin sosyal tesisi, ayrıca tesis İçerisinde 6 odalı 15 Yataklı misafirhanemiz bulunmaktadır.

Kefevi Mahallesinde 16 adet, idare binasının yanında 19 adet lojmanımız mevcuttur. 8 İlçe Özel İdare Müdürlüğü ile İlçelerimizde Hizmet verilmektedir. Ayrıca 7 İlçemizde Bakım Evi binaları bulunmaktadır. Merkez Kabalı köyümüzde, Erfelek ve Durağan ilçelerimizde ve Bürnük'te sabit konkasör şantiyemiz bulunmaktadır.

İL ÖZEL İDARESİ ANA HİZMET BİNASI



TEŞKİLAT ŞEMASI

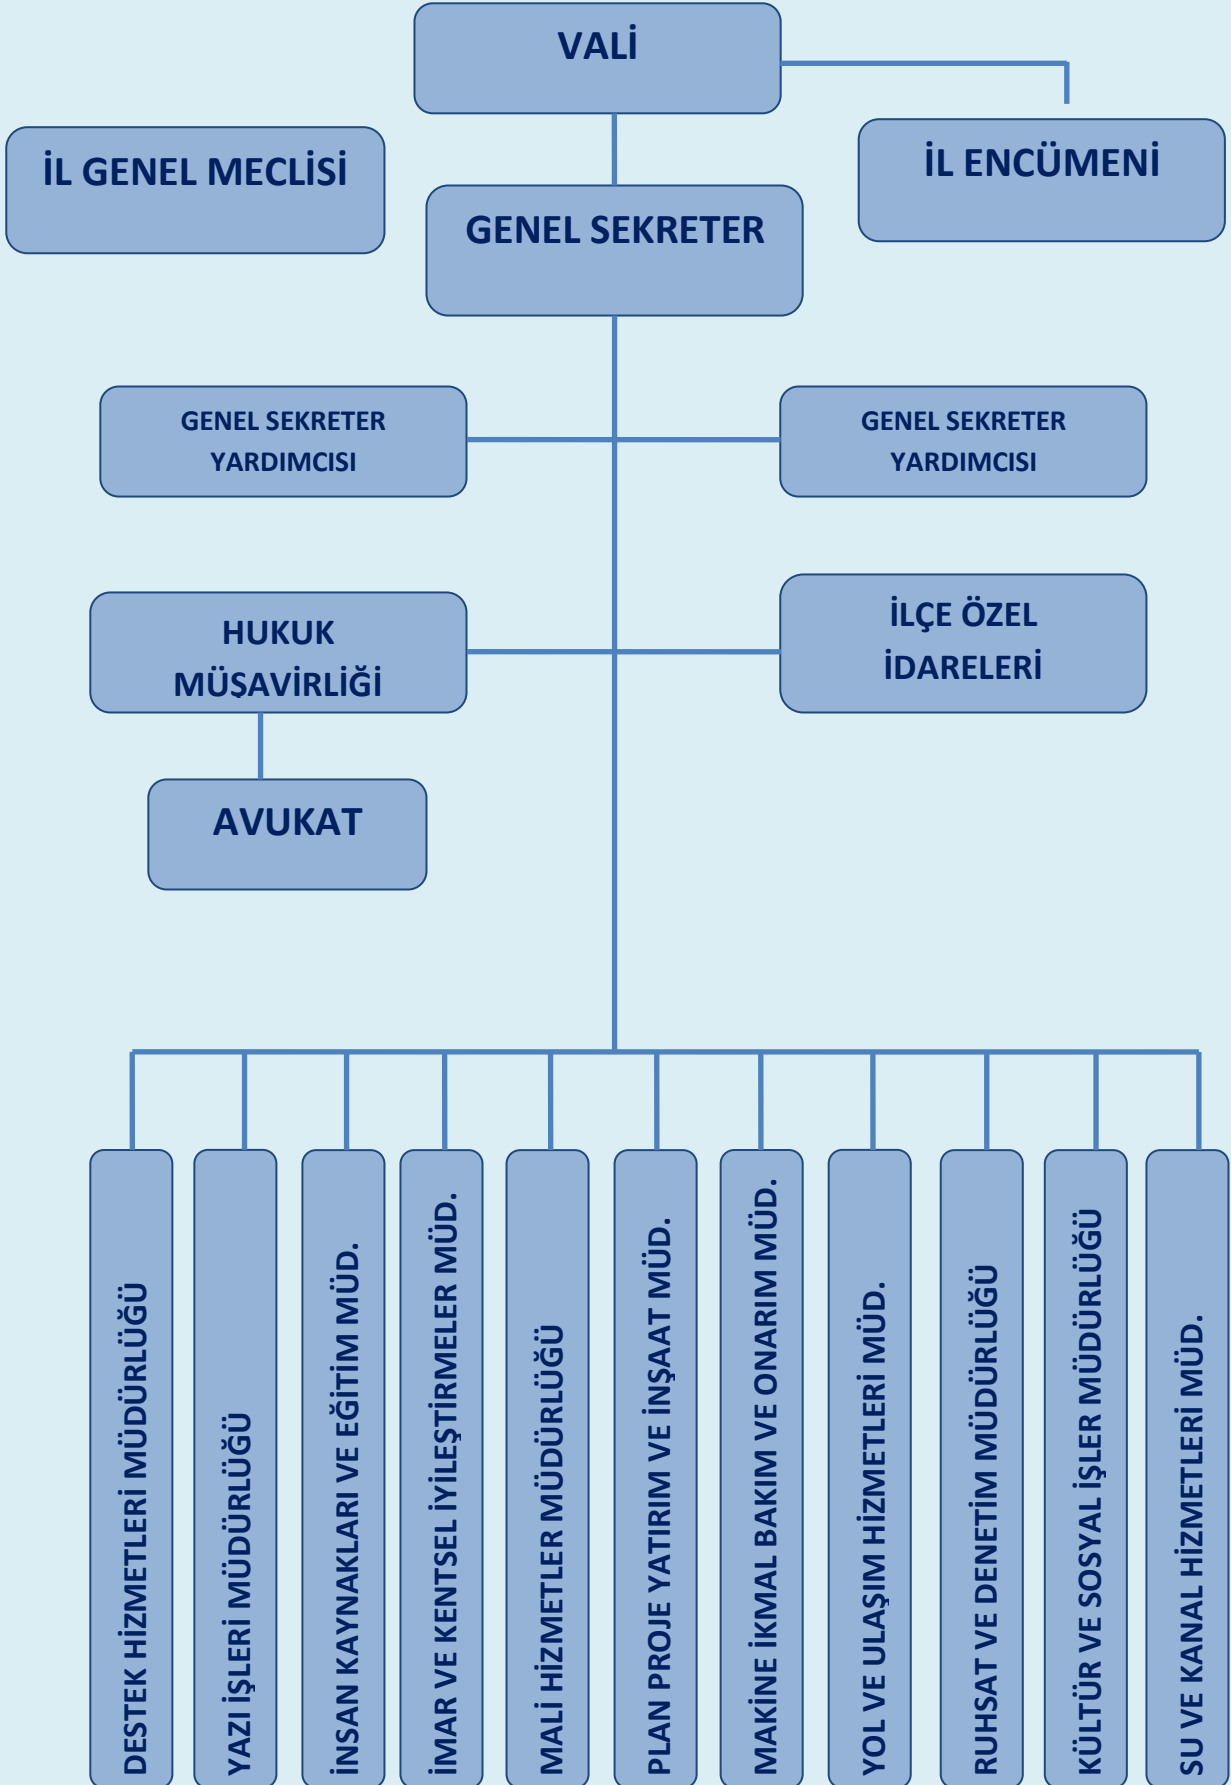

İl Özel İdaresi Karar Organları:

İl Genel Meclisi:

İl genel meclisi, il özel idaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşur.

İl Genel Meclisinin görev ve yetkileri

- a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak.
- b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- c) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç İl çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamak.(2)
- d) Borçlanmaya karar vermek.
- e) Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
- f) Taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmi beş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
- g) Şartlı bağışları kabul etmek.
- h) **(İptal: Anayasa Mahkemesinin 18/1/2007 tarihli ve E.:2005/32, K.:2007/3 sayılı Kararı ile.)**
 - i) İl özel idaresi adına imtiyaz verilmesine ve il özel idaresi yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına, il özel idaresine ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
 - j) Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
 - k) İl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
 - l) Norm kadro çerçevesinde il özel idaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
 - m) Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına karar vermek.
 - n) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
 - o) İl özel idaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.

Meclis başkanlık divanı

İl genel meclisi, seçim sonuçlarının ilânını izleyen beşinci gün kendiliğinden toplanır. Bu toplantıda meclise en yaşlı üye başkanlık eder. Meclis, bu toplantıda, üyeleri arasından ve gizli oyla meclis başkanını, meclis birinci ve ikinci başkan vekillerini, ikisi yedek olmak üzere dört kâtip üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı, yapılacak ilk mahallî idareler seçimlerine kadar görev yapar.

Meclis başkanlık divanı seçimi üç gün içinde tamamlanır.

Meclis başkanlığı ve başkanlık divanında boşalma olması durumunda, kalan süreyi tamamlamak üzere, yenisi seçilir.

İl genel meclisine meclis başkanı, bulunmaması durumunda meclis birinci başkan vekili, onun da bulunmaması durumunda ikinci başkan vekili başkanlık eder.

Meclis başkanı, meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür.

İl genel meclisinin çalışmalarına ilişkin esas ve usuller İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Meclis toplantısı

İl genel meclisi, il genel meclisince belirlenecek bir aylık tatil hariç her ayın ilk haftası meclis tarafından önceden belirlenen günde mutat toplantı yerinde toplanır. **(Mülga son cümle: 3/7/2005-5393/85 md.)**

Bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi en çok yirmi gün, diğer toplantıların süresi en çok beş gündür.

Mutat toplantı yeri dışında toplanılmasının zorunlu olduğu durumda üyelere ve valiye önceden bilgi vermek kaydıyla meclis başkanının belirlediği yerde toplantı yapılır. Ayrıca, toplantının yeri ve zamanı mutat usullerle halka duyurulur.

İl genel meclisinin toplantıları açıktır. Meclis başkanı veya üyelerden herhangi birinin gerekçeli önerisi üzerine, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kapalı oturum yapılmasına karar verilebilir. Salt çoğunluk belli bir sayının yarısından az olmayan çoğunluğu ifade eder.

İl genel meclisi görüşmeleri görevlilerce tutanağa geçirilir, tutanak başkan ve kâtip üyeler tarafından imzalanır. Toplantılar, meclisin kararıyla sesli veya görüntülü cihazlarla da kaydedilebilir.

Özel idare teşkilatı ve ildeki kamu kurum ve kuruluşlarının birim amirleri gündemdeki konularla ilgili olarak meclis toplantılarına davet edilebilir ve bilgi alınabilir.

(Ek fıkra: 30/5/2007-5675/2 md.) İl genel meclisi başkanı, acil durumlarda lüzum görmesi halinde il genel meclisini bir yılda üç defadan fazla olmamak ve her toplantı bir birleşimi geçmemek üzere toplantıya çağırır. Olağanüstü toplantı çağırısı ve gündem en az üç gün önceden meclis üyelerine yazılı olarak duyurulur ve ayrıca mutat usullerle ilan edilir.

Olağanüstü toplantılarda çağırıcıyı gerektiren konuların dışında hiçbir konu görüşülemez.

Gündem

Gündem, meclis başkanı tarafından belirlenir ve üyelere en az üç gün önceden bildirilir. Valinin önerdiği hususlar meclisin ilk toplantısında gündeme alınır. Gündem, çeşitli yollarla da halka duyurulur.

İl genel meclisi üyeleri de il özel idaresine ait işlerle ilgili konuların gündeme alınmasını önerebilir. Öneri, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kabul edildiği takdirde gündeme alınır.



SİNOP İL GENEL MECLİS BAŞKANI
Sayın ERSİN YAMAN


İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIK DİVANİ



İL GENEL MECLİSİ TOPLANTI SALONUMUZ



İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİ

				
Ersin YAMAN Merkez AK PARTİ BAŞKAN		Demirhan DEMİRKOL Merkez AK PARTİ		Mustafa Erdal UZUN Merkez CHP
				
Ömer ÖZMUTLU Merkez CHP		Erkan ÖRNEK Ayancık AK PARTİ		Ergün AKYÜZ Ayancık CHP
				
İsa BAĞCI Boyabat AK PARTİ		Enes ÇAKIR Boyabat MHP		Arif KARA Boyabat YRP



Ecevit DİNÇ
Dikmen
AK PARTİ



Hüseyin TÜRKMEN
Dikmen
AK PARTİ




Ahmet TURGUT
Durağan
AK PARTİ



Mehmet KARAKURT
Durağan
AK PARTİ



Adem AKGÖZ
Erfelek
CHP



Ziya DİLSİZ
Erfelek
AK PARTİ



Cumhur KURT
Gerze
AK PARTİ



Mustafa BAŞ
Gerze
CHP



Sebahattin BELOVACIKLI
Gerze
CHP



Cüneyt Uğur ŞİMŞEK
Saraydüzü
AK PARTİ



Şükrü CEBECİ
Saraydüzü
MHP



Nihat DEMİRCAN
Türkeli AK PARTİ



Asım CAN
Türkeli
MHP

İL GENEL MECLİS ÜYELERİMİZİN İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI

Merkez İlçe	4
Ayancık	2
Boyabat	3
Dikmen	2
Durağan	2
Erfelek	2
Gerze	3
Saraydüzü	2
Türkeli	2

İl Encümeni:

İl encümeni valinin başkanlığında, genel sekreter ile il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından seçeceği üç üye ve valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği iki üyeden oluşur.

Valinin katılamadığı encümen toplantısına genel sekreter başkanlık eder. Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak, ilgili birim amirleri vali tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.

Encümenin görev ve yetkileri:

Encümenin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel meclisine görüş bildirmek.

b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.

c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş milyar Türk Lirasına kadar olan ihtilafların sulhen halline karar vermek.

g) Taşınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.

h) Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

i) Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek.

j) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

Encümen toplantısı

Encümen, haftada en az bir defa olmak üzere önceden belirlenen gün ve saatte toplanır. Başkan acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir.

Encümen üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Oyların eşitliği durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Çekimser oy kullanılamaz. **(Ek cümle: 12/11/2012-6360/23 md.)** Encümenin ihale komisyonu olarak yapacağı toplantılarda da bu fıkra hükümleri geçerlidir.

Encümen gündemi vali tarafından hazırlanır. Encümen üyeleri gündem maddesi teklif edebilir.

Encümen, gündemindeki konuları en geç bir hafta içinde görüşüp karara bağlar.

Alınan kararlar başkan ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Karara muhalif kalanlar gerekçelerini de açıklar.

Vali kanun, tüzük, yönetmelik ve il genel meclisi kararlarına aykırı gördüğü encümen kararının bir sonraki toplantıda tekrar görüşülmesini isteyebilir. Encümen, kararında ısrar ederse karar kesinleşir. Bu takdirde, vali, kesinleşen encümen kararının uygulanmasını durdurur ve idari yargı mercilerine yürütmeyi durdurma talebi ile birlikte on gün içinde başvurur. İtiraz Danıştayca en geç altmış gün içinde karara bağlanır.

Encümen başkan ve üyeleri, münhasıran kendileri, ikinci derece dahil kan ve kayın hısımları ve evlatlıkları ile ilgili işlerin görüşüldüğü encümen toplantılarına katılamazlar.

Vali: Vali, il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.

Valinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) İl özel idaresi teşkilâtının en üst amiri olarak il özel idaresi teşkilâtını sevk ve idare etmek, il özel idaresinin hak ve menfaatlerini korumak.

b) İl özel idaresini stratejik plâna uygun olarak yönetmek, il özel idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel idaresi faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

c) İl özel idaresini Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.

d) İl encümenine başkanlık etmek.

e) İl özel idaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

f) İl özel idaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

h) İl genel meclisi ve encümen kararlarını uygulamak.

i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümen yetkisi dışında kalan aktarmaları yapmak.

j) İl özel idaresi personelini atamak.

- k) İl özel idaresi, bağlı kuruluşlarını ve işletmelerini denetlemek.
l) Şartsız bağışları kabul etmek.
m) İl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak.
o) Kanunlarla il özel idaresine verilen ve il genel meclisi veya il encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

SİNOP İLİ KÖY VE MAHALLE SAYILARI

İLÇELER	KÖY SAYISI	MAHALLE SAYISI
MERKEZ	38	13
AYANCIK	71	5
BOYABAT	107	9
DİKMEN	28	3
DURAĞAN	69	6
ERFELEK	46	3
GERZE	42	7
SARAYDÜZÜ	31	1
TÜRKELİ	33	3
TOPLAM	465	50

Özel İdaresi Genel Sekreterliği içinde yer alan mevcut birimler:

- 1:Mali Hizmetler Müdürlüğü
- 2:Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
- 3:Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
- 4:Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
- 5:İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
- 6:İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
- 7:Destek Hizmetleri Müdürlüğü
- 8:Yazı İşleri Müdürlüğü
- 9:Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
- 10:Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
- 11:Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
- 12: Hukuk Müşavirliği

Bağılı Birimler : 8 İlçe Özel İdare Müdürlükleri
Personel Limited Şirketi
Kültür ve Sosyal Turizm İşletmeleri Anonim Şirketi

4:Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: İlimiz Özel İdaresi Hizmet binalarında faaliyet gösteren tüm şubelerimiz Bilgisayar ve İnternet ağı ile örölmüş olup Bilgi çağının gerektirdiğı tüm olanaklardan faydalanmaktadır. İlçelerimizde Faaliyet gösteren İlçe Özel İdare Müdürlüklerimizde bu olanaklardan faydalanmakta ayrıca İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem daire başkanlığı tarafından kurulan Bir İnternet Sitesi ile İl Özel İdareleri Bütçe ve Muhasebe usulü Yönetmeliğı iş ve işlemlerinin tamamı bu Site üzerinden Merkeze aktarılmakta ve Tüm Mali İşlemler Elektronik ortamda tutulup İl bünyesinde Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından takip edilebilmektedir. İdareimiz 2010 Mali Yılı içerisinde e-Devlet Projesi kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından pilot İl olarak seçilmiş ve tüm yazışmalar elektronik ortamda yapılmaya başlanmıştır. Gelir, taşınır programları 2014 yılında kullanılmaya başlanmış olup Gelir ve Maaş Programı ise Bakanlığımızca çalışmalar bitirildiğinde kullanılmaya başlanılacaktır.

4:İnsan Kaynakları:İl Özel İdaresi görev yetki ve sorumluluklarını yerine getirmek için 657 sayılı Devlet Memuru, Sözleşmeli İşçi ve Kadrolu İşçi Personel İl Merkezinde ve İlçelerimizde İstihdam edilmektedir. Personel durumunu ve ilgili personellerin Şubelerine dağılımını gösteren cetvel ile idareimiz Norm Kadro durumunu belirten cetvel İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Performans bilgileri bölümünde listelenmiştir.

5:Sunulan Hizmetler:Sinop Belediye Mücavir alanı içerisinde ve 465 Köy, 1456 üniteden oluşan sorumluluk alanımızda aşağıda maddeler halinde belirtilen hizmetler görölmektedir.

- 1-GENEL KAMU HİZMETLERİ
- 2-SİVİL SAVUNMA VE AFET HİZMETLERİ
- 3-KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ
- 4-EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
- 5-ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ
- 6-İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ
- 7-SAĞLIK HİZMETLERİ
- 8-DİNLENME VE DİN HİZMETLERİ
- 9-EĞİTİM HİZMETLERİ
- 10-SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ

6:Yönetim ve İç Kontrol Sistemi:

Sinop İl Özel İdaresi Yönetim yapısı İdari yönden Tüzel Kişiliğin başı ve Temsilcisi Validir. İl Genel Sekreteri İdarenin iş ve İşlemlerinin yürütülmesinden Valiye karşı sorumludur.

İç Kontrol sistemi olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu hükümleri uygulanmaktadır.

Sinop İl Özel İdaresinde üst yönetici İl Valisidir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği, 31.12.2005 tarih ve 26040-3. mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar hakkındaki Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda;

İdarelerin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin mali karar ve işlemlerinin;

İdarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden yapılan kontrolleri içeren ön mali kontrol hizmetleri Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Adına ödenek tahsis edilen her bir birim amiri harcama yetkilisi olup, bu birim amirlerinin belirlediği personellerde gerçekleştirme görevlisi görevlerini yerine getirmektedir.

Muhasebe Yetkilisi görevi de Mali Hizmetler Müdürü tarafından yürütülmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 55. maddesinin 2. fıkrası ile İç kontrol ve Ön Mali Kontrole ilişkin usul ve esaslar Yönetmeliğin 5. ve 9. Maddesi gereğince.

Maliye Bakanlığınca belirlenen ve 26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğinde Kamu İdarelerinin İç Kontrol sistemlerinin etkin bir şekilde kurulması ve uygulanması amacıyla,

Sinop İl Özel İdaresinde “Kamu İç Kontrol Standartları” Çalışması,

2017 yılında başlatılmış ve İdarede oluşturulan Çalışma Grubu ile İzleme ve Yönlendirme Kurulunun yürüttüğü çalışmalar sonucunda, “İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Raporu” ve “Uyum Eylem Planı” hazırlanmıştır

İl Özel İdaresinin yapım, mal ve hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, satış işlemlerinde ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre işlem yapılmaktadır.

A:İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ:

Hizmet kalitesini artırmak için teşkilatlanma sürecinin ve sosyal altyapının tamamlanarak aşağıda belirtilen amaç ve hedeflere ulaşmaya çalışılmaktadır.

- 1.Hizmetlerde verimlilik, etkinlik ve tutumluluğun dolayısıyla performansın artırılması,
- 2.Yapılacak hizmet ve yatırımlarda vatandaş katkısı ve memnuniyetinin esas alınması,
- 3.Yapılacak yatırımlarda mevzuatlara ve tasarruf tedbirlerine uyulması,
- 4.Nüfusun yoğun olduğu bölgelerde yatırımlara daha fazla ağırlık verilmesi,
- 5.Diğer kamu kurum, kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle gerekli ve yeterli koordinasyonun sağlanması,
- 6.Hizmetlerin sunumunda kalite anlayışından taviz verilmemesi,
- 7.Vatandaşlara karşı sorumlu, eşit ve adil davranılması,
- 8.Hizmet standartlarının yükseltilmesi,
- 9.Çalışanların Bilgi ve becerilerini artırarak hizmetlerdeki kalitenin artırılması,
- 10.Tüm çalışmalarda şeffaflık, katılımcılık ve hesap verme sorumluluğu vazgeçilmez ilkelere.

B:TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER;

Ulusal ve bölgesel plan hedefleri ve politikalarıyla uyumlu biçimde, ilin yerel potansiyelini harekete geçirmek ve kaynakların rasyonel kullanımını sağlayarak sürekli ve sürdürülebilir bir gelişmeyi planlamak.

İl Özel İdaresi Kanunu ile mevzuattaki diğer Kanunların İl özel İdarelerine verdikleri yetki çerçevesinde, İlde yaşayanlara ve gelecekte yaşayacaklara, yaşanabilir bir ortam bırakmak için izlenecek stratejileri ortaya koymaktır.

Temel Politikalarımızın başında değişen çevrede nelerle karşılaşılabilceğini, fırsat ve tehditlerin neler olabileceğini analitik olarak;

bilimsel metot kullanarak görmeye çalışmak, karşılaşılan olumsuzluklara karşı kurumun kendi yeteneklerini geliştirmek ve Hizmet sürecinde Devlet Halk İşbirliği ve uyumunu sağlamaktır.

A: MALİ BİLGİLER;**1:BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI:**

İl Özel İdaresi'nin 2024 Mali yılı gelir-gider Bütçesi ile gerçekleştirilen hizmetler ve faaliyetler, proje bazında yapılan harcamalar, elde edilen gelirler ilişikte sunulan ayrıntı cetvellerinde de görüleceği üzere aşağıda bölümler halinde izah edilmiştir.

Bütçenin uygulanması sırasında İl Özel İdaresinin görevlerinden özellikle ve öncelikle halkın mahalli ve müşterek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, kırsal kesime dönük hizmetlere ağırlık verilerek azami seviyede savurganlıktan kaçınılmış, Özel İdare Gelirlerini artırmak temel prensibinden hareket edilerek hizmet sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklama neticesinde; 2024 Mali yılı sonu itibarı ile 2023 Mali yılından devredilen 68.523.118,98.-TL, 2024 Mali yılı Bütçesi ile verilen 500.000.000,00 TL ve Ek Ödenek olarak verilen 55.000.000,00 TL, 2024 yılı sonu itibarıyla Merkezi Yönetim tarafından yatırım ve cari olarak gönderilen ve Valilik onayı ile bütçelenen 652.961.305,10.-TL olmak üzere toplam 1.212.017.476,65.-TL ödenek elde edilmiştir. Bu ödenekten yılsonu itibarı ile toplam 1.187.433.079,64.-TL gider tahakkuku gerçekleştirilmiş ve tamamı ödenmiştir. Harcanmayan ve arta kalan toplam 87.678.156,35.-TL ödeneğin 125.044,87.-TL lik kısmı iptal edilmiş ve harcama kalemi, faaliyet ve projelere tahsisli olan 87.553.111,48.-TL ödenek ise 2025 Mali yılı Bütçesine devredilmiştir.

İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇE BİLGİLERİ

YILI	BÜTÇELER	YILSONU GERÇEKLEŞMESİ	AÇIKLAMA
2021	85.000.000,00	309.415.558,16	Kesin Hesap
2022	170.000.000,00	590.660.399,43	Kesin Hesap
2023	310.000.000,00	747.520.858,22	Kesin Hesap
2024	555.000.000,00	1.212.017.476,65	Kesin Hesap

GELİR KESİN HESABI: Bütçe uygulama dönemi içinde tahsili gerçekleştirilen İlimiz Özel İdaresi öz gelirleri 2024 Mali yılı sonu itibarı ile 559.056.171,55.-TL gelir elde edilmiştir.

ÖZEL İDARE KAYNAKLI BÜTÇE VE HARCAMALARI

YILI	BÜTÇE	ÖZ BÜTÇE ÖDENEK TOPLAMI	ÖZ BÜTÇE HARCAMA	AÇIKLAMA
2021	85.000.000,00	117.860.644,81	78.429.652,58	Kesin hesap
2022	170.000.000,00	214.601.543,48	195.491.613,36	Kesin hesap
2023	310.000.000,00	329.094.550,40	306.377.198,38	Kesin hesap
2024	555.000.000,00	569.063.640,23	507.071.642,54	Kesin hesap


2024 YILI İL ÖZEL İDARESİ GELİRLERİ

Ekonomik Kodu	Gelirin Adı	
01 6 9 99	Harçlar	466.639,33
03 1 1 01	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	10.500,00
03 1 1 99	Diğer Mal Satış Gelirleri	5.984.500,00
03 1 2 52	Doğalgaz Hizmetlerine İlişkin Gelirler	2.170,25
03 1 2 99	Diğer Hizmet Gelirleri	2.793.826,90
03 4 5 58	Su Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı	9.630.335,01
03 6 1 01	Lojman Kira Gelirleri	350.885,63
03 6 1 02	Ecrimsil Gelirleri	269.226,27
03 6 1 99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	1.349.827,19
03 6 2 01	Taşınır Kira Gelirleri	502.131,44
03 9 9 99	Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülk. Gelirleri	1.134.339,32
04 2 1 51	Muhtar Ödenekleri için Genel Büt. Alınan	126.098.538,51
04 2 1 99	Cari Nit. Diğer İşler için Genel Büt. Alınan	818.939,36
04 2 2 52	Eğitim Hizmetleri için Genel Büt. Alınan	233.946.739,23
04 2 2 99	Sermaye Nitel. İşler için Genel Büt. Alınan	201.304.847,75
04 4 1 01	Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar	90.792.240,25
05 1 9 03	Mevduat Faizleri	29.011.736,57
05 2 2 51	Merkezi İdare Vergi Gelirl. Alınan Paylar	478.047.592,45
05 2 8 51	Maden İşletmelerinden Alınan Paylar	16.531.888,96
05 2 9 01	Çalışanlardan Tedavi Katılım Payı	229.831,93
05 3 2 99	Diğer İdari Para Cezaları	6.775.176,04
05 3 4 01	Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zammı	556.279,77
05 3 4 91	Usulsüzlük, Vergi Ziyai ve Kaçakç. Cezaları	4.154.069,22
05 3 9 99	Yukarıda Tanımlanm. Diğer Para Cezaları	244.008,47
05 3 9 01	İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	137.502,99
05 9 1 06	Kişilerden Alacaklar	870.158,02
05 9 1 99	Yukarıda Tanımlanm. Diğer Çeşitli Gelirler	3.545,79
TOPLAM		1.212.017.476,65

2024 İL Özel İdaresi Gelirlerine Göre;

A)VERGİ GELİRLERİMİZ	466.639,33
B)TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	22.027.742,01
C)ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	652.961.305,10
D)DİĞER GELİRLER	536.561.790,21
TOPLAM	1.212.017.476,65

ÖZ GELİR ANALİZİ

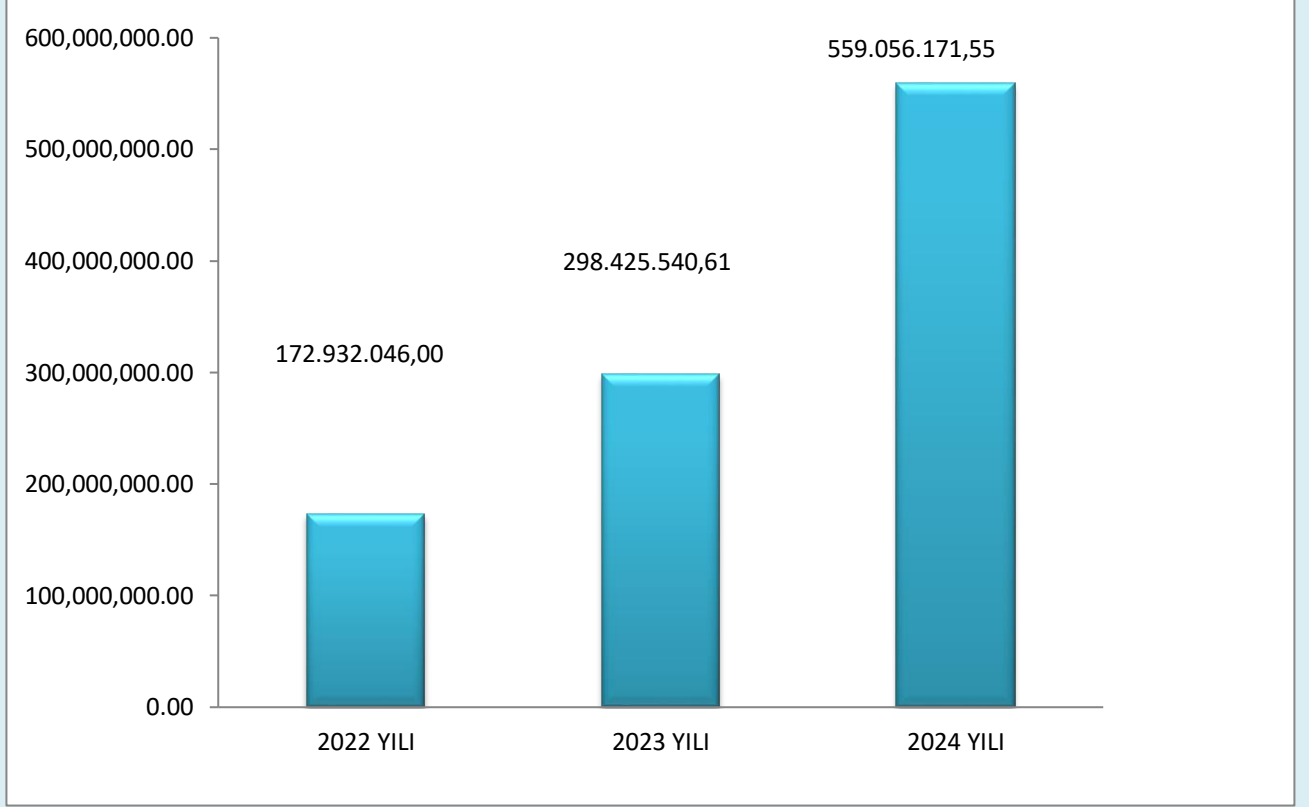

KİRA GELİR ANALİZİ

YILI	LOLMAN TAHAKKUK	LOJMAN TAHSİLAT	% ORANI	GAYRİMANKUL TAHAKKUK	GAYRİMENKUL TAHSİLAT	% ORANI
2022	219.512,49	218.576,69	%99	1.049.451,83	639.399,14	%61
2023	275.465,74	275.465,74	%100	1.189.213,61	812.011,92	%68
2024	350.885,63	350.885,63	%100	2.323.438,80	1.349.827,19	%58


b) GİDER KESİN HESABI :2024 yılı İlimiz Özel İdaresi harcamalarının toplamı 1.187.433.079,64.-TL olarak gerçekleşmiş olup bu harcamalar finansal kodlamada 2 grup altında toplanmıştır ;

FİNANSAL GİDER TÜRLERİ

FİNANSAL AYRIM	2022 YILI	2023 YILI	2024 YILI
MAHALLİ İDARELER	195.491.613,36	306.377.198,38	507.071.642,54
BAĞIŞ VE YARDIMLAR:	395.168.786,07	441.143.659,84	680.361.437,10
TOPLAM	590.660.399,43	747.520.858,22	1.187.433.079,64

Giderlerimizin fonksiyonel sınıflandırmaya göre Bütçe uygulama sonuçlarının giderleri aşağıdaki cetvelde çıkartılmış olup kurumsal ve ekonomik düzeylerdeki harcamalar temel mali tablolara ilişkin açıklamaların içinde ayrıntılı olarak aşağıda verilmiştir.

İL ÖZEL İDARESİ GENEL HARCAMA ANALİZİ

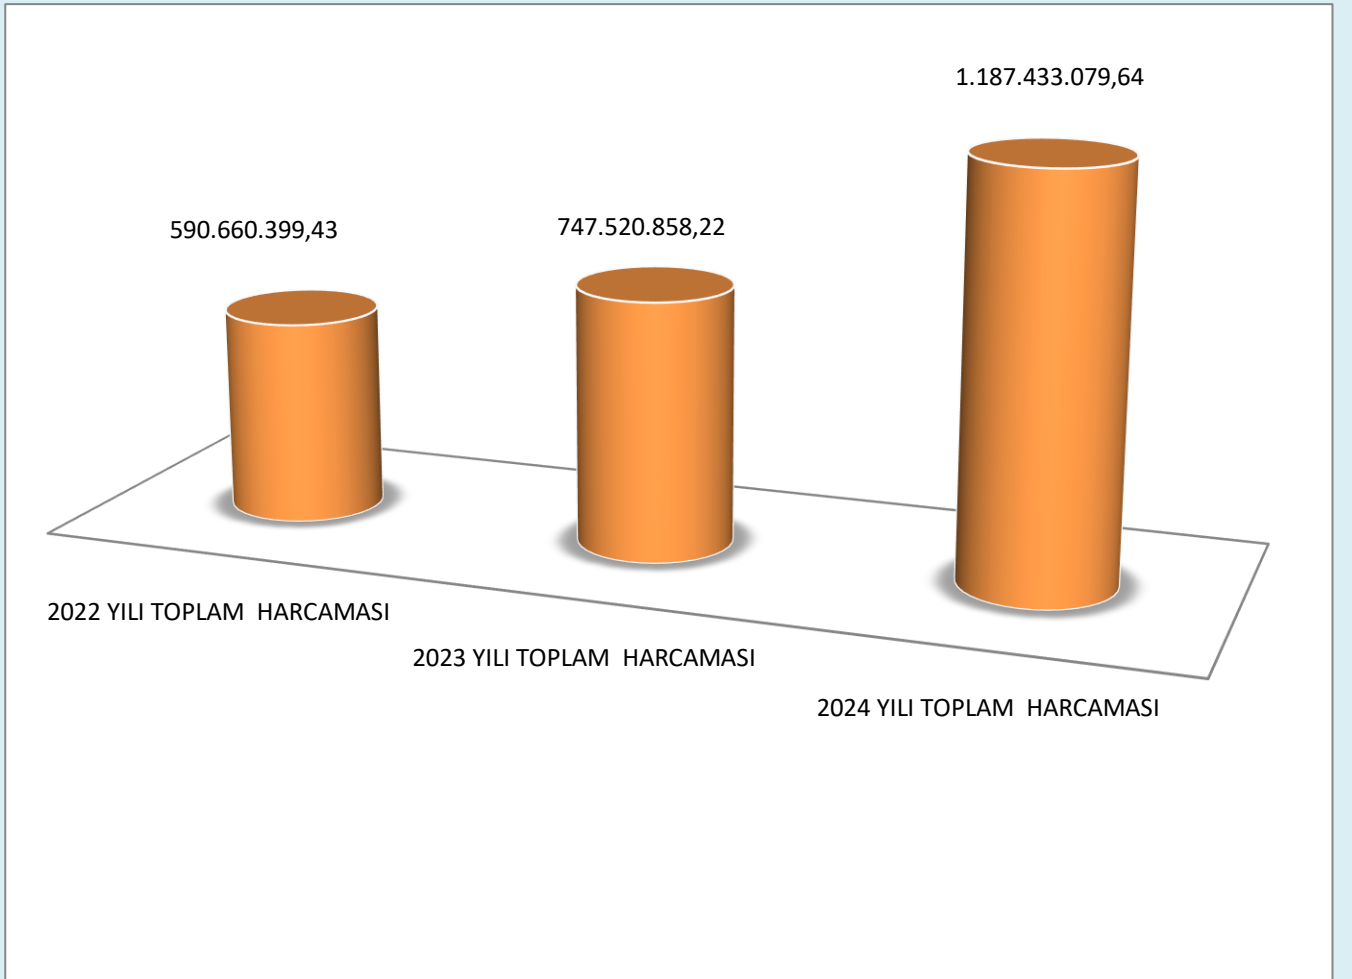

SİNOP İL ÖZEL İDARESİ SON ÜÇ YIL KURUMSAL SINIFLANDIRMA**HARCAMA CETVELİ**

KURUM ADI	2022 YILI HARCAMASI	2023 YILI HARCAMASI	2024 YILI HARCAMASI
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	13.425.673,58	7.147.322,78	14.612.869,08
İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ	114.621.127,18	242.743.320,94	409.840.675,55
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	17.030.509,08	23.510.765,07	36.748.821,21
İMAR VE KENTSEL İYİ. MÜDÜRLÜĞÜ	737.791,14	1.765.163,86	891.673,63
PLAN PROJE YATIL. VE İNŞAAT MÜD.	144.948.276,77	215.923.922,84	372.981.306,51
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜD.	86.961.417,65	44.862.158,66	48.685.003,85
MAKİNE İKM. BAK. ON. MÜDÜRLÜĞÜ	107.338.294,09	96.573.955,03	113.354.392,82
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	59.880,00	85.000,00	418.940,00
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞ. MÜD.	746.056,35	813.625,54	3.136.244,65
SU VE KANAL HİZ. MÜDÜRLÜĞÜ	1.114.722,19	2.612.767,70	7.000.950,87
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	69.972,87	202.833,44	1.101.819,14
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	103.912,77	377.532,57	618.207,62
AYANCIK İLÇE ÖZEL İDARESİ	35.327.147,12	25.709.452,02	41.743.510,35
BOYABAT İLÇE ÖZEL İDARESİ	15.068.253,63	23.602.827,16	37.781.519,25
DİKMEN İLÇE ÖZEL İDARESİ	3.631.676,06	8.056.130,09	9.246.927,01
DURAĞAN İLÇE ÖZEL İDARESİ	9.289.463,85	15.881.435,53	25.807.133,80
ERFELEK İLÇE ÖZEL İDARESİ	8.515.911,44	10.559.363,91	19.117.366,86
GERZE İLÇE ÖZEL İDARESİ	6.813.334,72	10.521.790,69	16.682.790,61
SARAYDÜZÜ İLÇE ÖZEL İDARESİ	3.821.467,69	5.896.421,36	9.498.389,71
TÜRKELİ İLÇE ÖZEL İDARESİ	21.035.511,15	10.675.069,03	18.164.537,12
TOPLAM	590.660.399,43	747.520.858,22	1.187.433.079,64

Kurumsal sınıflandırma tablosundaki açıklamalara göre İlimiz Özel İdaresi 2024 yılı içerisinde yapılan harcamalar neticesinde toplam ödenekten harcanmayan ve iptal edilen 125.044,87TL ödenekler düşüldükten sonra;

2025 Mali yılına toplam 87.553.111,48.-TL ödenek devretmiştir.


2-TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR: İlimiz Özel İdaresince 2024 Mali yılı içinde yapılan harcamaların dağılımı aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir

GİDER KESİN HESABI: 2024 Gider Bütçesinin harcama dağılımı aşağıda çıkartılmıştır.

1-Cari Harcamalar	675.097.613,55.-TL
2-Yatırım Harcamaları	431.269.599,06.-TL
3-Transfer Harcamaları	81.065.867,03TL
T OPLAM	1.187.433.079,64.-TL

olarak gerçekleşmiş olup. Cari Harcamaların Genel Harcamaya oranı %57Yatırım Harcamaların Genel Harcamalara oranı % 36 ve Transfer Harcamalarının Genel Harcamaya oranı %7 dir.

2024 YILI HARCAMA ANALİZ TABLOSU

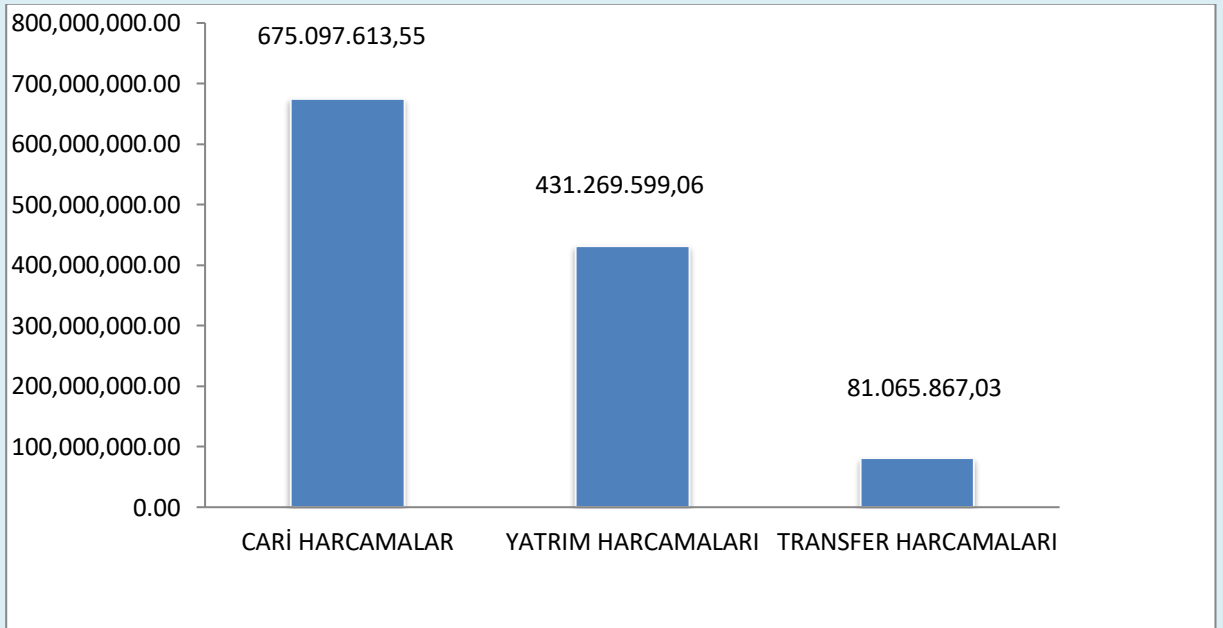

3:MALİ DENETİM SONUÇLARI :

Sinop İl Özel İdaresi 2023 Mali Yılı Denetimi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılmıştır. İl Özel İdaresi Kanununun 17. maddesi gereği Meclis denetim komisyonu 2024 Mali Yılı Denetimine 2025 yılı ocak ayında başlamış olup bu denetim de devam etmektedir.

4:DiĐER HUSUSLAR:

VİLAYETLER HİZMET BİRLİĐİ PAYI ÖDENMESİ:

2007 Mali yılında tüm İl Özel İdarelerinin iştiraki ile kurulan Vilayetler Hizmet Birliğine 2024 Mali Yılı payı olarak İl Özel İdare Bütçesinden % 1 oranındaki 1.708.363,26 TL olan payının tamamı ödenmiş ve İl Özel İdaresinin üyelik vasfı devam ettirilmiştir.

İLLER BANKASI ORTAKLIK PAYI ÖDEMESİ:

2024 Mali yılında İller Bankası Ortaklık Payı olarak 10.158.785,02 TL ödenmiş olup pay ödemeleri kaynaktan İller bankası tarafından kesilmektedir.

ULUSLAR ARASI KURULUŞLARA ÜYELİK CPMR:

2024 Mali yılında Uluslar arası Kuruluşlara CPMR üyeliğimiz devam etmekte olup Yılı içinde ödemede bulunulmamıştır.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇALIŞMALARI:

İlimiz Özel İdaresince müteşebbis teşekkül payları mali kaynak temin edildikçe muntazaman ödenmiş, bu amaçla 2024 Mali yılı Bütçesinden Boyabat Organize Sanayi'ye ödemede bulunulmamıştır.

5449 SAYILI KANUN GEREĐİ KALKINMA AJANSLARINA YARDIM:

2022 Mali Yılında ilgili Kanun gereĐi kurulan Kalkınma ajansına 2024 Mali Yılı payı olarak İl Özel İdare Bütçesinden % 1 oranında ayrılan 2.083.921,56 TL olan payının tamamı ödenmiş ve İl Özel İdaresinin üyelik vasfı devam ettirilmiştir.

KÖY YARDIMLARI:

2024 Mali Yılı İl Özel İdaresi Bütçesine Köy yatırımlarının desteklenmesi ve kırsal alan faaliyetlerinin önceliĐi dikkate alınarak 1.166.954,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenegın tamamı Merkez ve İlçelerimizdeki ilgili köy tüzel kişiliklerinin hesaplarına aktarılmıştır.

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİNE YAPILAN YARDIMLAR:

2024 Mali Yılı sonu itibariyle Birliklere yardım faslında bütçe ile verilen aktarma sureti ile eklenen ve ek ödeneklerle birlikte toplam 69.740.018,68 TL ödenek kaydedilmiş ve bu ödenegın tamamı Merkez ve İlçe Köylere Hizmet Götürme Birlikleri yetkili organların kararı ile gönderilmiştir.

2024 YILI KÖYLERE YAPILAN YARDIMLAR

İLÇESİ:	YAPILAN YARDIM MİKTARI:
MERKEZ	490.000,00
AYANCIK	--
BOYABAT	86.954,00
DİKMEN	--
DURAĞAN	75.000,00
ERFELEK	210.000,00
GERZE	185.000,00
SARAYDÜZÜ	--
TÜRKELİ	120.000,00
TOPLAM	1.166.954,00

2024 YILI KÖYLERE HİZ.GÖTÜRME BİRLİKLERE YAPILAN YARDIMLAR

İLÇESİ:	YAPILAN YARDIM MİKTARI:
MERKEZ	10.820.584,26
AYANCIK	22.598.904,64
BOYABAT	8.387.870,62
DİKMEN	1.694.957,26
DURAĞAN	6.652.482,32
ERFELEK	6.328.876,04
GERZE	3.045.000,00
SARAYDÜZÜ	2.056.192,92
TÜRKELİ	8.155.150,62
TOPLAM	69.740.018,68

YILLAR İTİBARIYLA BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAKAMLARI

YILI	YILSONU GERÇEKLEŞEN ÖZ BÜTÇE	YILSONU GERÇEKLEŞEN BÜTÇE TOPLAMI	YILSONU TOPLAM HARCAMASI	AÇIKLAMA
2005	6.500.000,00	40.744.347,40	30.161.967,76	KESİN HESAP
2006	7.000.000,00	47.232.179,97	35.135.025,91	KESİN HESAP
2007	7.960.000,00	41.351.699,21	31.864.958,13	KESİN HESAP
2008	10.520.000,00	44.331.618,58	30.772.197,84	KESİN HESAP
2009	13.087.307,00	54.700.018,71	42.903.426,53	KESİN HESAP
2010	17.312.034,91	61.182.613,58	48.376.244,14	KESİN HESAP
2011	21.900.000,00	76.358.323,81	57.008.211,66	KESİN HESAP
2012	20.000.000,00	83.333.824,08	57.468.212,21	KESİN HESAP
2013	23.500.000,00	139.146.138,67	96.569.174,30	KESİN HESAP
2014	27.000.000,00	147.931.278,28	100.750.861,78	KESİN HESAP
2015	41.000.000,00	167.296.469,96	111.100.999,96	KESİN HESAP
2016	45.000.000,00	176.030.145,83	110.580.884,83	KESİN HESAP
2017	48.000.000,00	200.323.446,69	137.134.344,86	KESİN HESAP
2018	51.000.000,00	207.141.831,48	154.815.409,11	KESİN HESAP
2019	57.000.000,00	218.486.374,35	164.268.742,35	KESİN HESAP
2020	65.000.000,00	242.299.118,52	173.824.312,87	KESİN HESAP
2021	85.000.000,00	309.415.558,16	227.108.868,59	KESİN HESAP
2022	170.000.000,00	649.068.614,42	590.660.399,43	KESİN HESAP
2023	310.000.000,00	816.096.250,01	747.520.858,22	KESİN HESAP
2024	555.000.000,00	1.275.236.280,86	1.187.433.079,64	KESİN HESAP







FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ:2024

SİNOP İL ÖZEL İDARESİ PERSONEL DURUM TABLOSU						
GÖREV VE ÜNVANLAR	İL GEN.MEC.	İHDAS	EDİLMEYEN	NORM KADRO STANDARDI	İL GENEL MEC. İHDAS EDİLEN	DOLU BOŞ
GENEL SEKRETER				1	1	1 -
GENEL SEKRETER YARDIMCISI				2	2	2 -
HUKUK MÜŞAVİRİ				1	1	- 1
AVUKAT	1			3	2	2 -
MÜDÜR	2			14	12	4 8
UZMAN	6			7	1	- 1
ŞEF	6			28	22	19 3
MALİ HİZMETLER UZMANI				2	2	- 2
MALİ HİZMETLER UZMAN YRD.				1	1	1 -
İDARİ PERSONEL	7			61	54	39 15
TEKNİK HİZMETLER	0			56	56	43 13
SAĞLIK PERSONELİ	7			10	3	- 3
YARDIMCI HİZMETLER	1			24	23	14 9
MEMUR KADROLARI TOPLAMI	30			210	180	125 55
SÜREKLİ İŞÇİ TOPLAMI				105	0	37 68
NORM KADRO TOPLAM PERSONEL				315	180	162 79
İLÇE ÖZEL İDARE MÜD.(İLÇE SAYISI KADAR)				8	8	6 2
NORM KADRO CETVELİNDE BELİRTİLMEYENLER (İÇ DENETÇİ)				3	3	0 3
TOPLAM MEMUR SAYISI				221	191	131 60
GENEL TOPLAM				326	191	168 128
NOT : 31.05.2013 tarihli Resmi Gazete'de yer alan 2013/4747 BKK ile İç Denetçi normu 3'e çıkarıldı						
Sinop İl Özel İdaresi Personel Limited Şirketi Çalışan Sayısı : 177						

1:FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ:

İl Özel İdaresinin ve ödeneği Merkezi Yönetim Bütçelerinden Kurumumuza aktarılan genel ve katma bütçeli kuruluşlarla; finansmanı İl Özel İdaresi tarafından sağlanan kurumların ihtiyaç programı kapsamında bina ve tesislerinin;

- 1) Proje, keşif, teknik şartname ve yaklaşık maliyetini hazırlamak, hazırlatmak,,
- 2) Yapım, onarım ve tadilatlarla ilgili her tür inşaat işlerini gerçekleştirmek,
- 3) İhale ve muayene kabul komisyonlarında görev almak,
- 4) İhalesi yapılan işlerin kontrollük hizmetlerini yürütmek,

5) Yatırım ve ihtiyaç programı kapsamında yeni inşaatların ruhsatlarının alınması ve takibini yapmaktır. Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü'nün 2024 yılında, İl Özel İdaresi ve Kurumumuza aktarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait yapımı devam eden ve yapımı biten yeni bina yapım işleri, proje hizmet alımları ve onarım yapım işleri;

KUŞÜZÜMÜ KONAĞI KETEN MÜZESİ RESTORASYON YAPIM İŞİ



İHALE TARİHİ	28.04.2022
SÖZLEŞME TARİHİ	6.06.2022
SÖZLEŞME BEDELİ	9.212.262,59 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	10.06.2022
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	8.01.2024
YÜKLENİCİ FİRMA	Hasan Fehmi ŞAHİN
GERÇEKLEŞME ORANI	% 100
AÇIKLAMALAR	Bitti.

ATATÜRK CADDESİ CEPHE İYİLEŞTİRME YAPIM İŞİ



İHALE TARİHİ	6.03.2023
SÖZLEŞME TARİHİ	20.03.2023
SÖZLEŞME BEDELİ	6.015.000,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	29.03.2023
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	18.12.2024
YÜKLENİCİ FİRMA	Barbaros Müh.İnş.Oto Emlak Yak.Nak.Turz.ve San.Tic.Ltd.Şti.
GERÇEKLEŞME ORANI	% 100
AÇIKLAMALAR	Bitti.

KALE SURLARI ve SAAT KULESİ ACİL ONARIM İŞİ



İHALE TARİHİ	07.03.2023
SÖZLEŞME TARİHİ	27.03.2023
SÖZLEŞME BEDELİ	8.506.552,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	31.03.2023
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	28.12.2023
YÜKLENİCİ FİRMA	Barbaros Müh.İnş.Oto Emlak Yak.Nak.Turz.ve San.Tic.Ltd.Şti.
GERÇEKLEŞME ORANI	% 100
AÇIKLAMALAR	Bitti.

ŞEHİT BÜLENT YALÇIN GÜZEL SANATLARLAR LİSESİ KAPALI SPOR SALONU YAPIM İŞİ



İHALE TARİHİ	27.04.2023
SÖZLEŞME TARİHİ	26.05.2023
SÖZLEŞME BEDELİ	15.741.000,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	5.06.2023
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	31.01.2024
YÜKLENİCİ FİRMA	Cihan AYAYDIN
GERÇEKLEŞME ORANI	% 100
AÇIKLAMALAR	Bitti.

SİNOP MERKEZ VE ERFELEKTE PREFABRİK MUHTATLIK BİNASI YAPIM İŞİ



İHALE TARİHİ	26.03.2024
SÖZLEŞME TARİHİ	19.04.2024
SÖZLEŞME BEDELİ	1.450.000,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	24.04.2024
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	21.10.2024
YÜKLENİCİ FİRMA	ALİ EROL
GERÇEKLEŞME ORANI	% 100
AÇIKLAMALAR	Bitti.

DURAĞAN İLKOKULU (4 DERSLİKLİ) YAPIM İŞİ



İHALE TARİHİ	24.11.2022
SÖZLEŞME TARİHİ	4.01.2023
SÖZLEŞME BEDELİ	12.355.000,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	5.01.2023
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	28.02.2024 (cezalı çalıştı)
YÜKLENİCİ FİRMA	Surahan Yapı Müh.San Ve Tic.Ltd.Şti.
GERÇEKLEŞME ORANI	% 95
AÇIKLAMALAR	Geçici Kabul Aşamasında.

GERZE İLKOKULU (24 DERSLİK) YAPIM İŞİ



İHALE TARİHİ	16.06.2022
SÖZLEŞME TARİHİ	6.07.2022
SÖZLEŞME BEDELİ	22.455.000,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	19.07.2022
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	7.03.2024 (cezalı çalıştı)
YÜKLENİCİ FİRMA	Asm Altyapı San.Müh.Aş.&Surahan Yapı Müh.San Ve Tic.Ltd.Şti.İş Ortaklığı
GERÇEKLEŞME ORANI	% 95
AÇIKLAMALAR	Geçici Kabul Aşamasında.

BOYABAT İNÖNÜ İLKOKULU RESTORASYON YAPIM İŞİ



İHALE TARİHİ	23.11.2021
SÖZLEŞME TARİHİ	27.12.2021
SÖZLEŞME BEDELİ	6.244.267,37 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	6.01.2022
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	31.12.2024
YÜKLENİCİ FİRMA	Barbaros Müh.İnş.Oto Emlak Yak.Nak.Turz.ve San.Tic.Ltd.Şti.
GERÇEKLEŞME ORANI	% 95
AÇIKLAMALAR	Geçici Kabul Aşamasında.

SİNOP MERKEZ TESCİLLİ TARİHİ JANDARMA BİNASI CEPHE TEMİZLİĞİ ve ÇATI ONARIM İŞİ



İHALE TARİHİ	12.03.2023
SÖZLEŞME TARİHİ	5.05.2024
SÖZLEŞME BEDELİ	8.448.000,14 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	8.05.2024
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	3.01.2025
YÜKLENİCİ FİRMA	Doğancan TANK Pruva Restorasyon
GERÇEKLEŞME ORANI	% 95
AÇIKLAMALAR	Geçici Kabul Aşamasında.

GERZE 16 DERSLİK İMAM HATİP LİSESİ+100 ÖĞRENCİ KAPASİTELİ PANSİYON+KAPALI SPOR SALONU YAPIM İŞİ




İHALE TARİHİ	24.05.2022
SÖZLEŞME TARİHİ	20.06.2022
SÖZLEŞME BEDELİ	54.900.000,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	20.06.2022
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	21.09.2024 (cezalı çalışıyor)
YÜKLENİCİ FİRMA	İsmail SEVİNDİK&Sezcan İnş.Ltd.Şti.İş Ortaklığı
GERÇEKLEŞME ORANI	% 88
AÇIKLAMALAR	Devam Ediyor.

TÜRKELİ HÜKÜMET KONAĞI YAPIM İŞİ



İHALE TARİHİ	31.10.2022
SÖZLEŞME TARİHİ	18.11.2022
SÖZLEŞME BEDELİ	62.357.000,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	28.11.2022
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	27.10.2024 (cezalı çalışıyor)
YÜKLENİCİ FİRMA	İsmail SEVİNDİK&Sezcan İnş.Ltd.Şti.İş Ortaklığı
GERÇEKLEŞME ORANI	% 65
AÇIKLAMALAR	Devam Ediyor.

NİSİ GÖLETİ ÇEVRE DÜZENLEMESİ BİRİNCİ ETAP YAPIM İŞİ

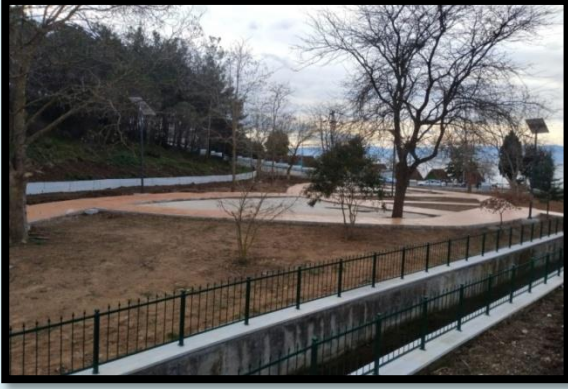

İHALE TARİHİ	14.05.2024
SÖZLEŞME TARİHİ	3.09.2024
SÖZLEŞME BEDELİ	9.469.000,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	9.09.2024
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	6.02.2025
YÜKLENİCİ FİRMA	Cihan AYAYDIN
GERÇEKLEŞME ORANI	% 80
AÇIKLAMALAR	Devam Ediyor.

SİNOP MERKEZ TOBB (24 DERSLİKLİ) GELİNCİK ORTAOKULU YAPIMI



İHALE TARİHİ	06.07.2023
SÖZLEŞME TARİHİ	1.08.2023
SÖZLEŞME BEDELİ	65.222.061,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	10.08.2023
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	1.05.2025
YÜKLENİCİ FİRMA	Trak Müh.Yapı İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.&Burak Akyıldız İş Ortaklığı
GERÇEKLEŞME ORANI	% 77
AÇIKLAMALAR	Devam Ediyor.

BOYABAT HALK EĞİTİM MERKEZİ YAPIM İŞİ



İHALE TARİHİ	26.10.2023
SÖZLEŞME TARİHİ	5.12.2023
SÖZLEŞME BEDELİ	69.555.000,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	14.12.2023
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	03.12.2025
YÜKLENİCİ FİRMA	Cihan AYAYDIN&Turgay Kemal KAAN İş Ortaklığı
GERÇEKLEŞME ORANI	% 70
AÇIKLAMALAR	Devam Ediyor.

SİNOP TÜRKELİ İLÇESİ 4 DERSLİKLİ OKUL YAPIM



İHALE TARİHİ	04.07.2023
SÖZLEŞME TARİHİ	15.09.2023
SÖZLEŞME BEDELİ	21.950.000,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	20.09.2023
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	16.07.2024 (cezalı çalışıyor)
YÜKLENİCİ FİRMA	Sezcan İnş.San.Tic.Ltd.Şti.
GERÇEKLEŞME ORANI	% 65
AÇIKLAMALAR	Devam Ediyor.

SİNOP DURAĞAN JANDARMA KOMUTANLIĞI HİZMET BİNASI VE TESİSLERİ YAPIM İŞİ



İHALE TARİHİ	11.07.2024
SÖZLEŞME TARİHİ	29.07.2024
SÖZLEŞME BEDELİ	38.380.000,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	6.08.2024
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	30.09.2025
YÜKLENİCİ FİRMA	Efe Rıza Taah.Tur.İnş.Tic. Ltd.Şti
GERÇEKLEŞME ORANI	% 30
AÇIKLAMALAR	Devam Ediyor.

ERFELEK İLÇESİ 16 DERSLİKLİ LİSE YAPIM İŞİ



İHALE TARİHİ	26.11.2024
SÖZLEŞME TARİHİ	16.11.2024
SÖZLEŞME BEDELİ	66.000.000,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	25.12.2024
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	18.06.2026
YÜKLENİCİ FİRMA	ARS-MAR İNŞ. İnş. Malz.Temz.Gıda San.ve Tic. Ltd.Şti.
GERÇEKLEŞME ORANI	% 1
AÇIKLAMALAR	Devam Ediyor.

BOYABAT İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ



İHALE TARİHİ	14.09.2023
SÖZLEŞME TARİHİ	10.10.2023
SÖZLEŞME BEDELİ	34.955.000,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	18.10.2023
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	11.12.2024
YÜKLENİCİ FİRMA	Surahan Yapı Müh. San Ve Tic.Ltd.Şti.
GERÇEKLEŞME ORANI	% 45
AÇIKLAMALAR	Fesih Edildi

SİNOP AYANCIK 8 DERSLİKLİ İLKOKULU YAPIM İŞİ



İHALE TARİHİ	17.05.2023
SÖZLEŞME TARİHİ	8.06.2023
SÖZLEŞME BEDELİ	19.055.000,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	16.06.2023
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	11.04.2024
YÜKLENİCİ FİRMA	Surahan Yapı Müh.San Ve Tic.Ltd.Şti.
GERÇEKLEŞME ORANI	% 40
Açıklamalar	Fesih Edildi.

BOYABAT CUMHURİYET DEPREM GÜÇLENDİRME ONARIM İŞİ

İHALE TARİHİ	-
SÖZLEŞME TARİHİ	-
SÖZLEŞME BEDELİ	-
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	-
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	-
YÜKLENİCİ FİRMA	-
GERÇEKLEŞME ORANI	-
AÇIKLAMALAR	Maliyeti İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Gönderildi. İhale onayı bekleniyor.

İL ÖZEL İDARESİ ve DIŞ KURUMLARA AİT DİĞER BÜYÜK ONARIM İŞLERİMİZ**SİNOP İL ÖZEL İDARESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ATÖLYE ÇATI ve ELEKTRİK TESİSATI ONARIM İŞİ**

İHALE TARİHİ	26.09.2023
SÖZLEŞME TARİHİ	10.10.2023
SÖZLEŞME BEDELİ	3.957.000,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	11.10.2023
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	27.06.2024
YÜKLENİCİ FİRMA	Alaz Taah.İnş.Turzm Tic..Ltd.Şti
AÇIKLAMALAR	Bitti.

SİNOP İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KEFEVİ POLİS LOJMANLARI A-B-C-D-D1 BLOK ÇATI ONARIM İŞİ

İHALE TARİHİ	11.10.2023
SÖZLEŞME TARİHİ	2.11.2023
SÖZLEŞME BEDELİ	1.379.900,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	10.11.2023
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	29.01.2024
YÜKLENİCİ FİRMA	Ümit TÜYSÜZ
AÇIKLAMALAR	Bitti.

SİNOP DURAĞAN MTAL YANGIN MERDİVENİ ÇATI ve PENCERE DOĞRAMA ONARIM İŞİ

İHALE TARİHİ	13.10.2023
SÖZLEŞME TARİHİ	2.11.2023
SÖZLEŞME BEDELİ	787.000,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	10.11.2023
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	24.01.2024
YÜKLENİCİ FİRMA	Kama Müh.Mim.İnş.Taah.Mad.San.ve Tic.Ltd.Şti.
AÇIKLAMALAR	Bitti.

SİNOP DURAĞAN MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU YIKIM İŞİ

İHALE TARİHİ	31.10.2023
SÖZLEŞME TARİHİ	28.11.2023
SÖZLEŞME BEDELİ	312.000,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	4.12.2023
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	3.01.2024
YÜKLENİCİ FİRMA	Onur Hafriyat İnş.Taah.Tic.Ltd.Şti
AÇIKLAMALAR	Bitti.

SİNOP MERKEZ İLÇE TANGAL İLKOKULU ANA SINIFI WC ONARIM İŞİ

İHALE TARİHİ	-
SÖZLEŞME TARİHİ	22.12.2023
SÖZLEŞME BEDELİ	55.950,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	2.01.2024
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	22.01.2024
YÜKLENİCİ FİRMA	SİNOS İNŞ.YAPI MALZ.TURİZM SAN.İÇ ve DIŞ TİC.LTD.ŞTİ
AÇIKLAMALAR	Bitti.

SİNOP MERKEZ SARI SALTUK ANADOLU LİSESİ PANSİYON BİNASI YANGIN MERDİVENİ ONARIM İŞİ

İHALE TARİHİ	-
SÖZLEŞME TARİHİ	2.01.2024
SÖZLEŞME BEDELİ	25.900,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	5.01.2024
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	19.01.2024
YÜKLENİCİ FİRMA	SİNOS İNŞ.YAPI MALZ.TURİZM SAN.İÇ ve DIŞ TİC.LTD.ŞTİ
AÇIKLAMALAR	Bitti.

SİNOP MERKEZ MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU ÖĞRETMENLER ODASI YAPIM İŞİ

İHALE TARİHİ	12.12.2023
SÖZLEŞME TARİHİ	2.01.2024
SÖZLEŞME BEDELİ	245.770,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	9.01.2024
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	19.02.2024
YÜKLENİCİ FİRMA	SİNOS İNŞ.YAPI MALZ.TUR. SAN.İÇ ve DIŞ TİC.LTD.ŞTİ
AÇIKLAMALAR	Bitti.

SİNOP MERKEZ BİLİM SANAT MERKEZİ BİNASINDA FİZİK KİMYA FEN ve BİYOLOJİ LABORATUVARI YAPIM İŞİ

İHALE TARİHİ	8.12.2023
SÖZLEŞME TARİHİ	4.01.2024
SÖZLEŞME BEDELİ	274.480,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	10.01.2024
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	23.02.2024
YÜKLENİCİ FİRMA	HAYAL BENİAN DAĞLI
AÇIKLAMALAR	Bitti.

SİNOP MERKEZ İSTİKLAL İLKOKULU BAHÇESİ TÖREN ALANI YAPIM İŞİ

İHALE TARİHİ	1.11.2023
SÖZLEŞME TARİHİ	24.11.2023
SÖZLEŞME BEDELİ	174.057,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	5.12.2023
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	4.01.2024
YÜKLENİCİ FİRMA	Recai ÇİLİNGİR
AÇIKLAMALAR	Bitti.

SİNOP AYANCIK FATİH İLKOKULU OYUN BAHÇESİ ZEMİN ONARIMI ve ÇEVRESİNE TEL ÖRGÜ ÇEKİLMESİ İŞİ

İHALE TARİHİ	-
SÖZLEŞME TARİHİ	18.12.2023
SÖZLEŞME BEDELİ	90.000,00 TL

İŞE BAŞLAMA TARİHİ	25.12.2023
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	15.01.2024
YÜKLENİCİ FİRMA	Fatih Doğukan YILDIZ
AÇIKLAMALAR	Bitti.

SİNOP ŞEHİT HALİL ÖZDOĞRU ORTAOKULU ONARIM İŞİ

İHALE TARİHİ	-
SÖZLEŞME TARİHİ	2.01.2024
SÖZLEŞME BEDELİ	118.500,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	12.01.2024
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	1.02.2024
YÜKLENİCİ FİRMA	ERY AUTO İNŞ. GALERİ EMLAK SAN.TİC.LTD. ŞTİ.
AÇIKLAMALAR	Bitti.

SİNOP MERKEZ MELİKŞAH KÖYÜ GÖÇ İDARESİ GEÇİCİ BARINMA BİNASI ONARIM İŞİ

İHALE TARİHİ	-
SÖZLEŞME TARİHİ	19.02.2024
SÖZLEŞME BEDELİ	700.000,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	23.02.2024
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	6.03.2024
YÜKLENİCİ FİRMA	Sinop Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR	Bitti.

SİNOP MERKEZ HÜKÜMET KONAĞI İÇ CEPHE BOYA VE DEMİR İMALAT İŞLERİNİN YAPILMASI İŞİ

İHALE TARİHİ	04.12.2023
SÖZLEŞME TARİHİ	28.12.2023
SÖZLEŞME BEDELİ	187.057,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	2.01.2024
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	1.03.2024
YÜKLENİCİ FİRMA	Recai ÇİLİNGİR
AÇIKLAMALAR	Bitti.

SİNOP AYANCIK ATATÜRK ANADOLU LİSESİ TUVALET TADİLATI İŞİ

İHALE TARİHİ	23.11.2023
SÖZLEŞME TARİHİ	13.12.2023
SÖZLEŞME BEDELİ	467.000,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	14.12.2023
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	12.02.2024
YÜKLENİCİ FİRMA	Muharrem KABA
AÇIKLAMALAR	Bitti.

SİNOP İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ POLİSEVİ MANTOLAMA İŞİ

İHALE TARİHİ	6.12.2023
SÖZLEŞME TARİHİ	27.12.2023
SÖZLEŞME BEDELİ	1.246.000,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	2.01.2024
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	4.03.2024
YÜKLENİCİ FİRMA	Yunus Emre TUDEŞ
AÇIKLAMALAR	Bitti.

SİNOP GERZE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ LOJMANININ İDARE BİNASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İŞİ

İHALE TARİHİ	06.12.2023
SÖZLEŞME TARİHİ	28.12.2023
SÖZLEŞME BEDELİ	919.057,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	8.01.2024
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	22.02.2024
YÜKLENİCİ FİRMA	Recai ÇİLİNGİR
AÇIKLAMALAR	Bitti.

SİNOP İLİ ERFELEK İLÇESİ AKÇAÇAM KÖYÜ ve MERKEZ İLÇE ÇOBANLAR KÖYÜ MUHTARLIK HİZMET BİNALARININ ZEMİN ETÜT RAPORU HİZMET ALIM İŞİ

İHALE TARİHİ	-
SÖZLEŞME TARİHİ	13.02.2024
SÖZLEŞME BEDELİ	26.000,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	20.02.2024
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	12.03.2024
YÜKLENİCİ FİRMA	Meteler Mühendislik
AÇIKLAMALAR	Bitti.

SİNOP MERKEZ CUMHURİYET İLKOKULU B BLOK TESCİLLİ BİNA ANA SINIFI LAMİNANT YAPIM İŞİ

İHALE TARİHİ	-
SÖZLEŞME TARİHİ	20.02.2024
SÖZLEŞME BEDELİ	46.457,57 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	20.02.2024
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	21.03.2024
YÜKLENİCİ FİRMA	Sedef YAVUZ
AÇIKLAMALAR	Bitti.

SİNOP MERKEZ İLÇE ABALI İLKOKULU ANAOKULU BİNASI FOSEPTİK VE KANALİZASYON HATTI YAPIM İŞİ

İHALE TARİHİ	-
SÖZLEŞME TARİHİ	22.04.2024
SÖZLEŞME BEDELİ	134.000,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	24.04.2024
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	23.07.2024
YÜKLENİCİ FİRMA	HAYAL BENİAN DAĞLI
AÇIKLAMALAR	Bitti.

SİNOP TÜRKELİ AYAZ ORTAOKULU BAKIM ONARIM İŞİ

İHALE TARİHİ	03.04.2024
SÖZLEŞME TARİHİ	16.04.2024
SÖZLEŞME BEDELİ	1.656.500,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	25.04.2024
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	9.07.2024
YÜKLENİCİ FİRMA	ERY AUTO İNŞ. GALERİ EMLAK SAN.TİC.LTD. ŞTİ.
AÇIKLAMALAR	Bitti.

SİNOP TÜRKELİ HELALDI ORTAOKULU KALORİFER KAZANI DEĞİŞİM İŞİ

İHALE TARİHİ	-
SÖZLEŞME TARİHİ	29.05.2024
SÖZLEŞME BEDELİ	137.400,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	12.06.2024
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	01.08.2024
YÜKLENİCİ FİRMA	Ayşe BOZKURT
AÇIKLAMALAR	Bitti.

SİNOP TÜRKELİ HELALDI ORTAOKULU KALORİFER KAZANI DEĞİŞİM İŞİ

İHALE TARİHİ	-
SÖZLEŞME TARİHİ	29.05.2024
SÖZLEŞME BEDELİ	137.400,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	12.06.2024
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	01.08.224
YÜKLENİCİ FİRMA	Ayşe BOZKURT
AÇIKLAMALAR	Bitti.

SİNOP MERKEZ ADA ANAOKULU MUTFAĞI DOĞALGAZ TESİSATI YAPIM İŞİ

İHALE TARİHİ	-
SÖZLEŞME TARİHİ	3.07.2024
SÖZLEŞME BEDELİ	37.000,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	10.07.2024
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	25.07.2024
YÜKLENİCİ FİRMA	Erdoğan Mekanik Tesisat Tic.Ltd. Şti.
AÇIKLAMALAR	Bitti.

SİNOP DİKMEN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI KALORİFER KAZANI YENİLENMESİ YAPIM İŞİ

İHALE TARİHİ	13.06.2024
SÖZLEŞME TARİHİ	3.07.2024
SÖZLEŞME BEDELİ	368.457,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	9.07.2024
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	6.09.2024
YÜKLENİCİ FİRMA	Cihan ÇOR
AÇIKLAMALAR	Bitti.

SİNOP AYANCIK HALK EĞİTİM MERKEZİ ASO MÜDÜRLÜĞÜ KETENEVİ BİNASI KALORİFER KAZANI YENİLENMESİ YAPIMI İŞİ

İHALE TARİHİ	04.04.2024
SÖZLEŞME TARİHİ	22.04.2024
SÖZLEŞME BEDELİ	237.900,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	30.04.2024
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	14.06.2024
YÜKLENİCİ FİRMA	Kardeşler Isıtma Soğutma İnş.Müh.San.Tic.Ltd.Şti
AÇIKLAMALAR	Bitti.

**SİNOP MERKEZ ADA MAHALLESİ TEKKE SOKAK C BLOK NO:6 MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
LOJMANI ONARI İŞİ**

İHALE TARİHİ	10.05.2024
SÖZLEŞME TARİHİ	31.05.2024
SÖZLEŞME BEDELİ	278.880,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	5.06.2024
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	6.07.2024
YÜKLENİCİ FİRMA	YA-DE TOPTAN GIDA ve TEMİZLİK ÜRÜNLERİ İNŞAAT TAAH.TUR.TİC.LTD.ŞTİ
AÇIKLAMALAR	Bitti.

**SİNOP MERKEZ DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR 10'UNCU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İDARE
BİNASI TADİLAT YAPIMI İŞİ**

İHALE TARİHİ	05.12.2023
SÖZLEŞME TARİHİ	27.12.2023
SÖZLEŞME BEDELİ	9.993.000,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	5.01.2024
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	18.07.2024
YÜKLENİCİ FİRMA	İSTANKOL TURİZ İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ
AÇIKLAMALAR	Bitti.

**SİNOP İL KÜLTÜR ve TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI KARŞILAMA OFİSİ GİRİŞ KÖPRÜSÜ
ve TOTEM YAPIM İŞİ**

İHALE TARİHİ	24.10.2023
SÖZLEŞME TARİHİ	9.11.2023
SÖZLEŞME BEDELİ	1.070.752,72 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	20.11.2023
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	18.05.2024
YÜKLENİCİ FİRMA	Recai ÇİLİNGİR
AÇIKLAMALAR	Bitti.

SİNOP AYANCIK YENİKONAK YATILI BÖLGE ORTAOKULU BAKIM ONARIM İŞİ

İHALE TARİHİ	12.06.2024
SÖZLEŞME TARİHİ	28.06.2024
SÖZLEŞME BEDELİ	244.000,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	8.07.2024
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	22.08.2024
YÜKLENİCİ FİRMA	Fatih Doğukan YILDIZ
AÇIKLAMALAR	Bitti.

SİNOP FEN LİSESİ ÇOK AMAÇLI SALON ONARIM İŞİ

İHALE TARİHİ	25.06.2024
SÖZLEŞME TARİHİ	10.07.2024
SÖZLEŞME BEDELİ	290.000,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	19.07.2024
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	2.09.2024
YÜKLENİCİ FİRMA	ERY AUTO İNŞ. GALERİ EMLAK SAN.TİC.LTD. ŞTİ.
AÇIKLAMALAR	Bitti.

SİNOP MERKEZ OSMANİYE İLKOKULU YEMEKHANE ve BODRUM KATI BOYANMASI İŞİ

İHALE TARİHİ	-
SÖZLEŞME TARİHİ	24.09.2024
SÖZLEŞME BEDELİ	57.500,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	-
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	-
YÜKLENİCİ FİRMA	Burak Efe Sera Sistemleri İnş.Elektronik San. Ve Tic.Ltd. Şti.
AÇIKLAMALAR	Bitti.

SİNOP MERKEZ KARAKUM MEVKİİNDE ADA OTELİ ISITMA ve MUTFAK DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ

İHALE TARİHİ	25.04.2024
SÖZLEŞME TARİHİ	16.05.2024
SÖZLEŞME BEDELİ	764.000,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	23.05.2024
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	8.07.2024
YÜKLENİCİ FİRMA	Makbule AYDIN&DURUSU MÜHENDİSLİK
AÇIKLAMALAR	Bitti.

SİNOP BOYABAT ŞEHİT ERSOY GÜRSU ANADOLU LİSESİ ve PANSİYON BİNASI DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ

İHALE TARİHİ	
SÖZLEŞME TARİHİ	17.05.2024
SÖZLEŞME BEDELİ	2.498.888,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	24.06.2024
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	06.09.2024
YÜKLENİCİ FİRMA	Kardeşler Isıtma Soğutma İnş.Müh.San.Tic.Ltd.Şti
AÇIKLAMALAR	Bitti.

SİNOP BOYABAT İMAM HATİP ORTAOKULU YEMEK KONTEYNİRİ ÇATI VE ELEKTRİK TESİSATI ONARIM İŞİ

İHALE TARİHİ	17.04.2024
SÖZLEŞME TARİHİ	8.05.2024
SÖZLEŞME BEDELİ	464.300,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	24.06.2024
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	23.08.2024
YÜKLENİCİ FİRMA	Turgut KAAN
AÇIKLAMALAR	Bitti.

SİNOP BOYABAT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ+PANSİYON BİNASI VE KAPALI SPOR SALONU DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ

İHALE TARİHİ	08.05.2024
SÖZLEŞME TARİHİ	29.05.2024
SÖZLEŞME BEDELİ	1.969.200,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	24.06.2024
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	6.09.2024
YÜKLENİCİ FİRMA	Selçuk ERTEM
AÇIKLAMALAR	Bitti.

SİNOP TÜRKELİ CUMHURİYET ORTAOKULU BAHÇE DUVARI YAPIM İŞİ

İHALE TARİHİ	13.06.2024
SÖZLEŞME TARİHİ	28.06.2024
SÖZLEŞME BEDELİ	489.000,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	8.07.2024
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	6.09.2024
YÜKLENİCİ FİRMA	Fatih Doğukan YILDIZ
AÇIKLAMALAR	Bitti.

SİNOP BOYABAT TÜRK TELEKOM FEN LİSESİ ÇATI ONARIM YAPIM İŞİ

İHALE TARİHİ	
SÖZLEŞME TARİHİ	3.07.2024
SÖZLEŞME BEDELİ	528.250,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	12.07.2024
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	10.09.2024
YÜKLENİCİ FİRMA	Turgut KAAN
AÇIKLAMALAR	Bitti.

SİNOP MERKEZ SARI SALTUK ANADOLU LİSESİ OKUL BİNASI ONARIM YAPIM İŞİ

İHALE TARİHİ	26.06.2024
SÖZLEŞME TARİHİ	9.07.2024
SÖZLEŞME BEDELİ	1.780.000,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	18.07.2024
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	6.09.2024
YÜKLENİCİ FİRMA	ERY AUTO İNŞ. GALERİ EMLAK SAN.TİC.LTD. ŞTİ.
AÇIKLAMALAR	Bitti.

SİNOP DURAĞAN CUMHURİYET İLKOKULU ÇATI VE KALORİFER SİSTEMİ BAKIM ONARIM YAPIM İŞİ

İHALE TARİHİ	05.06.2024
SÖZLEŞME TARİHİ	4.07.2024
SÖZLEŞME BEDELİ	430.000,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	17.07.2024
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	30.08.2024
YÜKLENİCİ FİRMA	ALİ EROL
AÇIKLAMALAR	Bitti.

SİNOP ANADOLU LİSESİ SINIF ZEMİNLERİNİN SİLİNMESİ İŞİ

İHALE TARİHİ	-
SÖZLEŞME TARİHİ	9.07.2024
SÖZLEŞME BEDELİ	79.500,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	19.07.2024
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	19.08.2024
YÜKLENİCİ FİRMA	Isısan -İbrahim Şevki LARLAR
AÇIKLAMALAR	Bitti.

SİNOP MERKEZ CUMHURİYET İLKOKULU DEMİR BAHÇE KORKULUK YAPIM İŞİ

İHALE TARİHİ	-
SÖZLEŞME TARİHİ	25.07.2024
SÖZLEŞME BEDELİ	159.500,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	5.08.2024
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	4.09.2024
YÜKLENİCİ FİRMA	SİNOS İNŞ.YAPI MALZ.TURİZM SAN.İÇ ve DIŞ TİC.LTD.ŞTİ
AÇIKLAMALAR	Bitti.

SİNOP MERKEZ OSMANİYE İLKOKULU ONARIM YAPIM İŞİ

İHALE TARİHİ	17.07.2024
SÖZLEŞME TARİHİ	30.07.2024
SÖZLEŞME BEDELİ	849.000,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	2.08.2024
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	16.09.2024
YÜKLENİCİ FİRMA	Burak Efe Sera Sistemleri İnş.Elektronik San. ve Tic.Ltd. Şti.
AÇIKLAMALAR	Bitti.

SİNOP BOYABAT ŞEHİT ERSOY GÜRSU ANADOLU LİSESİ KAPALI SPOR SALONU ONARIM YAPIM İŞİ

İHALE TARİHİ	13.06.2024
SÖZLEŞME TARİHİ	24.07.2024
SÖZLEŞME BEDELİ	498.500,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	2.08.2024
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	1.10.2024
YÜKLENİCİ FİRMA	Derece Spor San.ve Tic.Ltd.Şti.
AÇIKLAMALAR	Bitti.

SİNOP BOYABAT FATİH SULTAN MEHMET İMAM HATİP ORTAOKULU ELEKTRİK TADİLATI İŞİ

İHALE TARİHİ	10.07.2024
SÖZLEŞME TARİHİ	29.07.2024
SÖZLEŞME BEDELİ	538.457,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	6.08.2024
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	20.09.2024
YÜKLENİCİ FİRMA	Cihan ÇOR
AÇIKLAMALAR	Bitti.

3. KISIM SİNOP MERKEZ ANADOLU LİSESİ DIŞ CEPHE ONARIMI VE BOYA YAPILMASI İŞİ

İHALE TARİHİ	16.07.2024
SÖZLEŞME TARİHİ	6.08.2024
SÖZLEŞME BEDELİ	460.000,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	8.08.2024
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	17.09.2024
YÜKLENİCİ FİRMA	Efe Rıza Taa.turiz.İnş.Tic.Ltd.Şti.
AÇIKLAMALAR	Bitti.

SİNOP TÜRKELİ ATATÜRK İLKOKULU BAKIM ONARIM İŞİ

İHALE TARİHİ	-
SÖZLEŞME TARİHİ	22.07.2024
SÖZLEŞME BEDELİ	193.000,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	5.08.2024
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	4.09.2024
YÜKLENİCİ FİRMA	Ünal AKTAŞ İnşaat Mühendisi İnş.Taah.Plan Proje Dan.V Müh.Hizmetleri
AÇIKLAMALAR	Bitti.

2. KISIM SİNOP MERKEZ MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU DIŞ CEPHE ONARIMI VE BOYA YAPILMASI İŞİ

İHALE TARİHİ	16.07.2024
SÖZLEŞME TARİHİ	6.08.2024
SÖZLEŞME BEDELİ	424.000,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	8.08.2024
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	17.09.2024
YÜKLENİCİ FİRMA	Efe Rıza Taa.tur.z.İnş.Tic.Ltd.Şti.
AÇIKLAMALAR	Bitti.

1 KISIM SİNOP MERKEZ ŞEHİT ŞAKİR ELKOVAN HALK EĞİTİM MERKEZİ DIŞ CEPHE BOYA YAPILMASI İŞİ

İHALE TARİHİ	16.07.2024
SÖZLEŞME TARİHİ	9.08.2024
SÖZLEŞME BEDELİ	240.000,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	19.08.2024
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	27.09.2024
YÜKLENİCİ FİRMA	Fatih Furkan ÇUBUKÇUOĞLU
AÇIKLAMALAR	Bitti.

SİNOP MERKEZ ŞEHİT ÖMER CAN AÇIKGÖZ İMAM HATİP LİSESİ ALTYAPI SİSTEMİ KISMI ONARIM İŞİ

İHALE TARİHİ	-
SÖZLEŞME TARİHİ	19.08.2024
SÖZLEŞME BEDELİ	208.850,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	6.09.2024
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	20.09.2024
YÜKLENİCİ FİRMA	HAYAL BENİAN DAĞLI
AÇIKLAMALAR	Bitti.

SİNOP GERZE MTAL LOJMAN ve OKUL B BLOK ONARIM YAPIM İŞİ

İHALE TARİHİ	20.09.2024
SÖZLEŞME TARİHİ	4.10.2024
SÖZLEŞME BEDELİ	328.457,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	11.10.2024
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	24.11.2024
YÜKLENİCİ FİRMA	Cihan ÇOR
AÇIKLAMALAR	Bitti.

SİNOP İLİ SARAYDÜZÜ İLÇESİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ,(3 AHB)+ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ+112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU+ENTEGRE ACİL HİZMET BİNASI İKMAL YAPIM İŞİ

İHALE TARİHİ	7.05.2024
SÖZLEŞME TARİHİ	23.05.2024
SÖZLEŞME BEDELİ	669.000,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	29.05.2024
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	12.07.2024
YÜKLENİCİ FİRMA	ERY AUTO İNŞ. GALERİ EMLAK SAN.TİC.LTD. ŞTİ.
AÇIKLAMALAR	Bitti.

TÜRKELİ ATATÜRK İLKOKULU KALORİFER KAZANI YENİLENMESİ İŞİ

İHALE TARİHİ	-
SÖZLEŞME TARİHİ	11.10.2024
SÖZLEŞME BEDELİ	165.000,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	22.10.2024
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	11.11.2024
YÜKLENİCİ FİRMA	Demirkaya İnş.ve Malz.Ürt.Pls.Ve Metal Doğr.Taah.Hiz.İşl. Hayv.Tic Ltd.Şti.
AÇIKLAMALAR	Bitti.

SİNOP AYANCIK MTAL ATÖLYE BİNALARI ÇATI ONARIM İŞİ

İHALE TARİHİ	25.10.2024
SÖZLEŞME TARİHİ	12.11.2024
SÖZLEŞME BEDELİ	577.000,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	19.11.2024
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	17.01.2025
YÜKLENİCİ FİRMA	Turgut KAAN
AÇIKLAMALAR	Bitti.

SİNOP BİLİM SANAT MERKEZİ BİNASININ YANGIN ALAM VE PARATONER SİSTEMİNİN ONARIM İŞİ

İHALE TARİHİ	-
SÖZLEŞME TARİHİ	30.10.2024
SÖZLEŞME BEDELİ	179.500,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	5.11.2024
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	5.12.2024
YÜKLENİCİ FİRMA	Uğur KAPUSUZ-KAPUSUZ ELEKTRİK
AÇIKLAMALAR	Bitti.

SİNOP KABALI ORTAOKULU SU DEPOSU DEĞİŞİM İŞİ

İHALE TARİHİ	-
SÖZLEŞME TARİHİ	6.11.2024
SÖZLEŞME BEDELİ	119.000,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	18.11.2024
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	8.12.2024
YÜKLENİCİ FİRMA	Demirkaya İnş.ve Malz.Ürt.Pls.Ve Metal Doğr.Taah.Hiz.İşl. Hayv.Tic Ltd.Şti.
AÇIKLAMALAR	Bitti.

SİNOP MERKEZ MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU FUTBOL SAHASI BAKIM ONARIM İŞİ

İHALE TARİHİ	25.10.2024
SÖZLEŞME TARİHİ	11.11.2024
SÖZLEŞME BEDELİ	748.057,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	19.11.2024
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	3.01.2025
YÜKLENİCİ FİRMA	Recai ÇİLİNGİR
AÇIKLAMALAR	Bitti.

SİNOP MERKEZ İÇE 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İLKOKULU DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI İŞİ

İHALE TARİHİ	-
SÖZLEŞME TARİHİ	25.11.2024
SÖZLEŞME BEDELİ	21.300,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	28.11.2024
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	18.12.2024
YÜKLENİCİ FİRMA	Hamit Cem ACAR
AÇIKLAMALAR	Bitti.

SİNOP FATİH İLKOKULU SİRKÜLASYON POMPASI DEĞİŞİM İŞİ

İHALE TARİHİ	-
SÖZLEŞME TARİHİ	29.11.2024
SÖZLEŞME BEDELİ	59.400,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	4.12.2024
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	24.12.2024
YÜKLENİCİ FİRMA	Ayşe BOZKURT
AÇIKLAMALAR	Bitti.

SİNOP BOYABAT ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA İLKOKULU DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ

İHALE TARİHİ	26.04.2024
SÖZLEŞME TARİHİ	17.05.2024
SÖZLEŞME BEDELİ	713.800,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	24.06.2024
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	23.08.2024
YÜKLENİCİ FİRMA	AB MEKANİK TEKNOLOJİLERİ TESİSAT SİSTEMLERİ SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ.
AÇIKLAMALAR	Bitti.

SİNOP MERKEZ 15 EYLÜL ANAOKULU ÇATI EKLENTİLERİNİN ONARIM İŞİ

İHALE TARİHİ	-
SÖZLEŞME TARİHİ	26.07.2024
SÖZLEŞME BEDELİ	49.500,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	12.08.2024
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	11.09.2024
YÜKLENİCİ FİRMA	Isısan -İbrahim Şevki LARLAR
AÇIKLAMALAR	Fesih Edildi.

SİNOP MERKEZ LALA İLKOKULU KAZAN DAİRESİ BÖLME DUVAR İŞİ

İHALE TARİHİ	-
SÖZLEŞME TARİHİ	9.07.2024
SÖZLEŞME BEDELİ	28.500,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	19.07.2024
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	19.08.2024
YÜKLENİCİ FİRMA	Isısan -İbrahim Şevki LARLAR
AÇIKLAMALAR	Devam Ediyor.

SİNOP GERZE ATATÜRK ORTAOKULU BAKIM ONARIM İŞİ

İHALE TARİHİ	-
SÖZLEŞME TARİHİ	9.07.2024
SÖZLEŞME BEDELİ	59.500,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	19.07.2024
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	19.08.2024
YÜKLENİCİ FİRMA	Isısan -İbrahim Şevki LARLAR
AÇIKLAMALAR	Devam Ediyor.

SİNOP MERKEZ SEYİT BİLAL İMAM HATİP ORTAOKULU ONARIM İŞİ

İHALE TARİHİ	-
SÖZLEŞME TARİHİ	26.07.2024
SÖZLEŞME BEDELİ	96.000,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	7.08.2024
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	6.09.2024
YÜKLENİCİ FİRMA	Isısan -İbrahim Şevki LARLAR
AÇIKLAMALAR	Devam Ediyor.

SİNOP BOYABAT ESKİ VERGİ DAİRESİNİN ENGELSİZ GÜNDÜZLÜ BAKİMEVİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İŞİ

İHALE TARİHİ	22.08.2024
SÖZLEŞME TARİHİ	6.09.2024
SÖZLEŞME BEDELİ	5.449.000,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	16.09.2024
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	13.02.2025
YÜKLENİCİ FİRMA	Burak Efe Sera Sistemleri İnş.Elektronik San. ve Tic.Ltd. Şti.
AÇIKLAMALAR	Devam Ediyor.

SİNOP BOYABAT MEHMET ALBAYRAK HAFIZ İMAM HATİP ORTAOKULU PANSİYON BİNASI YANGIN MERDİVENİ YAPIM İŞİ

İHALE TARİHİ	
SÖZLEŞME TARİHİ	12.09.2024
SÖZLEŞME BEDELİ	1.881.000,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	18.09.2024
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	2.12.2024
YÜKLENİCİ FİRMA	Kalyoncuoğlu Metal San.ve Tic.Ltd. Şti
AÇIKLAMALAR	Devam Ediyor.

SİNOP BOYABAT CENGİZ TOPEL İLKOKULU ve ORTAOKULU (A-B Blok) ISLAK ZEMİNLER ONARIM VE YAPIM İŞİ

İHALE TARİHİ	20.08.2024
SÖZLEŞME TARİHİ	9.09.2024
SÖZLEŞME BEDELİ	1.149.000,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	16.09.2024
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	31.11.2024
YÜKLENİCİ FİRMA	Ferhat EMİNOĞLU
AÇIKLAMALAR	Devam Ediyor.

SİNOP FEN LİSESİ BİNALARINDA MUHTELİF ONARIM İŞİ

İHALE TARİHİ	-
SÖZLEŞME TARİHİ	27.09.2024
SÖZLEŞME BEDELİ	144.900,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	7.10.2024
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	26.10.2024
YÜKLENİCİ FİRMA	Isısan -İbrahim Şevki LARLAR
AÇIKLAMALAR	Devam Ediyor.

SİNOP AYANCIK ZÜBEYDE HANIM ANAOKULU ÇATI ONARIM İŞİ

İHALE TARİHİ	03.10.2024
SÖZLEŞME TARİHİ	22.10.2024
SÖZLEŞME BEDELİ	438.000,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	31.10.2024
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	29.11.2024
YÜKLENİCİ FİRMA	Kalyoncuoğlu Metal San.ve Tic.Ltd. Şti
AÇIKLAMALAR	Devam Ediyor.

SİNOP AİLE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI ONARIM İŞİ

İHALE TARİHİ	29.11.2024
SÖZLEŞME TARİHİ	19.12.2024
SÖZLEŞME BEDELİ	720.057,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	30.12.2024
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	28.02.2025
YÜKLENİCİ FİRMA	Recai ÇİLİNGİR

İL ÖZEL İDARESİ ve DIŞ KURUMLARA AİT DİĞER PROJE HİZMET ALIM İŞLERİ**SİNOP TÜRKELİ İMAM HATİP ORTAOKULU ESKİ BİNASININ DEPREM TAHKİKİNİN YAPILMASI HİZMET ALIM İŞİ**

İHALE TARİHİ	03.01.2024
SÖZLEŞME TARİHİ	25.01.2024
SÖZLEŞME BEDELİ	239.500,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	30.01.2024
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	29.05.2024
AÇIKLAMALAR	Bitti.

SİNOP BOYABAT DUMLUPINAR İLKOKULU VE CENGİZ TOPEL İLKOKULU DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI İŞİ

İHALE TARİHİ	-
SÖZLEŞME TARİHİ	31.05.2024
SÖZLEŞME BEDELİ	29.500,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	10.06.2024
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	30.06.2024
AÇIKLAMALAR	Bitti.

SİNOP BOYABAT İBNİ-SİNA MTAL DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI HİZMETİ ALIM İŞİ

İHALE TARİHİ	-
SÖZLEŞME TARİHİ	31.05.2024
SÖZLEŞME BEDELİ	24.500,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	10.06.2024
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	30.06.2024
AÇIKLAMALAR	Bitti.

SİNOP BOYABAT 905 ADA,3 PARSEL, KIZILAY ANAOKULU, ZEMİN ETÜT ÇALIŞMALARI VE İSTİNAT DUVARI PROJELERİNİN HAZIRLANMASI İHTİYAÇLARINDA KULLANILMAK ÜZERE HİZMET ALIM İŞİ

İHALE TARİHİ	-
SÖZLEŞME TARİHİ	21.03.2024
SÖZLEŞME BEDELİ	110.000,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	28.03.2024
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	13.05.2024
AÇIKLAMALAR	Bitti.

SİNOP BOYABAT 24 DERSLİKLİ OKUL BİNASININ PROJE ve ZEMİN ETÜT RAPORU HİZMET ALIM İŞİ

İHALE TARİHİ	3.10.2023
SÖZLEŞME TARİHİ	24.10.2023
SÖZLEŞME BEDELİ	619.300,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	2.11.2023
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	24.04.2024
AÇIKLAMALAR	Bitti.

SİNOP BOYABAT MEHMEK AKİF ERSOY LİSESİ ve BOYABAT MEVLANA MTAL BİNALARININ DEPREM TAHKİKİ GÜÇLENDİRME PROJE ve ZEMİN ETÜT RAPORU HAZIRLANMASI HİZMET ALIM İŞİ

İHALE TARİHİ	24.04.2024
SÖZLEŞME TARİHİ	16.05.2024
SÖZLEŞME BEDELİ	1.073.000,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	24.05.2024
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	21.10.2024
AÇIKLAMALAR	Bitti.

6. KISIM SARAYDÜZÜ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VE HALK EĞİTİM MERKEZİ BİNASI GÜÇLENDİRME REVİZE PROJE VE ZEMİN ETÜT RAPORU HAZIRLANMASI HİZMETİ ALIM İŞİ

İHALE TARİHİ	06.06.2024
SÖZLEŞME TARİHİ	27.06.2024
SÖZLEŞME BEDELİ	249.600,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	5.07.2024
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	2.11.2024
AÇIKLAMALAR	Devam Ediyor.

5. KISIM SARAYDÜZÜ TÜRKAYLAR ORTAOKULU PANSİYON VE LOJMAN BİNASI GÜÇLENDİRME REVİZE PROJE VE ZEMİN ETÜT RAPORU HAZIRLANMASI HİZMET ALIM İŞİ

İHALE TARİHİ	04.06.2024
SÖZLEŞME TARİHİ	3.07.2024
SÖZLEŞME BEDELİ	597.000,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	12.07.2024
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	8.11.2024
AÇIKLAMALAR	Devam Ediyor.

4. KISIM DURAĞAN 75.YIL YBO LOJMAN BİNASI GÜÇLENDİRME REVİZE PROJE VE ZEMİN ETÜT RAPORU HAZIRLANMASI HİZMETİ ALIM İŞİ

İHALE TARİHİ	06.06.2024
SÖZLEŞME TARİHİ	27.06.2024
SÖZLEŞME BEDELİ	185.328,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	5.07.2024
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	2.11.2024

3. KISIM DURAĞAN ANADOLU LİSESİ BİNASI GÜÇLENDİRME REVİZE PROJE VE ZEMİN ETÜT RAPORU HAZIRLANMASI HİZMETİ ALIM İŞİ

İHALE TARİHİ	04.06.2024
SÖZLEŞME TARİHİ	2.07.2024
SÖZLEŞME BEDELİ	191.000,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	11.07.2024
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	8.11.2024
AÇIKLAMALAR	Devam Ediyor.

2. KISIM DURAĞAN 125. YIL ZÜBEYDE HANIM ANAOKULU BİNASI GÜÇLENDİRME REVİZE PROJE VE ZEMİN ETÜT RAPORU HAZIRLANMASI HİZMETİ ALIM İŞİ

İHALE TARİHİ	04.06.2024
SÖZLEŞME TARİHİ	2.07.2024
SÖZLEŞME BEDELİ	132.000,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	11.07.2024
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	8.11.2024
AÇIKLAMALAR	Devam Ediyor.

1. KISIM DURAĞAN ÖĞRETMENEVİ VE ASO BİNASI GÜÇLENDİRME REVİZE PROJE VE ZEMİN ETÜT RAPORU HAZIRLANMASI HİZMETİ ALIM İŞİ

İHALE TARİHİ	04.06.2024
SÖZLEŞME TARİHİ	2.07.2024
SÖZLEŞME BEDELİ	196.000,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	11.07.2024
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	8.11.2024
AÇIKLAMALAR	Devam Ediyor.

SİNOP MERKEZ BORSA İSTANBUL ŞEHİT ERTAN YILMAZTÜRK GÜZEL SANATLAR LİSESİ BİNASI İSTİNAT DUVARLARI, FORE KAZIK PROJE HİZMET ALIM VE ZEMİN ETÜDÜ HAZIRLAMA İŞİ

İHALE TARİHİ	-
SÖZLEŞME TARİHİ	19.08.2024
SÖZLEŞME BEDELİ	175.000,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	28.08.2024
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	27.10.2024
AÇIKLAMALAR	Bitti

SİNOP MERKEZ MEYDANKAPI MAHALLESİ 7 PAFTA 120 ADA 8 PARSELDE YER ALAN TESCİLLİ TARİHİ JANDARMA BİNASININ REVİZE RESTORASYON TEŞHİR TANZİM MAKİNE VE ELEKTRİK PROJELERİ HAZIRLANMASI İŞİ

İHALE TARİHİ	29.11.2024
SÖZLEŞME TARİHİ	11.12.2024
SÖZLEŞME BEDELİ	757.000,00 TL
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	16.12.2024
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	15.04.2025
AÇIKLAMALAR	Devam Ediyor.

1:FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ:

Hizmet Alımları faslına 2024 yılı için 6.448.807,08 TL ödenek bütçelenmiştir. Bu ödenek ile Topografik ölçümlerde kullanılan ölçüm cihazlarının abonelik ücretleri için 9.000,00 TL, Merkez ilçesi köylerinin evsel katı atıklarının toplanması hizmeti için Sinop Sahil Belediyeleri Birlik Başkanlığı ile imzalanan protokol gereğince 624.051,36 TL, Merkez İlçe KHGB ile imzalanan protokol gereğince 365.413,68 TL, Boyabat İlçesi KHGB ile imzalanan protokol gereğince 190.373,81 TL, Durağan İlçesi KHGB ile imzalanan protokol gereğince 750.000,00 TL, Erfelek İlçesi KHGB ile imzalanan protokol gereğince 488.861,15 TL, Saraydüzü İlçesi KHGB ile imzalanan protokol gereğince 779.514,17 TL, Türkeli İlçesi KHGB ile imzalanan protokol gereğince 779.514,17 TL, Türkeli Belediyesi ile imzalanan protokol gereğince 350.000,00 TL Boyabat Belediye Başkanlığı ile imzalanan protokol gereğince 634.579,38 TL olmak üzere toplam 4.887.480,57 TL harcama yapılmıştır.

Stratejik Planda 2024 yılı için öngörülen		2024 yılında uygulanan
İÇMESUYU		
İçme suyu yetersiz ve çeşmeli sistemde bulunan 10 adet yerleşim biriminin şebekeli olarak sağlıklı ve sıhhi içme suyu tesisine kavuşturmak		3 ünite sağlıklı ve sıhhi içme suyu tesisine kavuşturulmuştur.
20 üniteye malzeme yardımı yapılması.		Müdürlüğümüz bütçesine yeterli ödenek ayrılmadığından yapılamamıştır.
15 ad. İçmesuyu tesisinin motopomplarının yenilenmesi		Müdürlüğümüz bütçesine yeterli ödenek ayrılmadığından yapılamamıştır.
SULAMA		
3 adet yer altı ve yerüstü sulama suyu tesisi yapılması		Müdürlüğümüz bütçesine yeterli ödenek ayrılmadığından yapılamamıştır.
2 adet mevcut tesisimizin bakım onarımlarının yapılması		Müdürlüğümüz bütçesine yeterli ödenek ayrılmadığından yapılamamıştır.
KANALİZASYON		
5 Köy 5 Üniteye kanalizasyon şebeke inşaatı yapılması.		5 üniteye kanalizasyon şebekesi yapılmıştır

SULAMA SUYU ÇALIŞMALARINDAN RESİMLER



SULAMA SUYU ÇALIŞMALARINDAN RESİMLER



YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1:FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ:

2024 yılında yeni yol 3,95 km, onarım 13,70 km, stabilize kaplama 11,20 km, 1. kat asfalt 26,70 km,2.kat asfalt kaplama 24,20 km. malzemeli bakım 479,50 km, greyderli bakım 3.277,85 km. uygulama çalışmaları yapılmıştır. mevcut asfalt yolların bakım, onarım çalışmalarında kullanılmak üzere Merkez Kabalı ve Boyabat asfalt plantinde müdürlüğümüz elemanlarınca 3.750 m³ plantmiks yama malzemesi, 4.408 m³ BSK sıcak asfalt olmak üzere toplam 8.158 m³ malzeme üretilerek 608,00 km. yolun bakım, onarım yama çalışmaları ve 3,10 km. yolun sıcak asfaltı yapılmıştır.

Yağışlar nedeniyle 162 köy yolunda 33.250 m³ heyelan temizliği çalışmaları yapılmıştır. dolgu çalışmalarında yol, köprü, menfez, istinat duvarı olmak üzere 104 köy yolunda 31.150 m³ stabilize dolgu, reglaj ve silindirajları yapılarak ulaşım hazır hale getirilmiştir.Konkasör tesislerinde 149.920 m³ temel ve alt temel (balast-elekaltı-mıcır) malzeme üretimi gerçekleştirilmiştir. Merkez ve İlçe köy yollarında farklı zamanlarda yağın kar nedeniyle 228 köy yolunda karla mücadele çalışması yapılmıştır.

2024 YILINDA YAPILAN ÇALIŞMALARA İLŞKİN TABLO

Stratejik planda 2024 yılı için öngörülen	2024 yılında uygulanan
Tesviye 4 km.	3,95 km.
Stabilize kaplama 20 km.	11,20 km.
Malzemeli bakım 500 km.	479,50 km.
1. Kat Asfalt kaplama 50 km.	26,70 km.
2. Kat Asfalt kaplama 100 km.	24,20 km
Asfalt yama malzemesi üretimi 6000 m ³	3.750 m ³
Onarım 20 km.	13,70 km.
Greyderli bakım 3000 km.	3.277,85 km.
Büz borusu 800 mt.	84 mt
Menfez 20 Ad.	-

* 2024 yılında 608 km. asfalt tamiri yapılmıştır.

*2024 yılında 104 köy yolunda yol, menfez, köprü, istinat duvarı dolgusu yapılmıştır.

*2024 yılında 162 köy yolunda heyelan temizliği çalışması yapılmıştır.

*2024 yılında Merkez ve İlçe köy yollarında 228 köy yolunda karla mücadele çalışması yapılmıştır.

*2024 yılında 149.920 m³ temel ve alt temel (balast-elekaltı-mıcır)malzeme üretimi gerçekleştirilmiştir.

*2024 yılında 3,10 km. BSK (sıcak asfalt) yapılmıştır

2024 YILI YOL ÇALIŞMALARIMIZ



2024 YILI YOL ÇALIŞMALARIMIZ



2024 YILI YOL ÇALIŞMALARIMIZ



2024 YILI YOL ÇALIŞMALARIMIZ



2024 YILI YOL ÇALIŞMALARIMIZ



2024 YILI YOL ÇALIŞMALARIMIZ



2024 YILI YOL ÇALIŞMALARIMIZ



FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ:

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü olarak 2024 yılında İdaremiz sorumluluk alanında bulunan yerlerde başvuru sahiplerine işletme ruhsatları verilmiş ve yıl içinde gerekli denetimlerin yapılması sağlanmıştır. Genel olarak tablo içinde yapılan hizmetlerin dökümü yapılmıştır.

S. NO	YAPILAN İŞİN KONUSU	ADET
1	Verilen I (A) Grubu maden işletme ruhsat sayısı	2
2	I (A) Grubu maden işletme ruhsat sahalarında yapılan denetim	1
3	Yapılan kaçak malzeme (KUM-ÇAKIL) alımı üzerine 3213 sayılı maden kanununun 12. Maddesine göre verilen idari para cezası	2
4	Kamu kurumlarına verilen hammadde üretim sayısı	3
5	Verilen sıhhi işyeri ruhsat sayısı (bakkal-büfe vb.)	3
6	Verilen umuma açık işyeri ruhsat sayısı (kahvehane, çaybahçesi vb. işyerleri)	4
7	verilen gayrisihhi müessese işyeri ruhsat sayısı (üretim yapılan işyerleri)	18
8	Verilen jeotermal kaynak arama ruhsat sayısı	
9	İşyeri açma ve çalışma yönetmeliğine göre işyerlerinde yapılan kontrol sayısı	8
10	İşyeri açma ve çalışma yönetmeliğine göre işyerlerinde yapılan denetim sayısı	2
11	2559 sayılı polis vazife ve selahiyet kanunu hükümlerine göre verilen idari para cezası sayısı	3
12	Gayrimenkul envanterimize alınan tapu sayısı	0
13	İl özel idaresi tarafından çeşitli kurumlara tahsis edilen gayrimenkul sayısı	9
14	Çeşitli kurumlardan il özel idaresine tahsis edilen gayrimenkul sayısı	6
15	Kiralanan işyerlerinin devir sayısı	
16	Kiralanan işyeri ve arsa sayısı	2

FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ:

Destek Hizmetleri Müdürlüğünce İdareimiz ait 4734 ve 4735 Sayılı Kanun çerçevesinde İl Özel İdaresinin hizmetinin gerektirdiği ihtiyaç olan mal ve malzeme vb. satın alma işlemleri yapılmış, (Yedek Parça Ambarı Hariç) Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait bulunan taşınmazların yapım, bakım ve onarımları ile ilgili is ve işlemler, İhale Birimi tarafından ödeneği dış kurumlardan aktarılan işleri 4734 sayılı K.İ.K.' na göre ihale yaparak yerine getirilmiştir.

2024 YILI DOĞRUDAN TEMİN

YIL		TOPLAM
2024		65

2024 GERÇEKLEŞTİRİLEN İHALE SAYISI

YIL	YAPIM İŞİ	HİZMET ALIM	MAL ALIM İŞİ	TOPLAM
2024	39	8	8	55

2024 YILINDA YAPILAN İHALELERİN KURUM VE BİRİMLERİNE GÖRE DAĞILIMI

YIL	TOPLAM
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	28
İL JANDARMA KOMUTANLIĞI	1
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	1
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (HÜKÜMET KONAKLARI)	1
SİNOP İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ	2
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	1
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	1
İL ÖZEL İDARESİ BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ	18

FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ:

İdaremi posta ve kargo giderlerinde kullanılmak üzere 2024 Mali yılı bütçesi ile verilen 120.000,00-TL ödeneğin tamamı kullanılmıştır. Sinop'un doğal ve tarihi güzelliklerinin yer aldığı 5 çeşit kişisel posta pulu bastırılmıştır.

İl Özel İdaresi'nin karar organı olan ve İl Özel İdaresi Kanunu'nda gösterilen esas ve usullere göre seçilen 22 üyeden oluşan Sinop İl Genel Meclisinin

İL GENEL MECLİS ÜYELERİNİN İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI

	ADI VE SOYADI	GÖREVİ	İLÇESİ
1	ERSİN YAMAN	İl genel meclisi başkanı	Merkez
2	DEMİRHAN DEMİRKOL	İl genel meclisi üyesi	Merkez
3	ÖMER ÖZMUTLU	İl genel meclisi üyesi	Merkez
4	MUSTAFA ERDAL UZUN	İl genel meclisi üyesi	Merkez
5	ERKAN ÖRNEK	İl genel meclisi üyesi	Ayancık
6	ERGÜN AKYÜZ	İl genel meclisi üyesi	Ayancık
7	ENES ÇAKIR	İl genel meclisi üyesi	Boyabat
8	İSA BAĞCI	İl genel meclisi üyesi	Boyabat
9	ARIF KARA	İl genel meclisi üyesi	Boyabat
10	ECEVİT DİNÇ	İl genel meclisi üyesi	Dikmen
11	HÜSEYİN TÜRKMEN	İl genel meclisi üyesi	Dikmen
12	AHMET TURGUT	İl genel meclisi üyesi	Durağan
13	MEHMET KARAKURT	İl genel meclisi üyesi	Durağan
14	ADEM AKGÖZ	İl genel meclisi üyesi	Erfelek
15	ZİYA DİLSİZ	İl genel meclisi üyesi	Erfelek
16	CUMHUR KURT	İl genel meclisi üyesi	Gerze
17	MUSTAFA BAŞ	İl genel meclisi üyesi	Gerze
18	SEBAHATTİN BELOVACIKLI	İl genel meclisi üyesi	Gerze
19	CÜNEYT UĞUR ŞİMŞEK	İl genel meclisi üyesi	Saraydüzü
20	ŞÜKRÜ CEBECİ	İl genel meclisi üyesi	Saraydüzü
21	ASIM CAN	İl genel meclisi üyesi	Türkeli
22	NİHAT DEMİRCAN	İl genel meclisi üyesi	Türkeli

2024 YILINDA İL GENEL MECLİSİNDE ALINAN KARARLARA İLİŞKİN KONULAR

2024 yılında gerek gündem maddesi olarak teklif edilen yazılar ve gerekse il genel meclis üyeleri tarafından verilen önergeler ile gündeme alınan imar, tarım, sağlık, turizm, eğitim, mali ve diğer konularda toplam **588** adet il genel meclis kararı alınmıştır. Konu başlıkları özetle şunlardır;

- İl Encümen üyeleri seçimi
- Denetim Komisyonu seçimi
- İhtisas komisyonu üyelerinin seçimi.
- 2023 yılı faaliyet raporu/ kesin hesap cetvelleri.
- 2025 Mali yılı performans programı/ yatırım ve çalışma program teklifleri.
- 2025 Mali yılı bütçesi.
- Makine ve ekipman kiralama esasları, vidanjör kullanım ücreti, köylerdeki içme suyu tarifesinin belirlenmesi.(2024 yılı için)
- İlimiz ve ilçelerimiz SYDV mütevelli heyetlerine üye seçilmesi.
- Membra tahsisleri.
- Nazım ve uygulama imar planı talepleri ve değişiklikleri.
- Köy yolları envanter cetvelleri ile köy ve grup yollarının bakım ve onarımı, genişletilmesi, yeni yol açılması, yol ağına alınması, yatırım programına alınması, yol ağı değişikliği.
- K.H.G Birliklerine, kurumlara ve birimlere ödenek aktarımları.
- Tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması ve kadro değişiklikleri.
- Tahsis ve kiralama işlemleri (işyeri,taşınmaz ve bina)

İL ENCÜMENİ

İl Özel İdaresinin icra organı olan ve İl Özel İdaresi Kanunu'nun 25.maddesi gereğince, Vali başkanlığında, Genel Sekreter ve İl Genel Meclisi'nin her yıl kendi üyeleri arasından, bir yıl için, gizli oyla seçeceği 3 üye ile Valilik Makamınca her yıl birim amirleri arasından seçilen 2 üyeden oluşan il encümeninin;

Toplantılarına ait gündemin hazırlanması, alınan kararların yazılması, karar defterine işlenmesi, ilgili birimlere ulaştırılması, İl Encümeni'nin aynı zamanda 2886 sayılı Kanuna göre ihale komisyonu olmasından dolayı, bu komisyonun sekretarya hizmetleri birimizce yürütülmektedir. Hizmet binasındaki encümen toplantı salonunda, her Çarşamba günü saat 14.00' de Vali başkanlığında, bulunmadıkları takdirde ise Genel Sekreter Başkanlığında İl Encümen toplantısı yapılmaktadır.

2024 YILINDA İL ENCÜMENİ TARAFINDAN ALINAN KARARLARA İLİŞKİN KONU BAŞLIKLARI

2024 yılında gerek gündem maddesi olarak teklif edilen yazılar ve gerekse il encümen üyeleri tarafından gündeme getirilen, aşağıda belirtilen konularda toplam **1004** adet il encümen kararı alınmıştır.

TEKLİFİ VEREN BİRİM	TEKLİF SAYISI	KONULAR
İmar ve Kentsel İyileştirme Md.	909	(İfraz, Tevhit, İrtifak Hakkı, Yola Terk, Parselasyon, İdari Para Cezası, Yıkım)
Mali Hizmetler Md.	48	(Ödenek Aktarımı, Tahsis Amacı Değişikliği, 2023 Mali Yılı Kesin Hesabı, Boyabat OSGB müteşebbis heyetine üye belirlenmesi)
Ruhsat ve Den. Md.	28	(Kamulaştırma,Tahsis, Kiralama, Kira Artışları, Kira ve Satış İhaleleri,Ruhsatsız İşyerlerinin Mühürlenmesi)
Plan Prj. Yat. ve İnş. Md.	15	(Köy Yardımları,Nakdi Yardım Talepleri,)
İl Encümeni Üyeleri	1	(Ödenek Aktarılması)
Makina İk. Bak. ve On. Md.	1	(Araçların Bakım, Onarım ve Akaryakıt Giderleri)
Su ve Kanal Hiz. Md.	1	(Nakdi Yardım Talebi)
İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.	1	(TÜHİS Üyelik Aidatı)
TOPLAM	1004	



FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ:

Makine parkımızda yer alan araçların her türlü bakım ve onarımını gerek atölye bünyesinde gerekse arazide yapmak, Makine parkımızda yer alan araçların aktif halde çalışabilmesi için gerekli olan malzeme, yedek parça, lastik vb ihtiyaçlarının doğrudan temin ya da istisnai alımına ait iş ve işlemlerini yürütmek. Makine parkımızdaki araçların akaryakıt ve madeni yağ ihtiyacını karşılamak,

MAKİNE İŞLETME HİZMETLERİ BÜROSU

Makine ve araçların randımanlı bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol etmek, ekonomik ömürlerini tamamlamış ya da tamir bakım maliyeti yüksek olan araçların servis dışı bırakılmasına ait iş ve işlemleri yürütmek, Makine parkımızda yer alan araçların, fenni muayene, zorunlu trafik sigortalarını ve periyodik bakımlarını yapmak, Makine parkımızda yer alan iş makinelerimizin tırlar vasıtasıyla naklini yapmak 1997 yılından önceki araçların hurda yasası ve uygulama hükümleri doğrultusunda toplanmasına ait iş ve işlemlerini yürütmek,

MAKİNA PARKIMIZDAN RESİMLER



2024 YILI MAKİNE PARKI DURUMU

MAKİNE PARKI	TOPLAM	MERKEZ	AYANCIK	BOYABAT	DİKMEN	DURAĞAN	ERFELEK	GERZE	SARAYDÜZÜ	TÜRKELİ
Kamyon	34	10	2	7	2	2	3	3	1	3
Greyder	22	3	4	4	2	2	2	2	1	2
Dozer	4	1		1		1				
Yükleyici (Loder)	13	2	1	3	1	1	2	1	1	1
Ekskavatör (Kazıcı)	9	3	1	1	1		1		1	1
Kazıcı Yükleyici (Bekoloder)	10	1	2	1	1	2		1	1	1
Silindir	10	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Yama Silindiri	2	1		1						
Distribütör	5	4								
Satın Kaplama Aracı	2	2								
Çekici(Tır)	4	4								
Binek ve arazi aracı	34	32		1						1
Minibüs/Midibüs	4	3					1			
Çöp Kamyonu	6	2	1	1			1			1
Motorlu yrd. iş mak.	14	10	1				1	1		2
Sabit Konkasör	3	1				1	1			
Mobil Konkasör	1	1								
Seyyar taş kırma ün.	1						1			
Asfalt serici (Finişer)	1	1								
Yardımcı İş Makinesi	35	36				1				
T O P L A M	214	119	113	21	8	11	14	9	6	13



KHGB MAKİNE PARK DURUMU

(Protokolle Bakım, Onarım, Akaryakıt, Sigorta vb İhtiyaçları Müdürlüğümüzce Karşılanan)

MAKİNE PARKI	TOPLAM	MERKEZ	AYANCIK	BOYABAT	DİKMEN	DURAĞAN	ERFELİK	GERZE	SARAYDÜZÜ	TÜRKELİ
Kamyon	8	1	1	1	1	2		1	1	
Kazıcı Yük.(Bekoloder)	6	2		1	1		1	1		
Ekskavatör	4					2		1		
Çöp Kamyonu	5					1			1	3
Kamyonet/Pikap/Jeep	9	2	1	1	1	1	1	1	1	1

Minibüs	1	1								
Yama Silindiri	2	1				1				
Mobil Konkasör	2		1							1
TOPLAM	35	7	3	2	3	6	2	4	3	5

ATÖLYE HİZMETLERİ

YIL	Atölyede Tamir Yapılan	Arazide Tamir Yapılan	TOPLAM
2020	1077	821	1.898
2021	876	965	1.841
2022	1005	1167	2172
2023	882	1063	1945
2024	968	923	1891



NAKİL HİZMETLERİ

İlimiz Merkez ve ilçelerinde bulunan iş makinelerimizin nakil işlemi yapılmaktadır.

2021 Yılı Nakil Sayısı : 781

2022 Yılı Nakil Sayısı : 731

2023 Yılı Nakil Sayısı :500

2024 Yılı Nakil Sayısı :428



MAKİNA PARKININ YILLARA GÖRE DAĞILIMI

YILLARA GÖRE MAKİNE PARKI

	0-5 YAŞ 2024-2019	5-10 YAŞ 2018-2014	10-20 YAŞ 2013-2004	20-30 YAŞ 2003-1994	30 YAŞ ÜSTÜ 1993 ve Öncesi	TOPLAM
KAMYON	4	2	21	7		34
GREYDER	1	8		8	5	22
DOZER				3		3

BEKOLODER	5		5			10
EKSKAVATÖR	2	2	5			9
LODER	2	2	3	5		12
SİLİNDİR		2	4	2	2	10
YAMA SİLİNDİRİ			1	1		2
DİSTRİBÜTÖR	1	1	1	1		4
ÇEKİCİ		2	1	1		4
BİNEK VE ARAZİ	5	10	5	13	1	34
TOPLAM :	20	26	46	41	8	144



2024 YILI ARAÇ ALIMLARI

- 2024 yılında DMO aracılığıyla 3.672.240,00-TL bedelle IVECO Daily kapalı kasa seyyar kaynak aracı satın alınmıştır.
- 2024 yılında DMO aracılığıyla İdareimiz makine parkına ait,
- Hidromek Ekskavatörler için 1 adet MTB 215 IQ Hidrolik kırıcı
- Hidromek Bekoloderler için 1 adet MTB 30 Hidrolik kırıcı **1.013.040-TL** bedelle alınmıştır.



MOTORİN TÜKETİMİ

(LT) (31.12.2024 İtibariyle)

	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	TOPLAM
2018	93.470	89.789	115.322	147.228	163.117	184.741	226.584	188.628	173.915	146.459	100.071	74.709	1.704.033
2019	89.759	112.705	138.447	88.201	131.094	135.526	196.003	195.780	248.038	198.481	134.765	102.427	1.771.226
2020	84.672	81.935	95.967	107.851	130.269	207.649	237.286	231.415	220.746	183.702	146.530	125.002	1.853.024
2021	97.026	142.585	124.831	151.363	174.036	249.502	256.906	212.529	164.032	237.124	237.536	187.314	2.234.784
2022	197.493	99.407	157.293	201.093	229.792	282.161	257.106	340.339	315.089	259.975	233.782,99	152.069,49	2.725.600,48
2023	148.895,86	158.219,80	123.299,87	143.348,43	187.255,99	211.505,85	203.747,28	210.479,04	170.535,07	170.092,36	125.664,11	115.091,52	1.968.135,18
2024	84.685,86	100.036,52	123.834,21	104.876,14	137.670,57	92.490,69	136.204,51	148.257,99	136.654,13	124.891,89	111.201,30	95.177,77	1.395.981,58

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ YAKIT TÜKETİMİ	2019 YILI	2020 YILI	2021 YILI	2022 YILI	2023 YILI	2024 YILI
.H.G.B. ARAÇLARI	226.967	210.886	204.567	264.727,46	244.296,23	215.565,26
K.H.G.B. KİRALIK ARAÇLAR	166.199	209.531	443.066	1.007.809,32	494.276,44	59.558,70
T O P L A M	393.166	420.417	647.633	1.272.536,78	738.572,67	275.123,96

FAALİYET DETAYLARI

Valilik Hizmetlerinde kullanılmak üzere 752.400,00-TL bedelle 2 adet Araç kiralama hizmet alım ihalesi yapılmıştır. İdaremiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 3.630.600,00-TL bedelle 7 adet arazi şartlarına uygun Araç Kiralama hizmet alım ihalesi yapılmıştır. İdaremiz Makine Parkına Ait Taşıt ve İş İdaremiz makine parkına ait araçların 2024 yılı karayolları zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerinin yenilenmesi hizmet alımı 2.837.000,00-TL bedelle ihale yapılmıştır. Sinop İl Özel İdaresi personel taşıma servis hizmetlerinde kullanılmak üzere otobüs kiralama hizmet alımı 847.500,00-TL bedelle ihale yapılmıştır.İdaremiz makine parkındaki araçların HGS geçiş bedelleri, fenni ve egzoz muayene işlemleri düzenli olarak yapılmıştır.İdaremiz Makine parkındaki araç ve iş makinelerinin(Konkasör, asfalt plenti vb dahil) her türlü bakım, onarım, yedek parça ve servis işlemleri yapılmıştır

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ: İl Özel İdaresi'nin ve bağlı birimlerinin hukuk danışmanlığı ve İdareyle ilgili tüm davaların takip işlemlerini yürütmekle sorumludur.

2024 YILI FAALİYETLERİMİZ

YAPILAN İŞİN KONUSU	2024 YILI
İdareye Karşı Açılan Davalar	35
İl Özel İdaresi Tarafından Açılan Davalar	5
Adli Derdest	51
İdari Derdest	73
İcra Derdest	65
Adli Karara Çıkan Davalar	7
İdari Karara Çıkan Davalar	5
İcra Biten Davalar	1

1:FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ:

5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda belediye sınırları dışındaki yerlerin numaralama ve Ulusal Adres Veri Tabanı çalışmalarını yürütmek, Köy yerleşik alan sınır tespiti iş ve işlemlerini ,Köy yerleşim alanlarının tespiti iş ve işlemlerini yürütmek, Hali hazır harita yapımı, kontrollük ve onay işlemlerini yürütmek,- Çevre düzeni planı ve her ölçekteki imar planları ile ilgili iş ve işlemleri ,İmar uygulaması, ifraz, tevhit, yoldan ihdas, yola terk ve irtifak hakkı iş ve işlemlerini yürütmek, Tapu Sicil Müdürlüklerinden gelen hisseli satış talepleri hakkında görüş bildirmek. Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Adli Mercilerden gelen imar ile ilgili konularda görüş bildirmek,İmar durumu belgesi vermek,- Yapı Ruhsatı verilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

2024 YILI FAALİYETLERİMİZ

1	YAPI RUHSATLARI	
2	Yapı Kullanma izin belgesi	117
3	Yapı Ruhsatı	71
4	Köy yerleşik alanı içi proje onayı	406
5	Köy yerleşik alanı içi iskan raporları	243
6	İmar Durum belgesi	218
7	İmar Planları	8
8	İFRAZ - TEVHİD - İHDAS - TERK - İRTİFAK HAKKI İŞLEMLERİ	404
9	Hali hazır haritalar	17
10	KAÇAK YAPI MÜHÜRLEME İŞLEMLERİ	281

EĞİTİM HİZMETLERİ

1:FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ:

Sinop İli Milli Eğitim Müdürlüğü 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda ve 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununda belirtilen esaslara göre hizmet vermektedir.

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı olarak 8 İlçemizde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,

8 İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Merkez İlçede 1 Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü; Merkez İlçede 1, Boyabat İlçesinde 1 olmak üzere toplam

2 Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğü; Merkez İlçede 1, Boyabat İlçesinde 1 olmak üzere toplam 2 Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü; Merkez İlçede 1, Ayancık İlçesinde 1 ve Boyabat İlçesinde 1 olmak üzere toplam 3 Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü bulunmaktadır.

6287 Sayılı yasa ile tüm okullarımız 4+4+4 sistemine dönüştürülmüştür. İlimiz dahilindeki 40 lise, 47 ilköğretim, 36 ortaokul, 13 anaokulu olmak üzere eğitim hizmetleri veren 136 okul bulunmaktadır. Bu okullarda 31.093 öğrenci eğitim öğretim görmekte ve 2720 öğretmen görev yapmaktadır.

İlimiz Merkez,

Boyabat,

Dikmen,

Durağan,

Erfelek, Gerze,

Saraydüzü ve Türkeli İlçelerinde yapılan taşınmalı eğitim kapsamında 712 taşıma güzergahından 332 Merkez okula 3866 öğrenci taşınmaktadır. İlimiz ilköğretim hizmetlerinde 10 adet binek oto, 11 adet minibüs bulunmaktadır.

YAPILAN HARCAMALAR

FAALİYET 1: İl Özel İdaresi Bütçesinden ayrılan toplam 34.167.265,25 TL ödenekten 8.273.824,07 TL harcama yapılmış olup, 25.893.441,18 TL ödenek 2025 yılına devretmiştir.

FAALİYET 2: Bakanlığımızdan gönderilen (Cariler için) toplam 35.009.465,64 TL ödenekten 33.235.780,38 TL harcama yapılmış olup, 1.773.685,26 TL ödenek 2025 Yılına Devretmiştir.

FAALİYET 3: Bakanlığımız tarafından gönderilen (Yatırımlar+Onarımlar için) toplam 226.851.711,10 TL ödenekten 221.552.744,39 TL harcanmış olup, 5.298.966,71 TL ödenek 2025 yılına devretmiştir.

**2024 MALİ YILI İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİNDEN YAPILAN FAALİYETLER
(ÖZEL İDARE KATKISI-ONARIM-DONATIM-YATIRIM-CARİ)**

HARCAMA KALEMLERİ	HARCAMA TÜRÜ	ÖDENEK TOPLAMI	HARCANAN	KALAN ÖDENEK
44.57.01.06.00-09.5.0.00-5-03.2	Tüketime Yönelik Mal veMalzeme Alımları	319.809,56	97.777,09	222.032,47
44.57.01.06.00-09.5.0.00-5-03.5	Hizmet Alımları	782.400,00	782.340,00	60,00
44.57.01.06.00-09.5.0.00-5-03.7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,	272.328,00	225.816,50	46.511,50
44.57.01.06.00-09.5.0.00-5-03.8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Gid.	213.278,37	211.738,20	1.540,17
44.57.01.06.00-09.5.0.00-5-06.1	Okul Mefruşat Alımları Giderleri	150.000,00	44.496,00	105.504,00
44.57.01.08.00-09.2.9.04-5-06.5	24 Derslikli Boyabat İlkokulu Yapım İşi	1.000,00	0,00	1.000,00
44.57.01.08.00-09.2.9.05-5-06.5	24 Derslikli Gerze İlkokulu Yapım İşi	7.000.000,00	4.169.364,03	2.830.635,97
44.57.01.08.00-09.2.9.09-5-06.5	75. Yıl Cumhuriyet YBO Yapımı	32.261,07	0,00	32.261,07
44.57.01.08.00-09.2.9.11-5-06.5	Şehit Kadirler Ortaokulu Yapımı	57.271,23	0,00	57.271,23
44.57.01.08.00-09.2.9.16-5-06.5	4 Derslikli Durağan İlkokul Yapımı	5.349.180,28	977.603,95	4.371.576,33
44.57.01.08.00-09.2.9.18-5-06.5	8 Derslikli Ayancık İlkokul Yapımı	20.009.621,00	1.318.392,12	18.691.228,88
44.57.01.08.00-09.2.9.19-5-06.5	Sinop Merkez Anaokulu Yapımı	750.000,00	0,00	750.000,00
44.57.01.08.00-09.2.9.20-5-06.5	Boyabat Kumuluk Özel Eğitim Okulu Yapım İşi	20.000,00	0,00	20.000,00
44.57.01.08.00-09.5.2.00-5-06.5	İlköğretim Okulları Yapım İşi	91.600,25	0,00	91.600,25
44.57.01.08.00-09.5.0.89-5-06.5	Boyabat Nejdet Küçükbaş Ortaokulu Yap. İşi	820.879,96	0,00	820.879,96
44.57.01.62.01-09.5.0.00-5-03.2	Tüketime Yönelik Mal veMalzeme Alımları	57.000,00	0,00	57.000,00
44.57.01.62.01-09.5.0.00-5-03.5	Hizmet Alımları	8.444,32	8.400,00	44,32
44.57.01.62.01-09.5.0.00-5-03.7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım ve Onarım Giderleri	55.000,00	36.000,00	19.000,00
44.57.01.62.01-09.5.0.00-5-03.8	Gayri Menkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	67.531,54	0,00	67.531,54
44.57.01.62.02-09.5.0.00-5-03.2	Tüketime Yönelik Mal veMalzeme Alımları	455.000,00	227.345,20	227.654,80
44.57.01.62.02-09.5.0.00-5-03.5	Hizmet Alımları	7.027,60	7.020,00	7,60
44.57.01.62.02-09.5.0.00-5-03.7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,	150.000,08	92.710,00	57.290,08
44.57.01.62.02-09.5.0.00-5-03.8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Gid.	214.000,00	46.146,00	167.854,00
44.57.01.62.02-09.5.0.00-5-06.01	Mamül Mal Alımları	24.866,30	0,00	24.866,30
44.57.01.62.03-09.5.0.00-5-03.2	Tüketime Yönelik Mal veMalzeme Alımları	38.000,00	27.183,06	10.816,94
44.57.01.62.03-09.5.0.00-5-03.05	Hizmet Alımları	20.500,00	12.287,31	8.212,69
44.57.01.62.03-09.5.0.00-5-03.07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,	30.000,00	0,00	30.000,00
44.57.01.62.03-09.5.0.00-5-03.08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Gid.	45.483,00	10.800,00	34.683,00
44.57.01.62.03-09.5.0.00-5-06.01	Mamül Mal Alımları	50.000,00	0,00	50.000,00
44.57.01.62.04-09.5.0.00-5-03.02	Tüketime Yönelik Mal veMalzeme Alımları	120.501,32	119.918,40	582,92
44.57.01.62.04-09.5.0.00-5-03.07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,	24.500,00	24.500,00	0,00

44.57.01.62.04-09.5.0.00-5-03.07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,	24.500,00	0,00	24.500,00
44.57.01.62.04-09.5.0.00-5-03.08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Gid.	55.095,27	15.000,00	40.095,27
44.57.01.62.04-09.5.0.00-5-06.07	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	3.746,07	3.700,00	46,07
44.57.01.62.05-09.5.0.00-5-03.02	Tüketime Yönelik Mal veMalzeme Alımları	52.800,00	41.578,27	11.221,73
44.57.01.62.05-09.5.0.00-5-03.05	Hizmet Alımları	11.000,00	0,00	11.000,00
44.57.01.62.05-09.5.0.00-5-03.07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,	27.000,00	11.994,70	15.005,30
44.57.01.62.05-09.5.0.00-5-03.08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Gid.	15.000,00	0,00	15.000,00
44.57.01.62.06-09.5.0.00-5-03.02	Tüketime Yönelik Mal veMalzeme Alımları	80.000,00	78.390,33	1.609,67
44.57.01.62.06-09.5.0.00-5-03.05	Hizmet Alımları	22.141,09	11.309,82	10.831,27
44.57.01.62.06-09.5.0.00-5-03.07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,	63.934,90	11.339,80	52.595,10
44.57.01.62.06-09.5.0.00-5-03.08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Gid.	50.763,32	0,00	50.763,32
44.57.01.62.06-09.5.0.00-5-06.01	Mamül Mal Alımları	95.004,80	95.000,40	4,40
44.57.01.62.06-09.5.0.00-5-06.07	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	352,40	0,00	352,40
44.57.01.62.08-09.5.0.00-5-03.02	Tüketime Yönelik Mal veMalzeme Alımları	40.000,00	39.999,96	0,04
44.57.01.62.08-09.5.0.00-5-03.05	Hizmet Alımları	18.000,00	0,00	18.000,00
44.57.01.62.08-09.5.0.00-5-03.07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,	51.700,00	51.000,00	700,00
44.57.01.62.08-09.5.0.00-5-03.08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Gid.	10.000,00	0,00	10.000,00
44.57.01.62.09-09.5.0.00-5-03.02	Tüketime Yönelik Mal veMalzeme Alımları	61.531,46	24.851,61	36.679,85
44.57.01.62.09-09.5.0.00-5-03.05	Hizmet Alımları	23.259,98	10.099,71	13.160,27
44.57.01.62.09-09.5.0.00-5-03.07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,	98.399,99	23.092,60	75.307,39
44.57.01.62.09-09.5.0.00-5-03.08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Gid.	63.905,15	0,00	63.905,15
44.57.01.62.09-09.5.0.00-5-06.01	Mamül Mal Alımları	5.961,21	0,00	5.961,21
44.57.01.62.09-09.5.0.00-5-06.07	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.916,20	0,00	1.916,20
TOPLAM		38.100.535,61	8.906.549,48	29.193.986,13

İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

1:FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ: Bitkisel Üretimi Geliştirme, Damla Sulama Yönteminin yaygınlaştırılması, Bitki Hastalık ve Zararlıları İle Mücadele, Eğitim ve Yayım Faaliyetlerini Yaygınlaştırma ve Su Ürünleri Üretiminin Geliştirilmesi, Ceviz Bahçesi Tesis Edilmesi, Armut Demonstrasyon Bahçesi Kurulumu,Fişek Alımı, Çilek Bahçesi Tesisi, Yem Bitkisi Tohumu Alımı, Sera Kurulumu,Salep Bahçesi Tesisi, Uzatma Ağı Alımı ve Teknik Gezi.

İl Özel İdaresi Kaynakları ile 2024 Yılında Tarım İl Müdürlüğüne ; 10.400: Adet Fişek Alımı Yapılarak Çiftçilere Dağıtılmıştır, Çiftçi Eğitim ve Yayım Faaliyetlerinin Geliştirilmesi Projesi için Antalya İline Teknik Gezi Düzenlenmiş, Sera Projesi kapsamında (Sevgi Evi ve Huzurevi İçin) 2 adet sera yapılmıştır. İklim Değişikliği kapsamında Teknik Gezi Projesi düzenlenmiş, Yerli Armut Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında Anaç Çöğür Armut Bahçesi Tesis Edilmesi gerçekleştirilmiştir.

MERKEZ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

Sıra No	İLÇE ADI İHALE YERİ	TAHSİ EDİLEN ÖDENEĞİN MİKTARI	ÖDENEĞİN TAHİS AMACI	2024 YILI HARCAMASI	FİZİKİ GERÇEKLEŞ ME %	AÇIKLAMA
1	MERKEZ	850.000,00 TL	İÇME SUYU VE KORUGE BORU ALIM İŞİ	850.000,00 TL	100	GERÇEKLEŞTİ
2	MERKEZ	21.450,00 TL	SEYYAR ELEK KİRALAMA İŞİ	21.450,00 TL	100	GERÇEKLEŞTİ
3	MERKEZ	185.000,00 TL	BEKTAŞAĞA ÇİFTLİK ALOĞLU KÖY YARDIMI	185.000,00 TL	100	GERÇEKLEŞTİ
4	MERKEZ	1.185.000,00TL	KÖYLERE YATIRIMLAR KAPSAMINDA DİBEKLI MERTOĞLU ALOĞLU EYMÜR KÖYÜ YARDIMI	1.185.000,00TL	100	GERÇEKLEŞTİ
5	MERKEZ	1.000.000,00 TL	ALT VE ÜST YAPI İŞLERİ, BORU, YAKIT ALIMI, ARAÇ KİRALAMA, MALZEME ALIMI, ARAÇ BAKIM YEDEK PARÇA ALIMI, ELEKALTI, PALAZ, BETON MALZ. ALIMI, KUM ÇAKIL ALIMI	1.000.000,00 TL	100	GERÇEKLEŞTİ
6	MERKEZ	2.988.000,00 TL	SİNOP-ERFELEK BARAJ AYRIM VANASI İNCEMEYDAN DEPO ARASI İÇME SUYU ONARIM İNŞAAT İŞİ	2.988.000,00 TL	100	GERÇEKLEŞTİ
7	MERKEZ	3.000.960,00 TL	BÜRNÜK ÖZEL İDARE TAŞ OCAĞINDAN ELEKALTI VE PALAZ MALZEMENİN ÖZEL İDARE KABALI ŞANTİYESİNE NAKLİ İŞİ	3.000.960,00 TL	100	GERÇEKLEŞTİ
8	MERKEZ	640.000,00 TL	ALT VE ÜST YAPI İŞLERİ, BORU, YAKIT ALIMI, ARAÇ KİRALAMA, MALZEME ALIMI, ARAÇ BAKIM YEDEK PARÇA ALIMI, ELEKALTI, PALAZ, BETON MALZ. ALIMI, KUM ÇAKIL ALIMI	640.000,00 TL	100	GERÇEKLEŞTİ
9	MERKEZ	950.174,26 TL	İÇME SUYU VE KORUGE BORU ALIM İŞİ	950.174,26 TL	100	GERÇEKLEŞTİ
TOPLAM		10.820.584,26 TL		10.820.584,26 TL		

AYANCIK KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

Sıra No	İLÇE ADI İHALE YERİ	TAHSİS EDİLEN ÖDENEĞİN MİKTARI	ÖDENEĞİN TAHİS AMACI	2024 YILI HARCAMASI	FİZİKİ GERÇEKLEŞME %
1	AYANCIK	433.671,14 TL	2.GRUP ERİKLİ KÖYÜ İÇMESUYU İNŞAATI İŞİ	433.671,14 TL	100%
2	AYANCIK	3.749.653,68 TL	1.GRUP AĞAÇLI-TARAKÇI İÇMESUYU ONARIM İNŞAATI İŞİ 3.GRUP BAKIRLI KÖYÜ DUVARSÖKÜ MAH. İÇMESUYU ONARIM İNŞAATI İŞİ 1.GRUP PAZARCIK KÖYÜ İÇMESUYU YAPIM İNŞAATI İŞİ	1.507.669,68 TL 675.264,00 TL 1.566.720,00 TL	100%
3	AYANCIK	173.905,47 TL	ÇAYLIOĞLU KÖYÜ İÇMESUYU TESİSİ ENH YAPIM İŞİ	173.905,47 TL	100%
4	AYANCIK	4.050.972,00 TL	ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ KİRALAMA HİZMET ALIMI İŞİ (3. VE 4. HAKEDİŞ)	4.050.972,00 TL	100%
5	AYANCIK	787.328,86 TL	2.GRUP ERİKLİ KÖYÜ İÇMESUYU İNŞAATI İŞİ	787.328,86 TL	100%
6	AYANCIK	9.744.763,44 TL	2.GRUP İÇMESUYU YAPIM İŞİ SON HAKEDİŞ ÖDEMESİ 3.GRUP İÇMESUYU YAPIM İŞİ SON HAKEDİŞ ÖDEMESİ 1.GRUP İÇMESUYU YAPIM İŞİ SON HAKEDİŞ ÖDEMESİ	4.696.900,32 TL 3.457.737,12 TL 1.590.126,00 TL	100%
7	AYANCIK	1.740.000,00 TL	KÜTÜK KÖYÜ KÖYLERE YATIRIMLAR KAPSAMINDA ALT VE ÜST YAPI İŞLERİ İÇMESUYU BORUSU ALIM, BETON ALIM VE İNŞAAT MALZEMESİ ALIMINDA KULLANILMAK ÜZERE TEVFİKİYE KÖYÜ KÖYLERE YATIRIMLAR KAPSAMINDA ALT VE ÜST YAPI İŞLERİ İÇMESUYU BORUSU ALIM, BETON ALIM VE İNŞAAT MALZEMESİ ALIMINDA KULLANILMAK ÜZERE KÖYLERE YATIRIMLAR KAPSAMINDA ARAÇ KİRALAMA İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE DAMPERLİ ARAÇ YAPIM ONARIM BAKIM TADİLAT İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE	1.740.000,00	05.10.2024 TARİH VE 461 SAYILI İL GENEL MECLİSİ KARARIYLA; "MOBİL ELEME MAKİNESİ ALIM İŞİ" OLARAK TAHSİS AMACI DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMIŞTIR. 85,20%
8	AYANCIK	80.748,00TL	METSO MARKA MOBİL KONKASÖRE KONYEVÖR BANT ALIM	80.748,00TL	100%
9	AYANCIK	449.579,95 TL	MOBİL KONKASÖR SARF MALZEMESİ ALIM İŞİ İÇİN	449.579,95 TL	100%

10	AYANCIK	54.552,00 TL	MOBİL KONKASÖR SARF MALZEMESİ ALIMI İŞİ İÇİN	54.552,00 TL	100%
11	AYANCIK	70.000,00 TL	SOFU KÖYÜ-MEV CUT OLAN İÇME SUYU DEPOSUNA İLAVE İÇME SUYU YAPIMI İÇİN İÇMESUYU BORUSU, KORUGE BORU, DEMİR VE ÇİMENTO ALIMI İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE	70.000,00 TL	100%
12	AYANCIK	126.000,00 TL	EKSKAVATÖR KİRALAMA HİZMET ALIMI İŞİ	126.000,00 TL	100%
13	AYANCIK	60.000,00 TL	ORTALIK KÖYÜ- MEZARLIK ÇEVRE TEMİZLİĞİ YAPIMI İŞİ GÖLDAĞI KÖYÜ- MOTOPOMP VE İÇMESUYU BORUSU ALIMI İŞİ HATİP KÖYÜ- MOTOPOMP VE İÇMESUYU BORUSU VE KORİGE BORU ALIMI İŞİ	60.000,00 TL	100%
14	AYANCIK	2.632.461,36	20.09.2024 TARİH VE 7953 SAYILI YAZIMIZA İSTİNADEN; 05.10.2024 TARİH VE 461 SAYILI İL GENEL MECLİSİ KARARIYLA; "MOBİL ELEME MAKİNESİ ALIMI İŞİ" OLARAK TAHSİS AMACI DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMIŞTIR.		17/05/2024 TARİH VE 32549 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN 2024/7 GENELGE GEREĞİ; BAKANLIK İZİN AŞAMASINDA
14	AYANCIK	928.000,00 TL	KONKASÖR (TAŞ KIRMA MAKİNESİ) ONARIM BAKIM MALZEMESİ ALIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE KÜTÜK KÖYÜ - KÜTÜK KÖYÜ YOL YAPIM İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ÇİMENTO, BETON VE DEMİR ALIMI İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE KALDIRAYAK KÖYÜ-İÇMESUYU BORUSU, KORİGE BORUSU, ÇİMENTO, KUM VE DEMİR ALIMI İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE KARAKESTANE KÖYÜ-YOL YAPIM İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ÇİMENTO, BETON VE DEMİR ALIMI İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE PAZARCIK KÖYÜ ANA DEPOSU DEREKÖY VE YENİCE KÖYLERİNDE İÇMES SUYU MOTORLARININ BAKIM ONARIM VE TADİLATLARINDA KULLANILMAK ÜZERE	928.000,00 TL	100%
15	AYANCIK	150.000,00 TL	AŞAĞIKÖY KÖYÜ CAMİSİNİN BAKIMI ONARIMI VE KÖY KONAĞI YAPIMI BAKIMI VE ONARIMI İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE	150.000,00 TL	100%
16	AYANCIK	126.000,00 TL	EKSKAVATÖR KİRALAMA HİZMET ALIMI İŞİ	2.829.855,00 TL	100%
17	AYANCIK	888.026,40 TL	3. GRUP İÇMESUYU YAPIM İŞİ BAHÇELİ KÖYÜ SONDAJ YAPIM İŞİ	768.026,40 TL 120.000,00 TL	100%
	GENEL TOPLAM	23.613.201,04 TL		22.029.505,04 TL	

BOYABAT KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

SIRA NO	İLÇE ADI İHALE YERİ	TAHSİS EDİLEN ÖDENEĞİN MİKTARI	ÖDENEĞİN TAHSİS AMACI	2024 YILI HARCAMASI	FİZİKSEL GERÇEKL EŞ MESİ %	AÇIKLAMA
1	BOYABAT	55.000,00	5.000 tl yeşilyurt içmesuyu yapım işi, 20.000 tl gazidere içmesuuy tesis yapım, 30.000tl çaltu köy konağı onarım işinde kullanılmasına	55.000,00	100	Tamamlandı
2	BOYABAT	2.500.000,00	İş makinası alım	2.500.000,00	100	Tamamlandı
3	BOYABAT	1.000.000,00	2 adet muhtarlık binası yapım işi	1.000.000,00	100	Tamamlandı
4	BOYABAT	92.000,00	25.000tl yenicamili köy konak yapım onarım, 17.000tl tekke içmesuyu boru alım, 25.000tl Eğlence motopomp alım, 25.000tl Kurtlu içmesuyu depo inşaatı işlerinde	92.000,00	100	Tamamlandı
5	BOYABAT	320.000,00	15.000tl Yenikayalı imamevi onarım, 30.000tl çorak imamevi onarım, 20.000tl mahmutlu beton alım yapım, 40.000tl pirefendidersi cami çevre düzenleme, 25.000tl eğlence içmesuyu yapım inşaatı, 30.000tl yabancı içmesuyu inşaatı, 20.000tl erkek menfez boru alım, 10.000tl edil imamevi onarım, 50.000tl daylı imam evi onarım, 80.000tl çatpınar köy konak yapım onarım işleri,	270.000,00	95	50.000tl daylı imam evi onarım, 06.05.024/5920 9 Daylı cami bakım onarım değiştirilmiş olup işlemler devam etmektedir.
6	BOYABAT	276.000,00	10.000tl Uzunçay çimento alım, 17.000tl Kurtlu su depo bakım, 80.000tl Cemalettin köy oda bakım, 30.000tl Aydoğan cami şadırvan tamirat, 13.000tl Salar köy koruge boru alım, 15.000tl Okçuehmetli koruge boru alım, 34.000tl Eğlence foseptik onarım, 50.000tl Yenikayalı köy konak onarım, 27.000tl Tekke köy konak onarım	242.000,00	95	34.000tl Eğlence foseptik onarım, işlemler devam etmektedir
7	BOYABAT	686.270,62	Sarıağaççayı sınırlarında bulunan Şehit Piyaed Sözleşmeli Er Çağatay ERENOĞLU mezar ve çevre düzenleme yapımı	664.385,48	100	Şehit Piyaed Sözleşmeli Er Çağatay ERENOĞLU mezar ve çevre düzenleme yapımı tamamlandı, kabul komisyonu bekleniyor, kabulden sonra son hakediş ödenecek

8	BOYABAT	365.600,00	25.000tl kılıklı okul çatı onarım, 9.800tl maruf koruge boru alım, 40.000tl salar sulama suyu pompa bakım, 15.000tl yeşilköy içmesuy tadilat, 30.000tl ören içmesuyu tadilat, 35.000tl kartaloğlu içmesuyu pompa onarım, 15.000tl akyörük cami onarım, 5.000tl binerli içmesuyu onarım, 10.000tl keseköy köy konak çimento alım, 10.000tl edil içmesuy onarım, 6.000tl çeşnigir koruge boru alım, 20.000tl kadınli içmesuyu onarım, 6.000tl akçakese koruge boru alım, 15.000tl kayaboğazı koruge boru alım, 10.000tl çukurhan koruge boru alım, 19.000tl günpınar cami istinat duvar yapım onarım çimento alım, 9.000tl arıoğlu su gözü onarım çimento alım, 10.800tl alibeyli koruge boru alım, 75.000tl alt ve üst yapı işleri ve diğerleri, içme suyu boru alım, yakıt alımı, araç kiralama, inşaat malzemesi alım, araç bakım onarım ve yedek parça alım, koruge boru alım işleri, elekaltı, palaz malzeme alımı, beton alımı ve beton yol yapım ve kum çakıl alım işlerinde kullanmak	320.600,00	75	10.000tl keseköy köy konak çimento alım, - 20.000tl kadınli içmesuyu onarım - 15.000tl kayaboğazı koruge boru alım, çalışmalar devam ediyor
9	BOYABAT	135.250,00	10,000tl edil koruge boru alım, 5,250tl kadınli koruge boru alım, 30,000tl bağlıca içmesuyu ve koruge boru alım, 10,000tl imamli içmesuyu onarım, 35,000tl düzkaraağaç içmeuyu onarım, 45,000tl ılıca içmesuyu onarım beton yol yapım işlerinde kullanmak	120.000,00	75	5,250tl kadınli koruge boru alım - 10,000tl imamli içmesuyu onarım, çalışmalar devam ediyor.
10	BOYABAT	200.000,00	15,000tl kurusaray koruge boru alım, 15,000tl yeşilyurt içmesuyu depo onarım, 20,000tl göve köy konak onarım, 15,000tl erkek içmesuyu onarım, 10,000tl isaoğlu motopomp onarım ve alım, 40,000tl bürüm köy konak onarım, 40,000tl karacaören boru alım, 5,500tl kayaboğazı koruge boru alım, 10,000tl uzunçay kanalizasyon boru alım, 29,500tl alt ve üst yapı işleri ve diğerleri, içme suyu boru alım, yakıt alımı, araç kiralama, inşaat malzemesi alım, araç bakım onarım ve yedek parça alım, koruge boru alım işleri, elekaltı, palaz malzeme alımı, beton alımı ve beton yol yapım ve kum çakıl alım işlerinde kullanmak	184.500,00	90	10,000tl isaoğlu motopomp onarım ve alım, - 5,500tl kayaboğazı koruge boru alım, çalışmalar devam ediyor.
11	BOYABAT	350.000,00	Tarımsal sulamada kullanılan kaynakların mevsimsel durumdan ötürü yetersiz kalmasından dolayı çiftçilerimize destek olması amacıyla yeni su kaynaklarının bulunması ve bu su kaynaklarının çiftçilerin kullanımına sunulması için gerekli boru, ekipman alınması	304.796,00	100	Tarımsal sulama malzeme alım muhtar ödemeleri (Ömerköy Eğlence) devam ediyor.
12	BOYABAT	288.300,00	13,500tl akçakese kanalizasyon onarım, 30,000tl muratlı köy konak yapım onarım, 5,000tl kurusaray içmesuyu onarım, 15,000tl dodurga içmesuyu trafo onarım, 42,000tl benişli içmesuyu depo onarım, 25,000tl eğlence sulama kanal onarım, 25,000tl ömerköy sulama kanal onarım, 25,000tl beктаş sulama kanal onarım, 7,800tl paşalıoğlu köy koruge boru alım, 75,000tl alt ve üst yapı işleri ve diğerleri, içme suyu boru alım, yakıt alımı, araç kiralama, inşaat malzemesi alım, araç bakım onarım ve yedek parça alım, koruge boru alım işleri, elekaltı, palaz malzeme alımı, beton alımı ve beton yol yapım ve kum çakıl alım işlerinde kullanmak	183.300,00	60	5,000tl kurusaray içmesuyu onarım, - 25,000tl kadınli sulama kanal onarım, 25,000tl eğlence sulama kanal onarım, 25,000tl ömerköy sulama kanal onarım,

13	BOYABAT	909.600,00	Köydes 2024 ana 1. kat ve 2. kat asfalt A ve B tipi mıcır alımı protoko gereği	909.600,00	100	Tamamlandı
14	BOYABAT	428.850,00	10,600tl bayamca koruge boru alım, 4,950tl dodurga içmesuyu boru alım, 13,300tl kılıçlı kanalizasyon boru alım, 15,000tl ardıc içmesuyu depo yapım, 10,000tl büyükkaraağaç içmesuyu pompa onarım, 375,000tl alt ve üst yapı işleri ve diğerleri, içme suyu boru alım, yakıt alımı, araç kiralama, inşaat malzemesi alım, araç bakım onarım ve yedek parça alım, koruge boru alım işleri, elekaltı, palaz malzeme alımı, beton alımı ve beton yol yapım ve kum çakıl alım işlerinde kullanmak	413.850,00	95	15,000tl ardıc içmesuyu depo yapım, çalışmalar devam ediyor.
15	BOYABAT	384.000,00	Köydes 2024 ek bsk asfalt mıcır alım	384.000,00	100	Tamamlandı
16	BOYABAT	400.000,00	Eski ilçe hayvan pazarı alanı ve eski lojman olmak üzere 2 yapının atıl ve metruk durumda olmasından dolayı emniyet ve asayiş açısından bazı olumsuzluklar ortaya çıktığı, güvenlik amacıyla yıkılabilmesi ve deprem performans analizi yapılabilmesi için	----	50	Deprem perfomans analiz ölçüm, test ve raporlama devam ediyor.
GENEL TOPLAM		8.390.870,62		7.644.031,48		

DİKMEN KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

Sıra No	İLÇE ADI İHALE YERİ	TAHSİ EDİLEN ÖDENEĞİN MİKTARI	ÖDENEĞİN TAHİS AMACI	2024 YILI HARCAMASI	FİZİKİ GERÇEKLEŞ ME %	AÇIKLAMA
1	DİKMEN	50.000,00	10.000,00 TL Akçakese Köyü Çeldiremez Mah. şadırvan yapım işi için inşaat malzemesi alım işi için, 15.000,00 TL, Yukarıçekmez Köyü Merkez Mah. cami lojman tamir bakım onarım işi için, 10.000,00 TL Şeyhhüseyin Köyü Kuz Mah. cami su deposu yapım işi için inşaat malzemesi alım işi için, 15.000,00 TL Yaykın Köyü köy konağı tadilatı için inşaat malzemesi alım işi için ihtiyaçları için.	50.000,00	100	Tamamlandı

2	DİKMEN	418.000,00	18.000,00 TL- Yeniköy Köyü içme suyu borusu alımı ve koruge borusu alım işlerinde kullanılmak üzere, 400.000,00 TL Köylere yatırımlar kapsamında alt ve üst yapı işleri ve diğerleri, içmesuyu boru alımı, yakıt alımı, araç kiralama, inşaat malzemesi alımı, araç bakım onarım ve yedek parça alımı, koruge boru alımı işlerinde, elekaltı, palaz malzeme alımlarında, beton alımı ve beton yol yapımı ve kum çakıl alım işleri	418.000,00	100	Tamamlandı
3	DİKMEN	80.000,00	Karakoyun Köyüne kamyon lowbet kiralaması yapmak, araç bakım onarım, sigorta fenni muayene, köy alt yapı ve üst yapı çalışmalarında kullanılması için.	80.000,00	100	Tamamlandı
4	DİKMEN	150.000,00	Köylere yatırımlar kapsamında alt ve üst yapı işleri ve diğerleri, içmesuyu boru alımı, yakıt alımı, araç kiralama, inşaat malzemesi alımı, araç bakım onarım ve yedek parça alımı, koruge boru alımı işlerinde, elekaltı, palaz malzeme alımlarında, beton alımı ve beton yol yapımı ve kum çakıl alım işleri	150.000,00	100	Tamamlandı
5	DİKMEN	200.000,00	Köylere yatırımlar kapsamında alt ve üst yapı işleri ve diğerleri, içmesuyu boru alımı, yakıt alımı, araç kiralama, inşaat malzemesi alımı, araç bakım onarım ve yedek parça alımı, koruge boru alımı işlerinde, elekaltı, palaz malzeme alımlarında, beton alımı ve beton yol yapımı ve kum çakıl alım işleri	200.000,00	100	Tamamlandı
6	DİKMEN	500.000,00	Köylere yatırımlar kapsamında alt ve üst yapı işleri ve diğerleri, içmesuyu boru alımı, yakıt alımı, araç kiralama, inşaat malzemesi alımı, araç bakım onarım ve yedek parça alımı, koruge boru alımı işlerinde, elekaltı, palaz malzeme alımlarında, beton alımı ve beton yol yapımı	500.000,00	100	Tamamlandı
7	DIKMEN	296.957,26	Mıcır alımı ve nakli işi için	296.957,26	100	Tamamlandı
TOPLAM		1.694.957,26		1.694.957,26	100	

DURAĞAN KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

Sıra No	İLÇE ADI	TAHSİ EDİLEN ÖDENEĞİN MİKTARI	ÖDENEĞİN TAHSİS AMACI	2024 YILI HARCAMASI	FİZİKİ GERÇEKLEŞME %	AÇIKLAMA
1	DURAĞAN	2.515.000,00	1-Aşağı Karacaören Köyü, köy konağı bakım onarımı ve tadilat işlerinde kullanılmak üzere gelen 15.000,00-TL ödenek 2-Alt ve Üst Yapı İşleri, İçmesuyu Boru Alımı, Yakıt Alımı, Diğer Giderler, Araç Kiralama vs. 2.500.000,00TL Ödenek	2.515.000,00	100	Tamamlandı
2	DURAĞAN	785.000,00	3-Alt ve Üst Yapı İşleri, İçmesuyu Boru Alımı, Yakıt Alımı, Diğer Giderler, Araç Kiralama v.s	785.000,00	100	Tamamlandı
3	DURAĞAN	750.000,00	İlçemize bağlı köylerimizde Çöp Toplam Hizmetlerinde kullanılmak üzere gönderilen ödenek	750.000,00	100	Tamamlandı
4	DURAĞAN	315.000,00	Bayat ve Başağaç Köylerine Beton Baks Alımı için gönderilen ödenek	315.000,00	100	Tamamlandı
5	DURAĞAN	1.571.364,32	Gökçebelen Köyü İçmesuyu ENH Tesisi Hakediş bedeli olarak gelen ödenek	1.571.364,32	%100	Tamamlandı
6	DURAĞAN	100.000,00	1-Beyardıç köyü merkez camii bakım onarım ve tadilat işlerinde kullanılmak üzere gelen ödenek 2-Hacımahmutlu köyü mezarlık tuvalet ve şadırvan yapımı bakım onarım işlerinde kullanılmak üzere gelen ödenek	100.000,00	%100	Tamamlandı
7	DURAĞAN	80.000,00	1-Alpaşalı Köyü Camii çevre düzenlemesinde kullanılmak üzere 20.000,00-TL 2-Sarıyar köyü camii şadırvan tamiratında kullanılmak üzere 20.000,00-TL 3-Hacıoğlu Köyü camii lojman tamiratında kullanılmak üzere 20.000,00-TL 4-Kuz köyü camii çevre düzenlemesi işlerinde kullanılmak üzere 20.000,00-TL	80.000,00	%100	Tamamlandı
8	DURAĞAN	803.250,00	2024 Yılı KÖYDES Yol programında bulunan yollara B-Tipi Mıdır Alımı Hakediş Bedeli Olarak gelen ödenek	803.250,00	%100	Tamamlandı
9	DURAĞAN	482.868,00	2024 Yılı KÖYDES Yol programında bulunan yollara B-Tipi Mıdır Nakli Hakediş Bedeli Olarak gelen ödenek	482.868,00	%100	Tamamlandı
TOPLAM		7.402.482,32-TL		7.402.482,32.-TL		Tamamlandı

ERFELEK KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

Sıra No	İLÇE ADI İHALE YERİ	TAHSİ EDİLEN ÖDENEĞİN MİKTARI	ÖDENEĞİN TAHİS AMACI	2024 YILI HARCAMASI	FİZİKİ GERÇEKL EŞME %	AÇIKLAM A
1	ERFELEK	50.000,00	Mescitdüzü Köyü Mahallelerinde bulunan içme ve kullanma suyu şebekelerinde kullanılan motopomp sisteminin yenilenmesi için tahsis edilen ödenek	50.000,00	%100	Tamamlandı
2	ERFELEK	700.000,00	483.500,00 TL Köy yardımları 216,500,00 TL köylere yatırımlar kapsamında alt ve üst yapı işleri, içme suyu boru alımı, yakıt alımı, araç kiralama, inşaat malzemesi alımı, araç bakım onarım ve yedek parça alımı koruge boru alımı işlerinde, elekaltı, palaz malzeme alımlarında, beton alımı ve beton yol yapımı ve kum çakıl alımı işlerinde kullanılmak üzere tahsis edilen ödenek.	700.000,00	%100	Tamamlandı
3	ERFELEK	150.000,00	Sarıboğa, Çayır, Tombul ve Hürremşah köylerinde bulunan elekaltı malzemenin köy içi yollara serilmesinde kullanılmak üzere kamyon kir. içintah.edilen ödenek.	150.000,00	%100	Tamamlandı
4	ERFELEK	2.269.376,04	Muhtelif Köy Yollarına malzeme temini ve nakli işi için tahsis edilen ödenek	2.269.376,04	%100	Tamamlandı
5	ERFELEK	700.000,00	350.000,00 TL İlçe Sınırları içerisinde yaşayan köylülerimizin damızlık ve süt üretimlerini artırmak,muhafaza imkanlarını geliştirmek, sosyoekonomik gelişimlerini desteklemek için, 130.000,00 TL köy yarımı ve 220.000,00 TL köylere yatırımlar kapsamında alt ve üst yapı işleri, içme suyu boru alımı, yakıt alımı, araç kiralama, inşaat malzemesi alımı, araç bakım onarım ve yedek parça alımı koruge boru alımı işlerinde, elekaltı, palaz malzeme alımlarında, beton alımı ve beton yol yapımı ve kum çakıl alımı işlerinde kullanılmak üzere tahsis edilen ödenek.	700.000,00	%100	Tamamlandı
6	ERFELEK	105.500,00	Köy yardımları	105.500,00	%100	Tamamlandı

7	ERFELEK	488.861,15	Katı Atık Toplama Çalışanları Protokol Bedeli	488.861,15	%100	Tamamlandı
8	ERFELEK	994.000,00	Köylere yatırımlar kapsamında alt ve üst yapı işleri, içme suyu boru alımı, yakıt alımı, araç kiralama, inşaat malzemesi alımı, araç bakım onarım ve yedek parça alımı koruge boru alımı işlerinde, elekalıtı, palaz malzeme alımlarında, beton alımı ve beton yol yapımı ve kum çakıl alımı işlerinde kullanılmak üzere tahsis edilen ödenek.	994.000,00	%100	Tamamlandı
9	ERFELEK	250.000,00	Köylere yatırımlar kapsamında alt ve üst yapı işleri, içme suyu boru alımı, yakıt alımı, araç kiralama, inşaat malzemesi alımı, araç bakım onarım ve yedek parça alımı koruge boru alımı işlerinde, elekalıtı, palaz malzeme alımlarında, beton alımı ve beton yol yapımı ve kum çakıl alımı işlerinde kullanılmak üzere tahsis edilen ödenek.	250.000,00	%100	Tamamlandı
10	ERFELEK	525.000,00	Elekalıtı malzeme nakli işi hakediş ödeneği	525.000,00	%100	Tamamlandı
TOPLAM		6.817.737,19		6.817.737,19	%100	

GERZE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

Sıra No	İLÇE ADI İHALE YERİ	TAHSİ EDİLEN ÖDENEĞİN MİKTARI	ÖDENEĞİN TAHİS AMACI	2024 YILI HARCAMASI	FİZİKİ GERÇEKL EĞİME %	AÇIKLAM A
1	GERZE	100.000,00	Köylerin Alt ve Üst Yapı Giderlerinde kullanılmak üzere gelen ödenek	100.000,00	%100	Tamamlandı
2	GERZE	300.000,00	Kanalizasyon Malzemesi Alımı İçin	300.000,00	%100	Tamamlandı
3	GERZE	800.000,00	Başsökö Köyü Merkez Mahalle Beton Yol İşİ	800.000,00	%100	Tamamlandı
4	GERZE	30.000,00	Hacıselli Köyü Cami Lojman Onarımı için	30.000,00	%100	Tamamlandı
5	GERZE	1.315.000,00	Köylerin Alt ve Üst Yapı Giderlerinde kullanılmak üzere gelen ödenek	1.315.000,00	%100	Tamamlandı
6	GERZE	155.000,00	Bolalı ve Tathıcak Köyleri Köprü Korkuluk Yapımı için	155.000,00	%100	Tamamlandı
7	GERZE	200.000,00	Belören Köyü Koruge ve İçme suyu boru alımı işİ için	200.000,00	%100	Tamamlandı
8	GERZE	75.000,00	Çağlayan Köyü İçmesuyu Borusu Alımı İşİ için	75.000,00	%100	Tamamlandı
9	GERZE	70.000,00	Kirençukuru Köyü İçmesuyu Borusu Alımı İşİ için	70.000,00	%100	Tamamlandı
	TOPLAM	3.045.000,00		3.045.000,00	%100	Tamamlandı

SARAYDÜZÜ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

Sıra No	İLÇE ADI İHALE YERİ	TAHSİ EDİLEN ÖDENEĞİN MİKTARI	ÖDENEĞİN TAHİS AMACI	2024 YILI HARCAMA SI	FİZİKİ GERÇEKL EŞME %	AÇIKLAMA
1	SARAYDÜZÜ	150.000,00	5355 S.K. 18. Maddesi	150.000,00	100%	Köylerin Alt ve Üst Yapı Giderlerinde kullanılmak üzere gelen ödenek
2	SARAYDÜZÜ	160.000,00	5355 S.K. 18. Maddesi	160.000,00	100%	Köylerin Alt ve Üst Yapı Giderlerinde kullanılmak üzere gelen ödenek
3	SARAYDÜZÜ	1.370.000,00	5355 S.K. 18. Maddesi	1.370.000,00	100%	Köylerin Alt ve Üst Yapı Giderlerinde kullanılmak üzere gelen ödenek
4	SARAYDÜZÜ	376.192,92	5355 S.K. 18. Maddesi	376.192,92	100%	2023 Eylül Ayı(kısmi) Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait Çöp Toplama Hizmet Bedeli.
5	SARAYDÜZÜ	473.094,02	5355 S.K. 18. Maddesi	473.094,02	100%	Köylerin evsel atıklarının toplatılması işi için
6	SARAYDÜZÜ	248.016,00	5355 S.K. 18. Maddesi	248.016,00	100%	Uluköy Köyü içmesuyu ihtiyacını karşılayan isale hattının değişimi işi
TOPLAM		2.777.302,94		2.777.302,94		

TÜRKELİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

S. No	İLÇE ADI İHALE YERİ	TAHSİ EDİLEN ÖDENEĞİN MİKTARI	ÖDENEĞİN TAHİS AMACI	2024 YILI HARCAMASI	FİZİKİ GERÇEKLEŞME %	AÇIKLAMA
1	TÜRKELİ K.H.G.B	100.000,00TL	BİRLİK MUHTELİF HARCAMALAR ÖDENEĞİ	100.000,00TL	%100	
2	TÜRKELİ K.H.G.B	200.000,00TL	BİRLİK MUHTELİF HARCAMALAR ÖDENEĞİ	200.000,00TL	%100	
3	TÜRKELİ K.H.G.B	400.000,00TL	EVSEL ATIK TOPLAMA PROGRAMI PERSONEL MAAŞ ÖDENEĞİ	400.000,00TL	%100	
4	TÜRKELİ K.H.G.B	260.000,00TL	BİRLİK MUHTELİF HARCAMALAR ÖDENEĞİ	260.000,00TL	%100	
5	TÜRKELİ K.H.G.B	500.000,00TL	BİRLİK MUHTELİF HARCAMALAR ÖDENEĞİ	500.000,00TL	%100	
6	TÜRKELİ K.H.G.B	295.687,02TL	EVSEL ATIK TOPLAMA PROGRAMI PERSONEL MAAŞ ÖDENEĞİ	295.687,02TL	%100	
7	TÜRKELİ K.H.G.B	83.827,15TL	KEŞ KÖYÜ 1 ADET PERSONEL MAAŞ ÖDENEĞİ	83.827,15TL	%100	
8	TÜRKELİ K.H.G.B	150.000,00TL	BİRLİK MUHTELİF HARCAMALAR ÖDENEĞİ	150.000,00TL	%100	
9	TÜRKELİ K.H.G.B	150.000,00TL	BİRLİK MUHTELİF HARCAMALAR ÖDENEĞİ	150.000,00TL	%100	
		2.139.514,17TL		2.139.514,17TL		

FAALİYET SONUÇLARI PERFORMANS ÖLÇÜM TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		
Amaç	Merkez ve İlçe köy yollarının standartlarını yükselterek, ulaşımın rahat ve sağlıklı yapılmasını sağlamak.		
Hedef	Yol standardının yükseltilmesi, mevcut stabilizeli yolların bakım onarım işleri ile asfalt,beton veya BSK yapılması.		
Performans Hedefi	Stabilize kaplamasız yol kalmaması, asfalt veya beton yol oranının yükseltilmesi		
2023 Hedef		2024 Gerçekleşen Hedef	Fiziki Gerçekleşme oranı %
2024 Hedefi -1:1.Kat Asfalt kaplama 50 km.		27,70 km.	55
Hedefteki sapmanın açıklaması:			
2024 Hedefi-2:2.Kat Asfalt kaplama 100 km.		2,50	2,5
Hedefteki sapmanın açıklaması: 1. Kat asfalt kaplamaya ağırlık verilerek yolların kalite standardı arttırıldı.			
2024 Hedefi -3:Asfalt bak. onarım 6.000 m3		Asfalt Plenti Plentmiks ve BSK üretimi 10.278 m3	171
Hedefteki sapmanın açıklanması:			
Faaliyetler		Tahsis edilen kaynak (2023) TL	
		Bütçe	Toplam
1- 2- 3-	ASFALT YAPIM BAKIM VE ONARIMLARI	2.886.119,57	2.886.119,57
4	MENKUL MAL GAYRİ MADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	119.770,37	119.770,37
5	HİZMET ALIMI	7.931.085,89	7.931.085,89
6	DİĞER YASAL GİDERLER	1.005.765,69	1.005.765,69
7	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	4.686.313,23	4.686.313,23
8	SANAT YAPISI	9.223.038,60	9.223.038,60
9	AKLİMAN YOLU YAPIMI VE ÇEVRE DÜZ.	3.777.693,74	3.777.693,74
10	SEL FELAKETİNDE YIKILAN KÖPRÜLERİN YAPIMI	13.647.557,19	13.647.557,19
GENEL TOPLAM		43.277.341,28	43.277.341,28

İdare Adı	Sinop İl Özel İdaresi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü		
Amaç	İdareimiz makine parkında bulunan araç ve iş makinelerinin bakım onarım işlerini yapmak, makine parkının ihtiyacı olan akaryakıt, madeni yağ, lastik, yedek parça gibi sarf malzemelerini temin etmek, araçların trafiğe çıkışı açısından zorunluluk arz eden ruhsat, muayene, sigorta gibi işletme faaliyetlerini gerçekleştirmek		
Hedef	İdareimiz makine parkında bulunan araç ve iş makinelerinin gerek büyüklüğü gerekse çeşitliliği ve kapasiteleri bakımından verimli bir şekilde işletilmesini sağlamak.		
Performans Hedefi	İdareimizce birimimize tahsis edilen ödenekler çerçevesinde İdareimiz makine parkının akaryakıt, madeni yağ ve yedek parça ihtiyaçlarını zamanında temin edip araç ve iş makinelerini aktif tutmak.		
	2024 Hedefi	2024 Gerçekleşen Hedef	Gerçekleşme %
2024 Hedefi	2024 Yılında İdareimiz makine parkında bulunan 215 adet aracın akaryakıt, madeni yağ, lastik ve yedek parça ihtiyaçlarının temin edilmesi, araçların trafiğe çıkışı açısından zorunluluk arz eden ruhsat, muayene, sigorta gibi işletme faaliyetlerini gerçekleştirilmesi ve söz konusu araçların tamir ve bakımlarının yapılması.	2024 yılı İdareimiz makine parkında bulunan araç ve iş makinelerinin akaryakıt ve madeni yağ ihtiyaçları ile tamir ve bakımlarında ihtiyaç duyulan yedek parçalar Müdürlüğümüze tahsis edilen ödenekler çerçevesinde temin edilerek merkez atölye birimimizde 968 arazide de 923 olmak üzere toplam 1891 iş emri açılarak taşıt ve iş makinelerimizin bakım ve onarım yapıp makine parkımız aktif tutulmuştur. Merkez ve İlçelerimize 428 adet iş makinesi nakli gerçekleştirilmiştir.	%100
Hedefteki sapmanın açıklaması:			
2024 Hedefi	Müdürlüğümüzce 2024 yılı yatırım ve çalışma programı teklifiyle; 2 Adet 4x4 Çift Kabinli Kamyonet 1 Adet 10 Ton Kapasiteli Adr Sistemli Akaryakıt Aracı 1 Adet İş Makinesi Nakil Aracı(Üst Yapılı Lowbed) 1 Adet Tır Damperli Çekici Dorsesi 5 Adet Greyder	2024 yılı İdareimiz makine parkına DMO aracılığıyla satın alınan; DMO aracılığıyla satın alınan; 1 Adet İş Kapalı Kasa Seyyar Kaynak Aracı.İdareimiz makine parkına ait Hidromek Ekskavatör için 1 adet MTB 215 IQ Hidrolik kırıcı ve Hidromek Beko Loder için 1 adet MTB 30 Hidrolik kırıcı DMO aracılığıyla satın alınmıştır.	% 13
Hedefteki sapmanın açıklaması:			

TABLO 1

İdare Adı	İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
Amaç	Bütçenin aşağıda belirtilen ekonomik kod düzeylerinde zamanında gerçekleştirilmesinin sağlanması		
Hedef	Bütçenin aşağıda belirtilen ekonomik kod düzeyinde herhangi bir aksaklığa meydan vermeksizin gerçekleştirilmesi		
Performans Hedefi	Bütçenin gerçekleştirilmesi		
	2024 Hedefi	2024 Gerçekleşen Hedef	Gerçekleşme %
2024 Hedefi PERSONEL GİDERİ	57.379.301,18	57.379.301,18	% 100
Hedefteki sapmanın açıklaması:			
2024 Hedefi SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	7.478.007,20	7.478.007,20	% 100
Hedefteki sapmanın açıklaması:			
2024 Hedefi MAL VE HİZMET ALIMLARI GİDERİ	117.873.714,20	117.873.714,20	% 100
Hedefteki sapmanın açıklaması:			
2024 Hedefi CARİ TRANSFER	809.000,00	809.000,00	% 100
Hedefteki sapmanın açıklaması:			

3-PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sinop İl Özel idaresine ait 2020-2024 Yılları Stratejik Planında “Hizmet kalitesini artırmak için teşkilatlanma sürecini ve sosyal altyapısını tamamlayacaktır.”ifadesi gereği gerekli çalışmalar yapılmış sonuçları aşağıda değerlendirilmiştir

1:Kurumsal kimliğini kazanması maksadıyla 2007 yılı sonuna kadar teşkilat yapısına uygun ana hizmet, danışma ve denetim ile yardımcı hizmet birimleri oluşturulmuş, 2016 Yılı içerisinde Sinop İli Genel Meclisi’nin 05.04.2016 tarih ve 272 Sayılı Kararı ile “Sinop İl Özel İdaresi Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği” yürürlüğe girmiştir.

Daha önce Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü altında hizmet verilen içme suları ve kanal işleri hizmetleri için “Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü” ile Bilgi İşlem Müdürlüğü yerine “Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü” kurulmuştur

2:Norm kadro esasları Bakanlar Kurulunca çıkartılmış olup Genel meclis kararıyla bu esaslara uygun kadrolar oluşturulmuş ve atamalar yapılmıştır. 2008 yılı İçerisinde İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Genelge doğrultusunda Makine İkmal Bakım ve Onarım Birimi kaldırılarak İşletme Müdürlüğü Kurulmuştur.

3: Kurum çalışanlarının eşgüdüm ve hedef birliği içerisinde hizmet sunması maksadıyla 2007 yılı sonuna kadar teşkilat birimlerini tek çatı altında toplama çalışmaları yapılmış.

Mülga köy hizmetleri binasında tüm birimler bir araya getirilmiş, İşletme Müdürlüğü ise Korucuk Köyünde bulunan ve atıl olan şantiye binamıza taşınmış ve hizmetlerini orada sürdürmekte olup 2017 Yılı içerisinde de Mevcut Binalarda iyileştirme çalışmalarına devam edilerek Personelin Performansını artıracak iyileştirmeler yapılmıştır.

4:Planlama dönemi içinde tüm personelin ve yönetim kadrolarının hizmet içi eğitimleri ile gerek görülen kurs ve seminerlere katılımı sağlanmaktadır.

5:Personelimiz sürekli eğitime tabi gerekli görülen kurs ve seminere katılmaları sağlanmaktadır.

6:Hizmet sunumumuzu geliştirmek, değişen şartlara uyum sağlamak, sorumluluk sahalarımızda yardımlaşma ve işbirliğini geliştirmek maksadıyla, köyler, birlikler ve diğer üyesi bulunduğumuz teşekküllere üyeliklerimiz devam etmekte ve Bütçe imkânları dâhilinde Mali yönden desteklenmiş olup bundan sonraki Yıllarda da desteklenmeye devam edilecektir.

7:Üyesi bulunduğumuz Vilayetler Hizmet Birliği, Kuzey Anadolu kalkınma Ajansı. Organize sanayi Bölgeleri ile İlimizdeki Köylere Hizmet Götürme Birliklerine 2023 Mali Yılında gerekli destekler verilmiş olup bunlara ilişkin Mali veriler Faaliyetlere ilişkin Bilgi ve Değerlendirmeler kısmının Mali Bilgiler bölümünde Diğer Hususlar alt Başlığında Tablolar halinde verilmiştir.

4-PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: Sinop İl Özel İdaresinde 2024 yılı içinde performans bilgi sistemi oluşturmaya yönelik hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

A:ÜSTÜNLÜKLER

- 1-Özerk bütçeye sahip olmamız
- 2-Kendi karar mekanizmamızın hızlı ve güçlü olması
- 3-Üst yöneticinin Vali olması
- 4-Hizmet alanı yetkimizin geniş olması
- 5-İdari yapı olarak gelişmeye ve yeniliklere açık olmamız
- 6-İlçe teşkilatlarımızın olması
- 7-Halkın taleplerinin karar organı İl Genel Meclisi aracılığı ile hızlı bir şekilde ulaştırılması
- 8-Gayrimenkul Mal Varlığı
- 9-Personelimizin deneyimli olması
- 10-Sivil Toplum örgütlerinin aktif oluşu
- 11-İlimizin kültür ve turizm değerleri açısından zengin oluşu
- 12-Balıkçılık sektörünün varlığı
- 13-Zengin Orman varlığı
- 14-İş makinelerimizin varlığı

B:ZAYIFLIKLAR

- 1-Öz gelirlerimizin yeterli olmaması
- 2-Coğrafi yapı
- 3-Coğrafi yapının uygunsuzluğu nedeniyle yatırım maliyetinin yüksekliği
- 4-Halkın İl Özel İdaresini ve faaliyetlerini yeterince tanımaması
- 5-Yetkin teknik Personel eksikliği
- 6-Makine parkının bir kısmının ekonomik ömrünü tamamlamış olması
- 7-Dağınık ve imarsız yerleşim
- 8-Eğitim ve sağlıkta yoğun yatırım ihtiyacı
- 9-Kanalizasyon, evsel ve çevresel atıklar
- 10-Tarım arazilerinin yetersizliği,Güçlü sanayi yatırımlarının olmayışı.

C:DEĞERLENDİRME

2024 Mali Yılı içerisinde Ulusal ve Bölgesel Plan hedefleri ve Politikalarıyla uyumlu biçimde, İlin yerel Potansiyelini harekete geçirmek ve kaynakların rasyonel kullanımını sağlayarak sürekli ve sürdürülebilir bir gelişme doğrultusunda İl Özel İdaresi Kanunu ile mevzuattaki diğer Kanunların İl Özel İdarelerine verdikleri yetki çerçevesinde İlde yaşayanlara ve gelecekte yaşayacaklara yaşanabilir bir ortam bırakmak için çalışmalar yapılmıştır.

Bu çalışmalar sırasında Stratejik Planda belirtilen değişen çevrede nelerle karşılaşılacağı Fırsat ve Tehditlerin neler olabileceği göz önüne alınmış ve tüm Faaliyetler bu doğrultuda yapılmıştır. Bir Yerel Yönetim Kuruluşu olan Sinop İl Özel İdaresi Misyonu, Vizyonu ve İlkeleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmüştür.

2024 Yılında yapılan Faaliyetler bundan sonraki yıllarda da artarak devam edecektir. Hazırlanan Faaliyet Raporu ile hizmetlerimizin Amaç ve Hedeflerimize uygun olarak yapılıp yapılmadığı denetlenmiş Faaliyetlerin sürekli izlenip değerlendirilmesi sağlanmıştır.

2018 Yılı içerisinde Cumhurbaşkanlığımızın 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamesi ile kurulan 10.000,00 TL Sermayeli Personel Limitet Şirketi 2024 Yılı itibariye bünyesinde 177 işçi çalıştırılmaktadır.

2019 Yılında Kara kum sosyal tesisleri ile özel idare yemekhane ve bungalovların işletilebilmesi için Sinop İl Özel İdaresi Kültür Turizm ve Sosyal Tesis İşletmeleri Anonim Şirketi adı altında 50.000,00 TL sermayeli Anonim Şirket Kurulmuş olup Şirketin Sermayesi 600.000,00 TL ye çıkartılmıştır.

2019 Yılında Sinop TSO Balık Ürünleri İşleme ve Sanayi Anonim Şirketine İl Genel Meclisi kararı ile Sinop İl Özel İdaresi olarak % 30 Hisse ile Ortak olunmuş, 2019 Yılında sermayesine 15.000,00 TL , 2021 Yılında sermayesine 125.000,00 TL, 2023 Yılında sermayesine 150.000,00 TL ve 2024 Ocak ayında 310.000,00 TL olmak üzere Toplam 600.000,00 TL Sermaye Katılım Payı Ödemesinde bulunulmuştur

Sinop TSO Balık Ürünleri İşleme ve Sanayi Anonim Şirketine Ortaklık oranları ise;

Sinop Özel İdare %30

Sinop Sanayi ve Ticaret Odası %35

Sinop Belediyesi %15

Sinop Üniversitesi Vakfı %2

SS Sinop Bölgesi Su Ürünleri Koop. Birliği %13

Abalı Deniz Ürünleri Kooperatifi %5

Stratejik plan hedeflerine ulaşılabilmesi, Kanunlarla verilen çok geniş yetki ve görevlerini tam olarak yerine getirebilmesi için Sinop İl Özel İdaresinin öncelikle mali açıdan desteklenmesi ve gelirlerinin mevcut duruma göre artırılması gerekmektedir.

Sinop iline özgü az gelişmişlik, sanayi sektörü ve tarım sektörünün yetersizliği, çetin coğrafi yapı ve alt yapı eksiklikleri ile plansız ve çok dağınık yerleşim birimlerinin varlığı sebepleriyle hizmet ve yatırımlara olan ihtiyacı göz önünde bulundurularak planlama yapılmalıdır.

Gelir artırıcı çalışmaların yanı sıra, hızla göç veren yerleşim birimlerinin gelecek on yıl içindeki öngörüler göz önünde bulundurularak gereksiz yatırımlardan kaçınılmalı, yatırımların fayda-maliyet unsurları incelenerek tasarruf edilmelidir.

Diğer illerin kat kat üstünde olan yerleşim birimlerine yenilerinin eklenmesinin önüne geçilmeli, aynı yüz ölçüme sahip illerin yol ağının iki katından fazla olan köy yollarımıza kesinlikle ilave yol yapılmamalı, mümkünse mevcut alternatif yollar kapatılmalı, plansız yerleşmelerin de önüne geçilmesi sağlanmalıdır.

Bütçe ödenekleri her zaman olduğu gibi yerinde, zamanında ve tasarrufa azami dikkat edilerek kullanılmalı.

Özel İdare Gelirlerinin Sinop iline özgü şartlara dikkat çekecek şekilde artırılması için İl Genel Meclisinin aktivitelerinin artırılması ve bu yönde Genel İdare nezdinde çalışma yapılmalıdır. Yapılan hizmetlerin önemi ve istenilen hizmetlerin fayda maliyet unsurları sivil toplum örgütlerinden de faydalanılarak halka anlatılmalı, politik kaygılarla yatırım yapılmamalıdır.

İdaremizden izinsiz yerleşim alanları dışında konut yapanlara hizmet verilemeyeceği, plansız yapılaşmanın önleneyeceği hususlarında ikna edici çalışmalar başlatılmalı ve İmar mevzuatı istisnasız uygulanmalıdır.

Tarım arazilerinin ve maden kaynaklarının korunup geliştirilmesi, yol ve içme suyu tesislerimizin uzun ömürlü hizmet sunabilmesi, kaçak yapılaşmanın önüne geçilebilmesi için etkin ve güçlü bir denetim mekanizması kurulmalıdır. İdaremiz nitelikli personel açısından güçlendirilmeli, teknolojik ürünlerin kullanımı yaygınlaştırılarak artırılmalıdır.

Ek-3: Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI^{1[6]}

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.^{2[7]} Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.^{3[8]} SİNOP02.2024

Meliha ARGUN

Gürdal ERDAL

Müge Üstün ONUR

Destek Hizmetleri Müdür v

Su ve Kanal Hiz. Müdür v.

Hukuk Müş. V.

Huriye A. KURUOĞLU

JALE SALMAN LAL

Şahin AKKAYA

İmar ve Kentsel iyil.müdür V.

Plan Proje Yat.İn.Müd.V.

Yol ve ulaş.H.Müd V.

Emine BİLGİLİ

Ceyhan TURHAN

Yaşar EREGÜL

İnsan Kay.ve Eğ. Müd

Mak.İkm.Bak.Onar.Müd.V.

Kül.ve Sos İşl Müd.

Beğenç SEZER

Gülay SİPAHİ

Ruhsat ve Denetim Müd. V.

Yazı İşleri Müdürü

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi⁴⁹⁾ olarak yetkim dahilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin 2024 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.

SİNOP ...02.2024

Ayşe DEMİRCİLER

Mali Hizmetler Müdürü

25.02.2024

Ek-3: Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI^{5[6]}

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.^{6[7]}

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.^{7[8]} SİNOP02.2024

Yahya ÇINKIL
Genel Sekreter

Ek-2: Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI^{8[3]}

Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.^{9[4]}

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.^{10[5]} SİNOP /02.2024

Dr. Mustafa ÖZARSLAN
Sinop Valisi










Sinop Hamsilos Bisiklet ve Yürüyüş Yolu

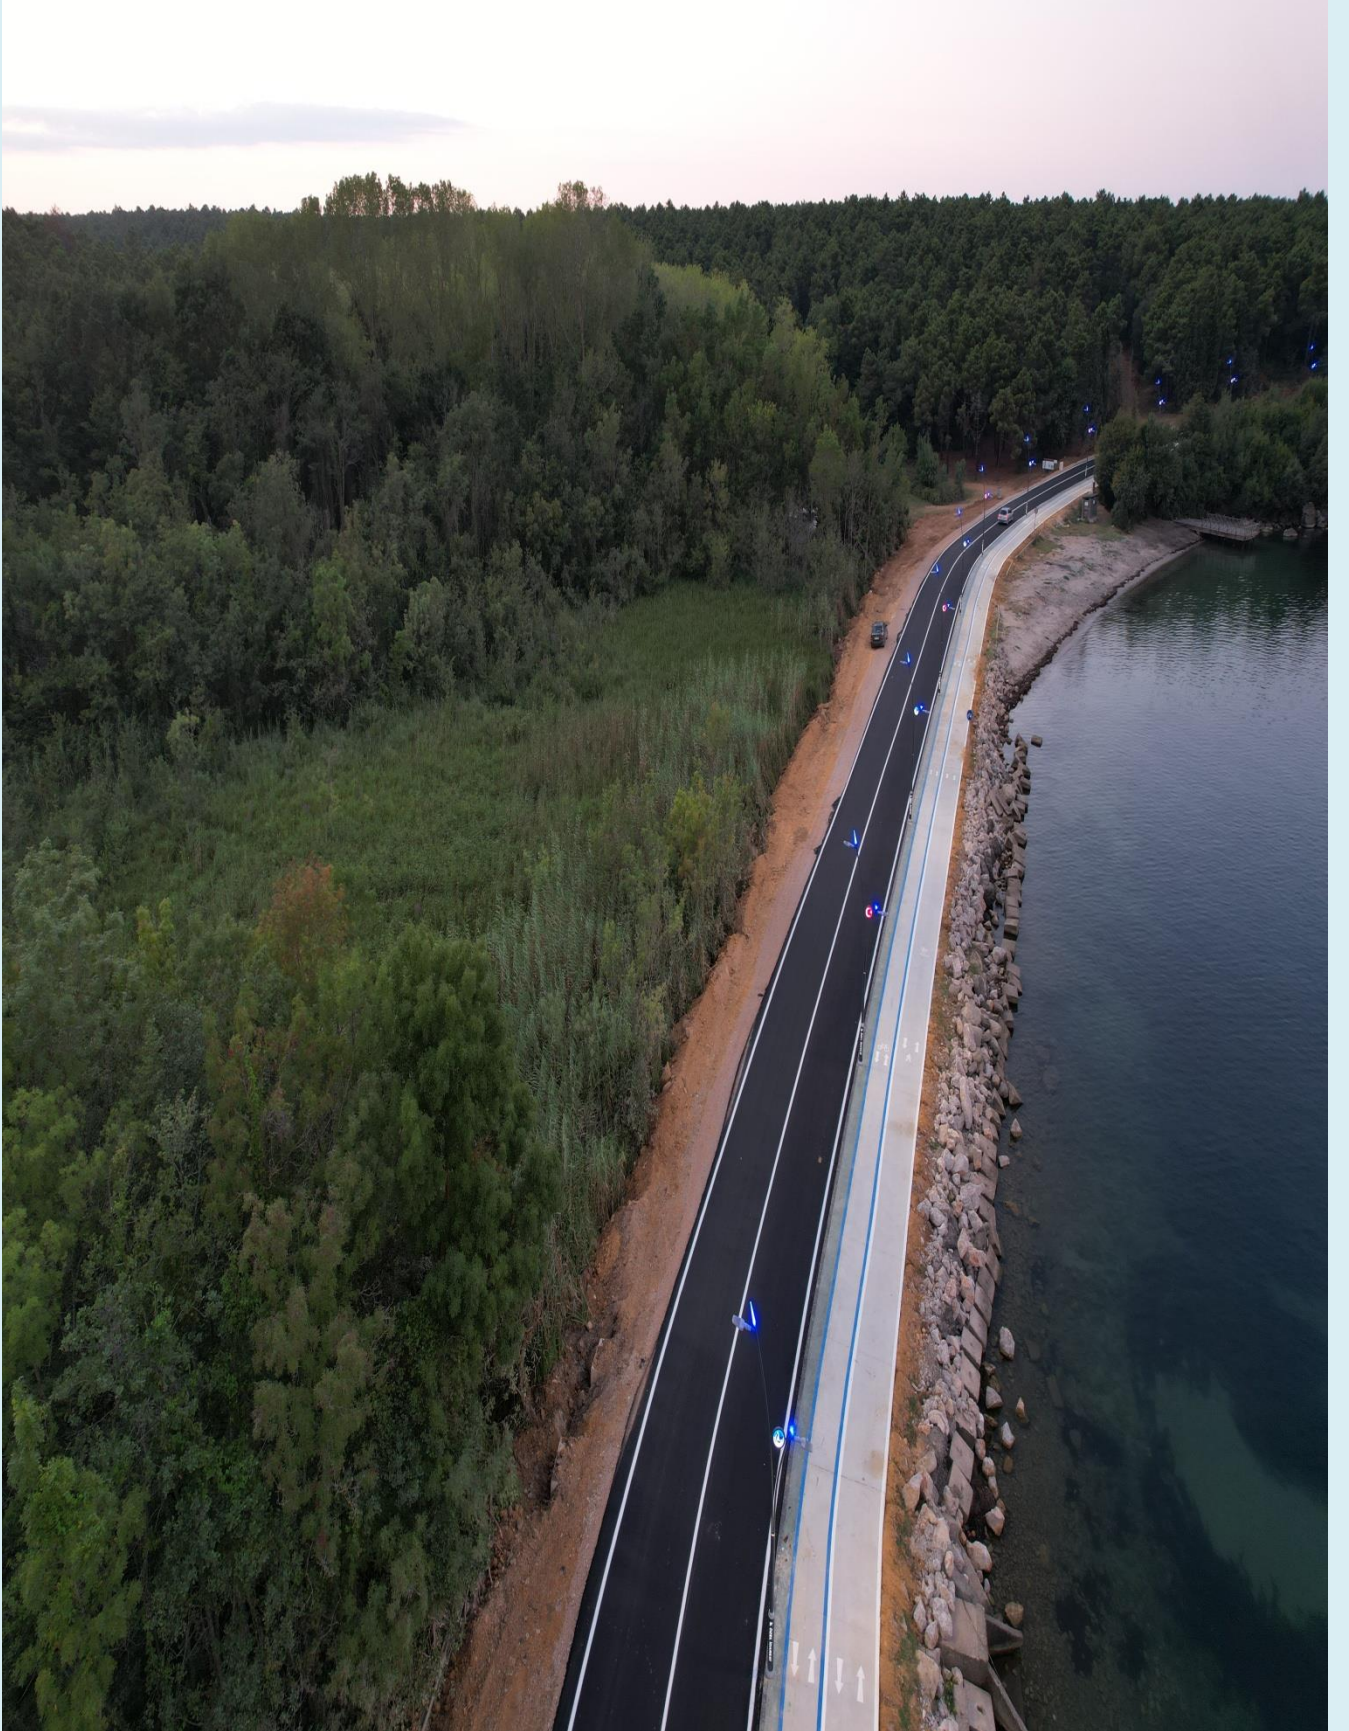


Sinop Hamsilos Bisiklet ve Yürüyüş Yolu



Sinop Hamsilos Bisiklet ve Yürüyüş Yolu



Sinop Hamsilos Bisiklet ve Yürüyüş Yolu

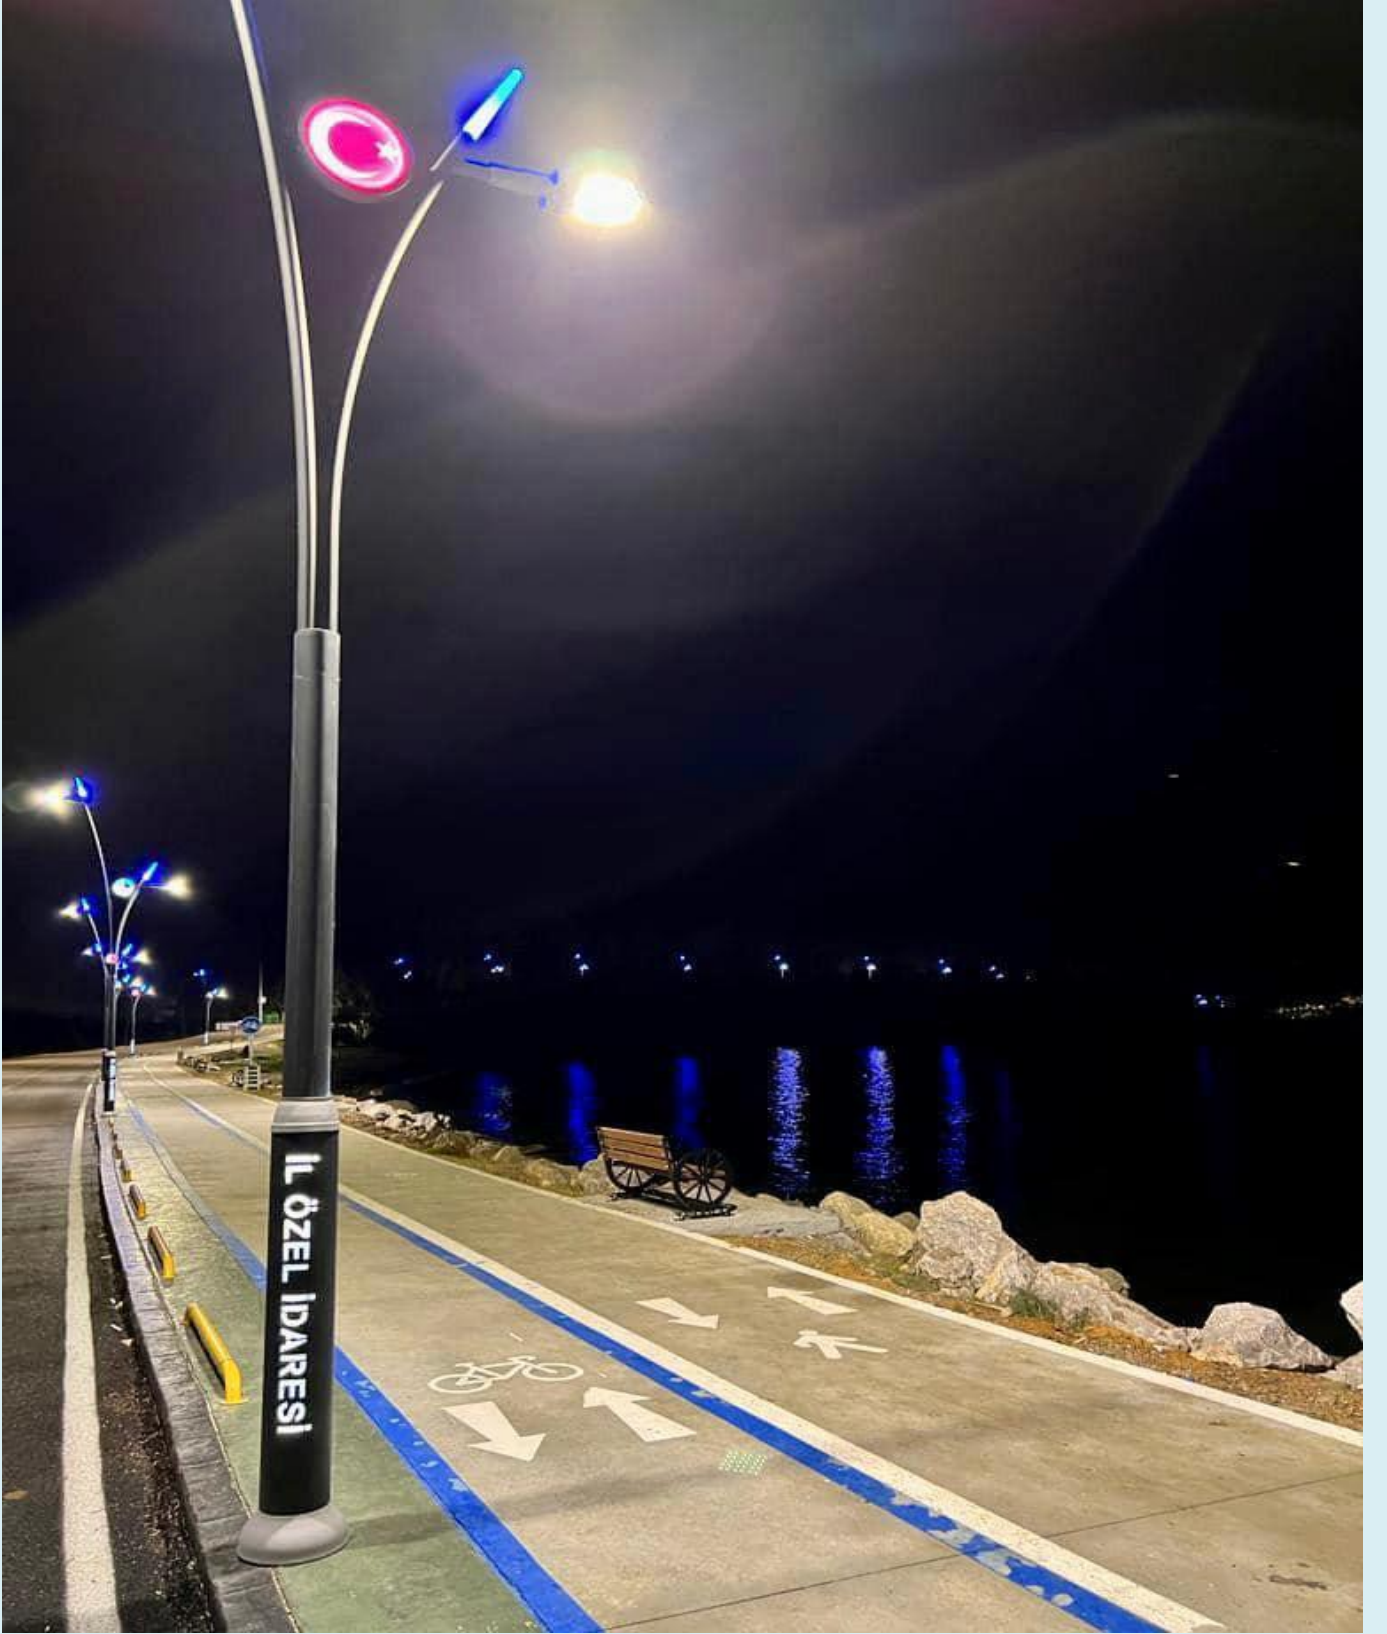

Mutlu Haftalar



HAMSILOS TABİAT PARKI

www.sinopozelidare.gov.tr

   sinopozelidare



SİNOP İÇİN
ÖZEL İDARE ÇALIŞIYOR

Yahya ÇINKIL
Genel Sekreter
